PO250

Bizagi Modeler

Índice

PO250 1
BIZAGI MODELER 1
1 PO250-EAS- IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DA TORRE ERP 11
1.1 PO250-EAS- IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DA TORRE ERP 13
1.1.1 Elementos do processo 13
1.1.1.1 Implantação ERP Senior X - Ativação 13
1.1.1.2 Implantação ERP Senior X - Implantação 13
1.1.1.3 PO192-Recepção de Projetos de Serviços 13
1.1.1.4 Implantação Padronizada 13
1.1.1.5 Processo para Demandas de Customizações 13
1.2 MAIN PROCESS 14
1.2.1 Elementos do processo 14
1.2.1.1 APLICAÇÕES E QUADRO DE REVISÃO 14
1.2.1.2 ISO 16
1.2.1.3 Modelos 17
1.2.1.4 Indicadores 18
1.2.1.5 Ferramentas 18
1.2.1.6 Procedimentos 18
1.2.1.7 Regra de Negócios de Serviços 19
1.2.1.8 Documentação Técnica de Serviços 19
2 PO250 - SUBPROCESSO DE DESENVOLVIMENTO EM BASE INSTALADA 20
2.1 CLIENTE 21
2.1.1 Elementos do processo 21
2.1.1.1 Avaliar Especificação 21
2.1.1.2 Homologar Funcionalidade 21
2.2 SUBPROCESSO DE DEMANDAS DE CUSTOMIZAÇÃO/INTEGRAÇÃO ERP EM BASE INSTALADA 22
2.2.1 Elementos do processo 22
2.2.1.1 Acionar Time de Suporte 22
2.2.1.2 Realizar Reunião de Go / no Go 24
2.2.1.3 Repasse do cliente para o Suporte - Sustentação 25
2.2.1.4 Ativar o Sistema em Produção 26
2.2.1.5 Ativar o Sistema em Produção 27

2.2.1.6 Projeto em Garantia 27
2.2.1.7 Encerrar saldo de horas 28
2.2.1.8 Registrar lições aprendidas.....30
2.2.1.9 Compreender Escopo do Projeto 33
2.2.1.10 Definir Analista/Gerente de Projeto 34
2.2.1.11 Compreender Escopo do Projeto 35
2.2.1.12 Realizar Contato com Cliente 36
2.2.1.13 Primeira Entrevista Comercial 36
2.2.1.14 Registrar Demanda de Desenvolvimento.....38
2.2.1.15 Realizar a Transição Técnica 39
2.2.1.16 Desenvolver Cronograma Inicial 43
2.2.1.17 Realizar apresentação de Reunião Inicial/Kick Off 45
2.2.1.18 Encerrar o projeto com o cliente.....48
2.2.1.19 Atribuir Analista Responsável pela Demanda 49
2.2.1.20 Avaliar Escopo e Esforço para Executar a Demanda.....51
2.2.1.21 Discutir Escopo de Venda e Resolver Impedimentos 51
2.2.1.22 Notificar GP sobre Impedimentos.....52
2.2.1.23 Escalonar Demanda p/ Tomada de Decisão 52
2.2.1.24 Planejar Elaboração da Especificação.....53
2.2.1.25 Registrar Demanda para Consultor 53
2.2.1.26 Alocar Consultor Dev. 54
2.2.1.27 Elaborar Especificação.....55
2.2.1.28 Encaminhar Especificação para Avaliar 55
2.2.1.29 Verificar Conformidade do Documento.....56
2.2.1.30 Encaminhar p/ Gerente de Projetos.....56
2.2.1.31 Solicitar Assinatura Eletrônica do Cliente 57
2.2.1.32 Direcionar Retorno do Cliente.....57
2.2.1.33 Elaborar Especificação.....58
2.2.1.34 Encaminhar p/ Gerente de Projetos.....59
2.2.1.35 Planejar Desenvolvimento 60
2.2.1.36 Desenvolver 61
2.2.1.37 Homologar Funcionalidade.....61

2.2.1.38 Conduzir Homologação com Cliente 62
2.2.1.39 Avaliar e Direcionar Retorno do Cliente.....62
2.2.1.40 Conferir e Catalogar Artefatos 63
2.2.1.41 Avaliar e Direcionar Retorno do Cliente.....64
2.2.1.42 Alocar Consultor Dev. 65
2.2.1.43 Desenvolver 65
2.2.1.44 Homologar Funcionalidade 66
2.2.1.45 Conduzir Homologação com Cliente 67
2.2.1.46 Alocar Analista Negócios.....67
3 PO250 - SUBPROCESSO DE DESENVOLVIMENTO EM PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 69
3.1 SUBPROCESSO DE DEMANDAS DE CUSTOMIZAÇÃO/INTEGRAÇÃO ERP EM PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 70
3.1.1 Elementos do processo 70
3.1.1.1 Assumir Demandas em Aberto.....70
3.1.1.2 Avaliar Escopo e Esforço para Executar a Demanda 71
3.1.1.3 Realizar Reunião de Escopo da Venda e Resolver Impedimentos..72
3.1.1.4 Notificar GP sobre Impedimentos 72
3.1.1.5 Escalonar Demanda p/ Tomada de Decisão.....73
3.1.1.6 Planejar Elaboração da Especificação 74
3.1.1.7 Alocar Consultor Implantação 75
3.1.1.8 Elaborar Especificação Funcional 75
3.1.1.9 Encaminhar Especificação para Avaliar.....76
3.1.1.10 Verificar Conformidade do Documento.....77
3.1.1.11 Encaminhar p/ Gerente de Projetos.....78
3.1.1.12 Solicitar Assinatura Eletrônica do Cliente 78
3.1.1.13 Avaliar Especificação.....79
3.1.1.14 Direcionar Retorno do Cliente.....79
3.1.1.15 Planejar Desenvolvimento 81
3.1.1.16 Alocar Consultor Dev. 82
3.1.1.17 Desenvolver 82
3.1.1.18 Homologar Funcionalidade.....83
3.1.1.19 Repassar Funcionalidade p/ Homologação do Consultor 83

3.1.1.20 Homologar Funcionalidade 84
3.1.1.21 Conduzir Homologação com Cliente 85
3.1.1.22 Homologar Funcionalidade 86
3.1.1.23 Avaliar e Direcionar Retorno do Cliente 87
3.1.1.24 Conferir e Catalogar Artefatos 88
3.1.1.25 Desenvolver 88
4 PO250 - SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO PADRONIZADA 90
4.1 MONITORAMENTO E CONTROLE 91
4.1.1 Elementos do processo 91
4.1.1.1 Monitorar e Realizar Comunicação 91
4.1.1.2 Monitorar e Gerir Equipe 92
4.1.1.3 Monitorar e Controlar Escopo 93
4.1.1.4 Monitorar e Garantir Qualidade 94
4.1.1.5 Monitorar e Controlar Custos 95
4.1.1.6 Gerar Status Report (interno e externo) 96
4.1.1.7 Transferir Projetos 98
4.1.1.8 Monitorar e Atualizar Cronograma 100
4.1.1.9 Gerir Mudança Organizacional 101
4.1.1.10 Assinatura Eletrônica DOC Studio 102
4.1.1.11 Enviar pacotes para Biblioteca de Artefatos 103
4.1.1.12 Monitorar e Controlar Mudanças 106
4.1.1.13 Monitorar e Controlar Riscos 108
4.1.1.14 Monitorar e Controlar Problemas 108
4.1.1.15 Cancelar ou Suspender Projeto 109
4.2 PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO PADRONIZADA 110
4.2.1 Elementos do processo 110
4.2.1.1 Repasse do cliente para o Suporte - Sustentação 110
4.2.1.2 Compreender Escopo do Projeto 111
4.2.1.3 Definir Analista/Gerente de Projeto 112
4.2.1.4 Compreender Escopo da Solução 113
4.2.1.5 Realizar Contato com Cliente 115
4.2.1.6 Primeira Entrevista Comercial 115
4.2.1.7 Alocar recursos e Líder Técnico 117

4.2.1.8 Realizar a Transição Técnica 118
4.2.1.9 Realizar Reunião Inicial com Cliente 122
4.2.1.10 Listar e Alinhar GAP's da DEAP 123
4.2.1.11 Acionar/ Aguardar Executivo da Venda 125
4.2.1.12 Abrir Chamado para a UCS 125
4.2.1.13 Solicitar o Tenant 126
4.2.1.14 Liberar o Portal de Implantação 127
4.2.1.15 Solicitar Ambiente/ Instalação 127
4.2.1.16 Apresentar Portal Foundation 128
4.2.1.17 Alocação Time Migração 128
4.2.1.18 Desenvolver Cronograma Inicial 130
4.2.1.19 Planejar os Recursos 133
4.2.1.20 Planejar apresentação DPS's padrões 133
4.2.1.21 Alinhar com Consultoria Implantação 135
4.2.1.22 Realizar apresentação de Kick Off 139
4.2.1.23 Reunião Foundation (Agenda de Oba Oba) 140
4.2.1.24 Apresentar DPS's Padrões 141
4.2.1.25 Preencher DLC Eletrônica 143
4.2.1.26 Elaborar Change Request de Levantamento 144
4.2.1.27 Elaborar e apresentar a Change Request 144
4.2.1.28 Registrar Demanda de Desenvolvimento 145
4.2.1.29 Processo para Demandas de Customizações 146
4.2.1.30 Explicar e Liberar CTS's 146
4.2.1.31 Elaborar CRAE 147
4.2.1.32 Detalhar planejamento do projeto 148
4.2.1.33 Realizar reunião de encerramento de Fase 2 151
4.2.1.34 Parametrizar e configurar o sistema 153
4.2.1.35 Classificar e liberar testes 153
4.2.1.36 Repasse das Parametrizações para os usuários chaves 154
4.2.1.37 Realizar Customizações 155
4.2.1.38 Efetuar Testes Unitários 155
4.2.1.39 Preparar Testes Integrados 156

4.2.1.40 Realizar Testes Integrados 157
4.2.1.41 Stress Test 159
4.2.1.42 Acionar Time de Suporte 159
4.2.1.43 Planejar Entrada em Produção 161
4.2.1.44 Realizar Reunião de Go / no Go 162
4.2.1.45 Passar cliente para o suporte 163
4.2.1.46 Ativar o Sistema em Produção 166
4.2.1.47 Acompanhar o Sistema em Produção 166
4.2.1.48 Encerrar saldo de horas 167
4.2.1.49 Registrar lições aprendidas 169
4.2.1.50 Encerrar o projeto com o cliente 173
4.2.1.51 Cancelar Projeto 175
4.2.1.52 PO044 - Instalação de Soluções Senior 176
4.2.1.53 Registrar Demanda de Desenvolvimento 176
4.2.1.54 Processo para Demandas de Customizações 178
4.2.1.55 ATA 178
5 PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO ERP X - ATIVAÇÃO 179
5.1 MONITORAMENTO E CONTROLE 180
5.1.1 Elementos do processo 180
5.1.1.1 Sucesso do Cliente 180
5.1.1.2 Monitorar e Realizar Comunicação 180
5.1.1.3 Monitorar e Gerir Equipe 181
5.1.1.4 Monitorar e Controlar Escopo 182
5.1.1.5 Monitorar e Garantir Qualidade 183
5.1.1.6 Monitorar e Controlar Custos 184
5.1.1.7 Gerar Status Report (interno e externo) 185
5.1.1.8 Transferir Projetos 187
5.1.1.9 Monitorar e Atualizar Cronograma 189
5.1.1.10 Assinatura Eletrônica DOC Studio 191
5.1.1.11 Enviar pacotes para Biblioteca de Artefatos 192
5.1.1.12 Monitorar e Controlar Mudanças 194
5.1.1.13 Monitorar e Controlar Riscos 196
5.1.1.14 Monitorar e Controlar Problemas 197

5.1.1.15 Cancelar ou Suspender Projeto 197
5.2 PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO ERP SENIOR X - ATIVAÇÃO 198
5.2.1 Elementos do processo 198
5.2.1.1 Realizar Contato com Cliente 198
5.2.1.2 Solicitar o Tenant 199
5.2.1.3 Liberar o Portal de Implantação 200
5.2.1.4 Solicitar Ambiente/ Instalação 200
5.2.1.5 Realizar apresentação de Kick Off/Foundation 201
5.2.1.6 Desenvolver Cronograma Inicial 202
5.2.1.7 Monitorar o Foundation 204
5.2.1.8 Homologação/Treinamento dos Módulos 204
5.2.1.9 Acompanhar o Sistema em Produção 205
5.2.1.10 Compreender Escopo do Projeto 205
5.2.1.11 Planejar os Recursos 206
5.2.1.12 Parametrizar e configurar o sistema 207
5.2.1.13 Efetuar Testes Unitários 207
5.2.1.14 Realizar Testes Integrados 208
5.2.1.15 Realizar Reunião de Go / no Go 210
5.2.1.16 Passar cliente para o suporte 211
5.2.1.17 Registrar lições aprendidas 214
5.2.1.18 Encerrar o projeto com o cliente 217
6 PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO ERP X - IMPLANTAÇÃO 220
6.1 MONITORAMENTO E CONTROLE 221
6.1.1 Elementos do processo 221
6.1.1.1 Sucesso do Cliente 221
6.1.1.2 Monitorar e Realizar Comunicação 221
6.1.1.3 Monitorar e Gerir Equipe 222
6.1.1.4 Monitorar e Controlar Escopo 223
6.1.1.5 Monitorar e Garantir Qualidade 224
6.1.1.6 Monitorar e Controlar Custos 225
6.1.1.7 Gerar Status Report (interno e externo) 226
6.1.1.8 Transferir Projetos 228
6.1.1.9 Monitorar e Atualizar Cronograma 230

6.1.1.10 Assinatura Eletrônica DOC Studio.....232
6.1.1.11 Enviar pacotes para Biblioteca de Artefatos 233
6.1.1.12 Monitorar e Controlar Mudanças 235
6.1.1.13 Monitorar e Controlar Riscos 237
6.1.1.14 Monitorar e Controlar Problemas.....238
6.1.1.15 Cancelar ou Suspender Projeto 238
6.2 PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO ERP SENIOR X - IMPLANTAÇÃO 239
6.2.1 Elementos do processo.....239
6.2.1.1 Realizar Contato Inicial por Telefone 239
6.2.1.2 Realizar Contato com Cliente 240
6.2.1.3 Solicitar o Tenant.....241
6.2.1.4 Liberar o Portal de Implantação 241
6.2.1.5 Solicitar Ambiente/ Instalação 242
6.2.1.6 Realizar apresentação de Kick Off/Foundation 242
6.2.1.7 Desenvolver Cronograma Inicial.....243
6.2.1.8 Aderência do Processo do Cliente 245
6.2.1.9 Monitorar o Foundation 246
6.2.1.10 Homologação/Treinamento dos Módulos 246
6.2.1.11 Acompanhar o Sistema em Produção.....247
6.2.1.12 Compreender Escopo do Projeto 248
6.2.1.13 Planejar os Recursos 249
6.2.1.14 Elaborar Change Request de Levantamento.....249
6.2.1.15 Elaborar e apresentar a Change Request.....250
6.2.1.16 Registrar Demanda de Desenvolvimento 250
6.2.1.17 Processo para Demandas de Customizações 251
6.2.1.18 Parametrizar e configurar o sistema 251
6.2.1.19 Realizar Customizações 252
6.2.1.20 Efetuar Testes Unitários.....252
6.2.1.21 Realizar Testes Integrados.....253
6.2.1.22 Realizar Reunião de Go / no Go 255
6.2.1.23 Passar cliente para o suporte 256
6.2.1.24 Registrar lições aprendidas 258

6.2.1.25 Encerrar o projeto com o cliente 261
6.2.1.26 Cancelar Projeto 263

1 PO250-EAS- IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DA TORRE ERP

Informação **INTERNA** (PL037)

APLICAÇÕES E QUADRO DE REVISÃO

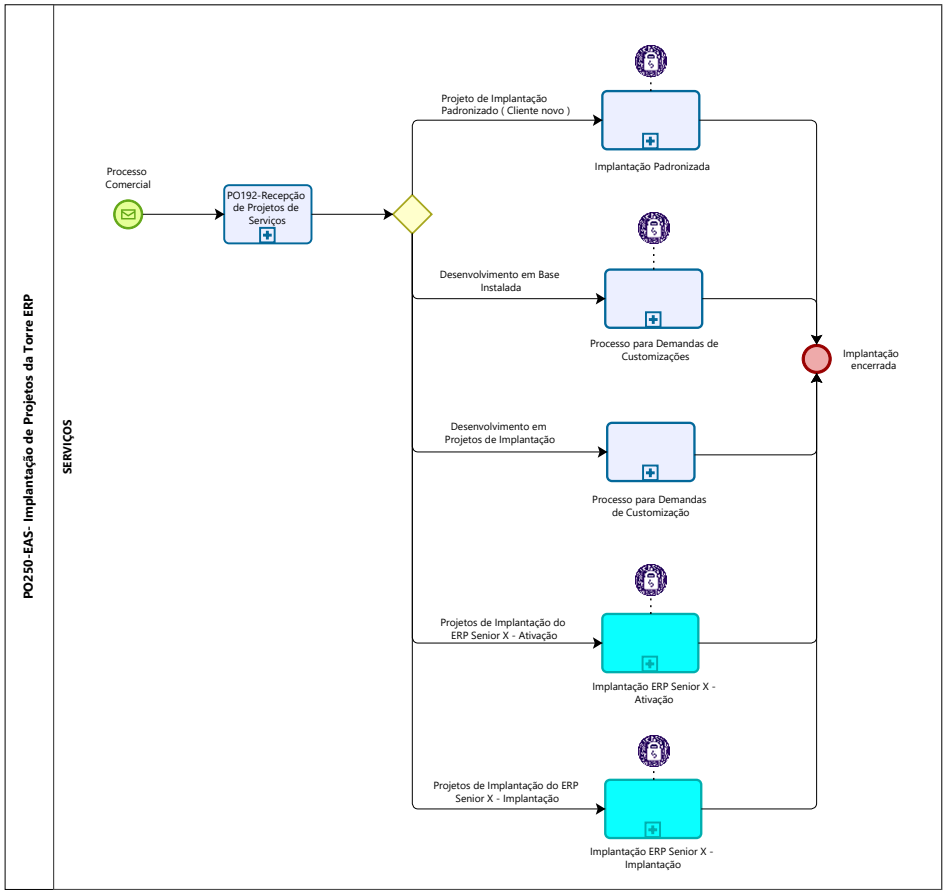

Powered by bizagi Modeler

Versão:

1.0

Autor:

Pmo

1.1 PO250-EAS- IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DA TORRE ERP

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Implantação ERP Senior X - Ativação

Processo

PO250-Subprocesso Implantação ERP X - Ativação - PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO ERP SENIOR X - ATIVAÇÃO

1.1.1.2 Implantação ERP Senior X - Implantação

Processo

PO250-Subprocesso Implantação ERP X - Implantação - PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO ERP SENIOR X - IMPLANTAÇÃO

1.1.1.3 PO192-Recepção de Projetos de Serviços

1.1.1.4 Implantação Padronizada

Processo

PO250 - Subprocesso Implantação Padronizada - PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO PADRONIZADA

1.1.1.5 Processo para Demandas de Customizações

Processo

PO250 - Subprocesso de Desenvolvimento em Base Instalada - Subprocesso de Demandas de Customização/Integração ERP em Base Instalada

1.2 MAIN PROCESS

1.2.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.2.1.1 ☐APLICAÇÕES E QUADRO DE REVISÃO

Descrição
Objetivo:

Garantir que a Torre de ERP esteja conduzindo a implantação do sistema conforme a metodologia **PO038 - EAS (Entrega Acelerada Senior)**.

Principais pontos:

· Estruturada seguindo as **boas práticas do PMI e métodos ágeis**.

· Conduz a execução dos **projetos de implantação.**

· **Padroniza** e visa a **qualidade** nas entregas.

· **Agrega valor** ao cliente.

· Garante a **rentabilidade nos projetos**.

Responsável: Gerente de Serviços

Áreas de Aplicação:

Área	**Cargo/Papel**
Serviços	Todos da Torre ERP
Consultoria de Implantação	Consultor Credenciado ERP

Orientações Gerais:

1) Quando algum artefato da metodologia não se aplicar à realidade do projeto, deve-se:

· Justificar o motivo da anuência do artefato via e-mail ou Ellevo para o Analista de PMO.

· Anexar o e-mail de retorno do Analista de PMO, aprovando a anuência, no DOC Studio.

2) Apenas a gerencia e a direção do Serviços têm alçada para permitir a execução de projetos sem a metodologia.

3) Todos os contatos com o cliente devem ser realizados pelo o e-mail e/ou telefone corporativos. Da mesma maneira, nos artefatos deve haver a menção dessas informações corporativas. Caso o cliente solicite exceção neste processo, é necessário ter essa solicitação por escrito ATA de reunião e Change Request. Isto porque, é premissa para seguir a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Entradas:

· Documentos gerados na fase de vendas - Proposta, DEAP, DETI, QIC, Pedido.

· Diretrizes e informações de processos do cliente coletadas pelo gestor ou consultores do projeto ao iniciar, ou durante o projeto.

· Diretrizes informadas pela gerencia ou diretoria da Senior, ao iniciar ou durante o projeto.

Saídas:

 Sistemas implantados conforme o modelo da implantação: Padronizado, Serviços ou Orientado.

Quadro de Revisões:

Revisão	Data Publicação	Alterado por	Motivo
01.00	10/12/2024	Camila Lamotta Mauro Spader Willian Doerner	Criação da metodologia para torre ERP.

03.00	07/04/2024	Camila Lamotta Mauro Spader	• **Realizar reunião de GO/NO GO** → Alteraçã Patrocinador na DOSP • **Gerar Status Report (interno e externo)** → P reunião de Status Executivo com o Patrocinador do • **Primeira entrevista comercial** → O Analista ou primeira entrevista. • **Realizar testes integrados** → O Analista ou Ge cliente qual o percentual de sucesso que foi atingid • **Desenvolver** → Processo do Consultor inter Desenvolvimento no Jira.
04.00	30/06/2025	Camila Lamotta Mauro Spader Deise Alves	**Atualizações Padronizado:** **Alocar o Recursos e Líder Técnico** → Passa a ocor alinhada com a liderança que contará com o apoio **Desenvolver Cronograma Inicia**l → Houve alteraçã cronograma. **Detalhar Planejamento do Projeto** → O cronogra de Projetos, com base nas tarefas definidas na etap **Passar cliente para o Suporte** → Atualização no fo **Repasse do cliente para o Suporte - Sustentação** sustentação. **Monitorar e controlar mudanças** → Processo na a **Acionar Time de Suporte** → Verificar com o suport semana. **Primeira Entrevista Comercial** → Solicitação de ET
5.0	16/10/2025	Camila Lamotta Camila Soares Aldelir Santos Johson Riegel Jean Silva	Estruturação da metodologia para o ERP Senior X **Atualizações:** Processo de Encerramento Administrativo

1.2.1.2 ISO

Descrição
Este processo atende requisitos da ISO 9001 e ISO 27001.

1.2.1.3 Modelos

Link

Informações documentadas

Tabela

Nome Artefatos

CIV - Checklist de Informações da Venda

CIC - Contato Inicial com o Cliente

TAP - Termo de Abertura do Projeto

RIC - Reunião Inicial com Cliente

AKO - Apresentação de Kick Off

RAS - Relatório de Atendimento de Serviços

DPS - Documento de Processo e Sistema

CRO - Cronograma

CTS - Cenário de Testes do Sistema

RTC - Registro de Treinamento e Capacitação

PEP - Plano de Entrada em Produção

DOSP - Documento de Oficialização do Sistema em Produção

RPS - Repasse do Projeto ao Suporte

TEP - Termo de Encerramento do Projeto

ATA - Atas de Reunião

SR - Status Report

CR - Change Request- Requisição de Mudança

DTP - Documento de Transferência de Projetos

CRAE - Cronograma de Atividades Específicas

Link Templates

Templates da Metodologia

1.2.1.4 Indicadores

Descrição

DASH estabelecido em Serviços.

1.2.1.5 Ferramentas

Ferramentas

Nome
CRM
Zendesk
Business Intelligence - BI
Doc Studio
Fast Project
Ellevo
ServiceNow

1.2.1.6 Procedimentos

Procedimentos

Procedimentos

1.2.1.7 Regra de Negócios de Serviços

Regra de Negócios

Link

1.2.1.8 Documentação Técnica de Serviços

Documentação Técnica

Link

2 PO250 - SUBPROCESSO DE DESENVOLVIMENTO EM BASE INSTALADA

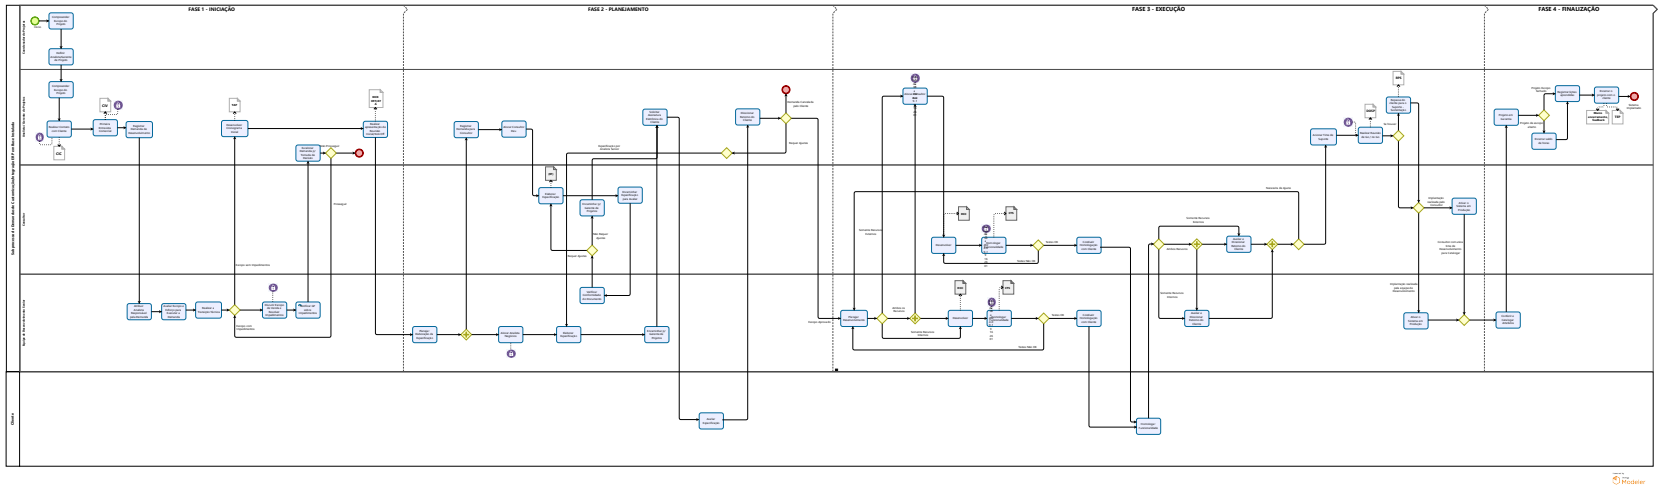

Versão:

1.0

Autor:

Pmo

2.1 CLIENTE

2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1 Avaliar Especificação

Descrição
O cliente deve ler atentamente o conteúdo da especificação enviada e, caso concorde, registrar o aceite formal por meio da assinatura do documento na ferramenta SIGN.

Se houver objeções, o cliente deve retornar por e-mail ao gerente de projetos, detalhando os pontos identificados. Esses pontos serão encaminhados para avaliação do consultor.

Entradas
* Documento de especificação enviado ao cliente.

Saídas
* Registro do aceite formal do cliente.

* E-mail com objeções, se houver, enviado ao gerente de projetos.

Responsável

Cliente

2.1.1.2 Homologar Funcionalidade

Descrição
O Usuário-Chave do cliente deverá realizar a homologação da solução, orientado pelos Cenários de Teste (CTS) previamente disponibilizados. Durante os testes, o cliente deverá preencher a CTS, indicando os resultados obtidos na homologação, categorizando-os como OK, Não OK ou Melhoria.

Caso sejam identificados itens que necessitem de ajustes (classificados como Não OK ou Melhoria), esses devem ser encaminhados ao consultor de implantação e sinalizados ao gerente de projetos. É fundamental que o cliente valide todos os cenários previstos para que a homologação seja considerada finalizada. O aceite do cliente poderá ser realizado de forma eletrônica.

Entradas
* Ambiente de teste configurado com desenvolvimento aplicado, onde os testes serão realizados.

* Documentação da funcionalidade desenvolvida.

* Cenários de teste detalhados.

* Usuário-chave do cliente orientado sobre o processo de homologação.

Saídas
* Resultados dos Testes: Registro dos resultados obtidos, categorizados como OK, Não OK ou Melhoria.

Responsável

Cliente

2.2 SUBPROCESSO DE DEMANDAS DE CUSTOMIZAÇÃO/INTEGRAÇÃO ERP EM BASE INSTALADA

2.2.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.2.1.1 ☐Acionar Time de Suporte

Descrição
De acordo com a necessidade e complexidade do projeto e cliente, o Analista/Gerente de Projetos pode acionar o Suporte previamente para repassar todas as informações necessárias antes do Go Live.

Quando o projeto estiver próximo à data de Go Live, o Gerente de Projetos deverá agendar uma conversa com o líder do suporte e/ou analista técnico responsável (de acordo com os responsáveis descritos no Guia do Suporte), para falar do histórico do projeto:

- Como foi a implantação até aquele momento;
- Relacionamento do cliente com a Senior e expectativas com o projeto;
- Se é necessário envolvimento do time do suporte no planejamento de virada em produção;
- Se foram desenvolvidas customizações e se há integrações;
- Demais pontos importantes para conhecimento do suporte.

O objetivo desta conversa é tornar a transição do projeto para o suporte mais humanizada, tanto para o suporte como para a experiência do Cliente.

E com base nesta conversa, o suporte decidirá se irá se apresentar para o cliente (forma de trabalho, canais de atendimento, prazos) e apoiar no planejamento da virada em produção. Se sim, o Analista/Gerente de Projetos fará o agendamento com o cliente e também envolverá o suporte nas próximas etapas do projeto.

Entradas

Solução homologada pelos usuários-chave

Saídas

Ata de reunião da conversa com o suporte

Reunião agendada para conversa entre Suporte, cliente e time do projeto

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.2 ☐Realizar Reunião de Go / no Go

Descrição
A reunião de GO/NO GO é um momento chave do projeto, onde será realizada a formalização da conclusão do processo de implementação e homologação da solução, bem como o alinhamento para a entrada em produção. Esta reunião deve ser realizada com no mínimo uma semana antes da data prevista do Go Live, e deve envolver o Gerente de Projetos do cliente, o Patrocinador, os Usuários Chave, o Gerente do Projeto e os Consultores envolvidos. A presença do Patrocinador é obrigatória e indispensável, e a reunião deverá ser remarcada até que ele possa participar. Esta reunião deverá ser obrigatoriamente gravada.

IMPORTANTE: Caso o Gerente do Projeto entenda que haverá divergência entre as partes na Reunião de GO/NO GO, onde o Cliente deseja fazer o Go Live mas a equipe do projeto não está segura, a presença do Gerente da Torre e da Coordenação será obrigatória nesta reunião, de modo que seja tomada e documentada uma decisão corporativa a respeito.

A reunião de GO/NO GO resulta no preenchimento da DOSP. Importante destacar que o texto padrão desse documento deve ser adequado à realidade do projeto, e deve obrigatoriamente conter:

- Pendências e restrições.

- Riscos identificados e estratégias de tratamento.

- Impactos identificados.

Após finalizado o texto da DOSP, esse documento deve ser obrigatoriamente assinado pelo Patrocinador através do DOC Studio.

Como registro formal desta reunião, o Gerente do Projeto deve armazenar a gravação, e em seguida formar uma ata onde constam todos os aspectos discutidos na reunião. Essa ata e os materiais apresentados devem ser enviados em formato PDF para todo o time do projeto e para o Comitê Executivo.

Após assinatura do Patrocinador, a DOSP deve ser encaminhada ao e-mail dosp@senior.com.br, para que a Gestão de Faturamento faça a liberação de pagamento de ATST (quando alinhado em proposta). Com o retorno da Gestão do faturamento, é alterado no sistema ERP a situação do cliente para dar início ao atendimento de suporte.

Entradas
-Plano de Entrada em Produção – PEP

-Reunião de Go/No-Go

Saídas
-Documento de Oficialização de Sistema em Produção- DOSP aprovado

-Cronograma das atividades para entrada em produção validado

-Atualização Registro Riscos

-email dosp@senior.com.br

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.3 Repasse do cliente para o Suporte - Sustentação

Descrição
Quando um projeto inclui customizações e/ou integrações desenvolvidas, e o cliente possui o serviço **Suporte Premium Sustentação** contratado, é obrigatório realizar o preenchimento do documento de repasse para a Sustentação, chamado "Repasse do cliente para o Suporte - Sustentação" e o mesmo deve ser enviado a equipe responsável.

Procedimentos para repasse ao Suporte de Sustentação:

1. Preencher o formulário de informações

Utilize o formulário disponível no SharePoint dos Templates ;
Sharepoint > Entrega Acelerada Senior > Templates > Diretório de Templates da Torre

2. Enviar o formulário preenchido

Encaminhe o formulário ao coordenador e analista técnico responsável, conforme orientações disponíveis no Portal de Documentação, no link a seguir (opção "Lideranças

Responsáveis por Produto > Suporte Premium"):
https://documentacao.senior.com.br/guia-do-suporte.htm

No e-mail, inclua a seguinte orientação:

- *Documento de "Repasse do cliente para o Suporte - Sustentação" totalmente preenchido.*
- *Solicitação de agenda para repasse técnico entre time do projeto e time de Sustentação.*

3. Arquivar o e-mail de repasse

Salve o e-mail enviado ao Suporte, com o formulário anexo, na pasta **"Repasse ao Suporte"** localizada no **DOC Studio**.

Observação: O repasse para o suporte de **Sustentação** aplica-se exclusivamente aos produtos **HCM**, **ERP** e **Acesso**.

Entradas
Documento de Oficialização de Sistema em Produção - DOSP aprovado via Doc Studio
Demais documentações técnicas do projeto.

Saídas
Documento de "Repasse do cliente para o Suporte - Sustentação".

Agendamento do repasse técnico para o time de Sustentação.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.4 ☐ Ativar o Sistema em Produção

Descrição

Com o Documento de Oficialização de Entrada em Produção (DOSP) aprovado pelo cliente o consultor de implantação e/ou IT Services, com o auxílio da área de TI do cliente, deve deixar o sistema operando sobre o banco de dados de produção.

Entradas
Documento de Oficialização de Entrada em Produção - DOSP

Saídas
Sistema operando em ambiente de produção.

Responsável

Consultor de Implantação

2.2.1.5 ☐Ativar o Sistema em Produção

Descrição
Com o Documento de Oficialização de Entrada em Produção (DOSP) aprovado pelo cliente o consultor de implantação e/ou IT Services, com o auxílio da área de TI do cliente, deve deixar o sistema operando sobre o banco de dados de produção.

Entradas
Documento de Oficialização de Entrada em Produção - DOSP

Saídas
Sistema operando em ambiente de produção.

Responsável

Consultor de Implantação

2.2.1.6 ☐Projeto em Garantia

Descrição
O projeto permanecerá em garantia por 90 dias corridos, contados a partir da data de entrada em produção (GO Live), sob responsabilidade de acompanhamento do Gerente de Projetos.

Caso haja qualquer acionamento por parte do cliente relacionado a erros ou bugs, o Gerente de Projetos será responsável por encaminhar a demanda à equipe técnica correspondente para correção.

Durante esse período, o Gerente de Projetos deverá manter o status do projeto no ServiceNow como "Em garantia".

Entradas
Sistema em Produção;
DOSP assinada.

Saídas
Acompanhamento do projeto.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.7 Encerrar saldo de horas

Descrição
Para projetos com **escopo aberto**, é necessário informar o saldo disponível para o cliente utilizar em futuros projetos no Termo de Encerramento de Projeto (TEP). Para isso, deve-se abrir um chamado para o financeiro conforme as instruções a seguir:

1 - Senior X > PMO de Serviços > Ellevo



2 - Selecionar Diretoria de Serviços > Governança e Performance > Solicitações > Financeiro > 02.01 Enviar saldo do projeto:

3 - O executivo responsável deve lançar um novo pedido no CRM, garantindo que as horas e o valor sejam inseridos com **valor zerado.**

4- O Portfólio irá cadastrar o novo projeto nas ferramentas necessárias.

5- Após o cadastro no ServiceNow, o Analista/Gerente de Projetos deve transferir o saldo pendente do projeto original para o novo projeto.

6- Com a transferência do saldo concluída, o Analista/Gerente de Projetos deve informar o saldo disponível

7- Caso o projeto seja transferido para "Demanda Avulsa" o prazo máximo para utilizar o serviço deve ser informado no Termo de Encerramento de Projeto (TEP).

Quantidade de horas adquiridas	Prazo Máximo para Utilização dos Serviços
Até 300h	4 meses
Entre 301 e 600h	8 meses
Entre 601 e 1000h	10 meses
Acima de 1000h	12 meses

Importante: O projeto só poderá ser encerrado após a conclusão de todas as etapas descritas acima.

Entradas
Projeto implantado

Saídas
Chamado do financeiro atendido com saldo de horas

Projeto cadastrado no ServiceNow
TEP (Termo de Encerramento do Projeto) com saldo e aprovado pelo cliente.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.8 Registrar lições aprendidas

Descrição
O Analista/Gerente de projetos é responsável por avaliar as ocorrências durante a execução do projeto e registrar as suas observações, sempre dando sugestões de melhorias, seja para incorporar na organização boas práticas usadas no projeto, ou para modificar procedimentos que se manifestaram inadequados durante o projeto.

É recomendado que esta atividade seja executada em conjunto com a equipe do projeto.

As lições aprendidas devem ser registradas na ferramenta Fast Project conforme abaixo:

1 - Acessar Senior X plataform >PMO de Serviços|Gestão de Projetos> Fast:

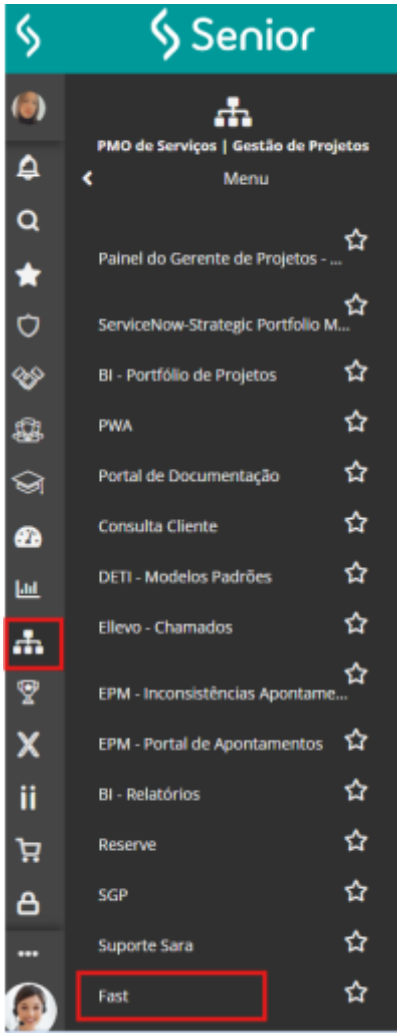

2 -Acessar o Fast Project com o login e senha de rede > Projetos > Filtre o projeto necessário > Project Life:



3 - No Project Life clique em "Registrar Lições Apreendidas":

4 -Lições Aprendidas > preencher as informações > Salvar:

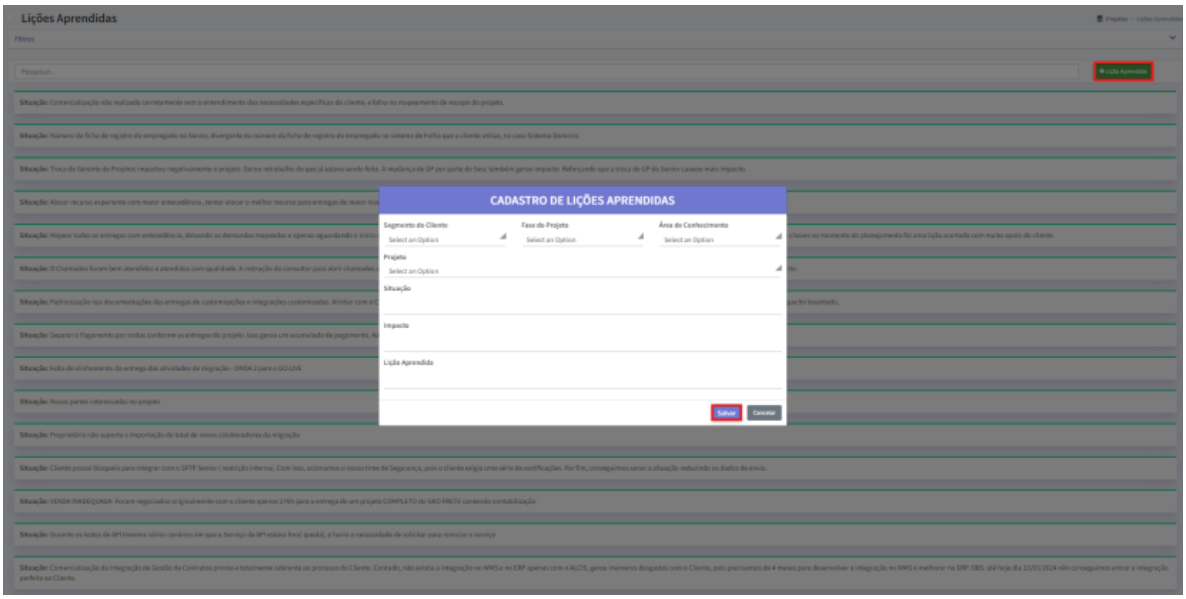

Entradas
Lições aprendidas percebidas ao longo do projeto

Saídas
Registro de lições aprendidas na ferramenta Fast Project

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.9 ☐Compreender Escopo do Projeto

Descrição
Antes de designar um Analista ou Gerente de Projetos, o Coordenador deve compreender detalhadamente a solução vendida ao cliente. Isso inclui as premissas da implantação, as negociações realizadas, e a identificação das informações técnicas da venda e do cliente. É necessário verificar se há outros projetos em andamento nesse cliente, seja do mesmo produto ou de produtos diferentes, e mapear essas informações para informar ao Analista ou Gerente de Projetos, garantindo os devidos cuidados de integração. Além disso, deve-

se consultar o CS para verificar o histórico do cliente (passado, atual, e se é um caso de revitalização).

Os documentos comerciais que auxiliam nesse entendimento são:

· **Proposta Comercial/Edital**

· **Folha de Rosto - Pedido**

· **Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP):** Realizar uma análise prévia do DEAP, comparando o escopo com as horas estimadas.

Entradas
Documentos comercias disponíveis no ServiceNow.

Saídas
Definição do Analista/Gerente de Projetos e alocação nas ferramentas.

Responsável

Responsável

2.2.1.10 ☐Definir Analista/Gerente de Projeto

Descrição
O Coordenador irá designar um Analista ou Gerente de Projetos com base na análise de disponibilidade, conhecimento e experiência, utilizando os documentos comerciais e as informações disponíveis no ServiceNow.
Para clientes novos, o Coordenador deve realizar o primeiro contato, informando que estará acompanhando o projeto. Nesse contato, ele deve apresentar o Analista ou Gerente de Projetos, que será responsável pela condução e comunicação do projeto.

O repasse e alocação nas ferramentas devem ser realizadas conforme a Instrução de Trabalho: IT261 - Definição Gerente de Projeto (sharepoint.com)

Importante: o Coordenador deve repassar o projeto para o Analista ou Gerente de Projetos em até 3 dias úteis.

Entradas

Projeto cadastrado na ferramenta ServiceNow, Doc Studio e Fast Project.
Contato Inicial do Coordenador.

Saídas
Definição do Analista/Gerente de Projetos e alocação nas ferramentas.

Responsável

Coordenador de Projetos

2.2.1.11 ☐Compreender Escopo do Projeto

Descrição
Antes de designar um Analista ou Gerente de Projetos, o Coordenador deve compreender detalhadamente a solução vendida ao cliente. Isso inclui as premissas da implantação, as negociações realizadas, e a identificação das informações técnicas da venda e do cliente. É necessário verificar se há outros projetos em andamento nesse cliente, seja do mesmo produto ou de produtos diferentes, e mapear essas informações para informar ao Analista ou Gerente de Projetos, garantindo os devidos cuidados de integração. Além disso, deve-se consultar o CS para verificar o histórico do cliente (passado, atual, e se é um caso de revitalização).

Os documentos comerciais que auxiliam nesse entendimento são:

· **Proposta Comercial/Edital**

· **Folha de Rosto - Pedido**

· **Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP)**: Realizar uma análise prévia do DEAP, comparando o escopo com as horas estimadas.

Entradas
Documentos comercias disponíveis no ServiceNow.

Saídas
Definição do Analista/Gerente de Projetos e alocação nas ferramentas.

Responsável

Coordenador de Projetos

2.2.1.12 ☐Realizar Contato com Cliente

Descrição
O primeiro contato com o cliente tem como objetivo informá-lo brevemente que a sua demanda foi recebida na área de Serviços, formalizando assim, a transição de pedido comercial para projeto. Este Contato deve ser realizado pelo ServiceNow, conforme instrução de trabalho: IT260 - Processo Contato Inicial (sharepoint.com)

Importante: Esta ação deve ser realizada em até 3 dias úteis a partir do recebimento do projeto.

Entradas
Projeto em nome do Analista/Gerente de Projetos e situação Ativo na ferramenta ServiceNow

Saídas
· Contato Inicial com Cliente

· CIC arquivado no Doc Studio/ServiceNow

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.13 ☐Primeira Entrevista Comercial

Descrição
De posse de todas as informações do projeto recebidas através das documentações no ServiceNow, o Analista ou Gerente do Projeto realiza uma reunião com o Executivo de Conta responsável pela venda para receber mais detalhes a respeito do negócio. O objetivo desta reunião é captar a maior riqueza de detalhes possível a respeito da negociação, e em geral deverá abordar temas como:

- Principais motivadores da contratação.
- Dificuldades da negociação.
- Principais stakeholders.

- Ambiente do cliente.
- Detalhes a respeito dos produtos negociados.
- Riscos percebidos até aqui.
- Cronograma de entrega.
- Modelo de implantação.
- Volume de horas negociado.
- Detalhes das customizações.
- Sistemas legados existentes.
- Infraestrutura disponível ou ambiente cloud.
- Detalhes da migração de dados.
- Modalidade da implantação, se remota, presencial ou híbrida.

Após entender o contexto geral do projeto, o Gerente do Projeto deve registrar no CIV quais documentos foram utilizados para a passagem do negócio, usualmente a Proposta Comercial, Pedido do CRM, Escopo Sintético e Escopo Analítico. O Gerente do Projeto também deve questionar o Executivo da Venda se houve alterações de contrato, se existe uma RFP, se possui e-mails extras com combinados sobre customizações ou faturamentos, entre outros itens significativos que possam apoiar no entendimento da venda.

Os detalhes acima auxiliarão o Analista ou Gerente de Projetos no planejamento geral do projeto e no atendimento dos principais interesses do cliente.

Com base nessas informações o Analista ou Gerente de Projetos inicia o preenchimento do CIV, que será complementado quando realizada a reunião de Transição Técnica.

Após o término da entrevista, o Gerente do Projeto formaliza por e-mail a solicitação ao Executivo de Conta para que o mesmo aloque o Executivo Técnico de Negócio para Reunião de Transição Técnica. Esta reunião deve ser marcada com a devida antecedência

para que o Gerente do Projeto tenha tempo de alocar os Consultores de Implantação e o Líder Técnico. Também deve ser enfatizado neste e-mail que não é possível iniciar as ações do projeto junto ao cliente sem a devida transição técnica junto ao ETN.

Entradas
Compreender o escopo da solução
Realizar contato com cliente
Agendar entrevista com executivo da venda

Saídas
Iniciar o preenchimento do CIV

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.14 Registrar Demanda de Desenvolvimento

Descrição
As atividades de customização identificadas devem ser conduzidas exclusivamente pela equipe de Desenvolvimento do ERP. Se houver necessidade de alocar o Consultor de Implantação, a equipe será responsável por informar o Analista ou o Gerente de Projetos.

Registrar a demanda de solicitação de desenvolvimento no portal Fast Project, incluindo todas as informações relevantes para orientar o processo técnico. Se houver mais de um desenvolvimento previsto no escopo, deve-se cadastrar uma demanda para cada item de desenvolvimento. Para cada demanda, é necessário indicar a data de conclusão desejada e o total de horas estimadas para a execução. O documento de escopo analítico do projeto deve ser anexado à demanda. Comentários adicionais podem ser inseridos para facilitar a compreensão da necessidade e para alinhamentos complementares.

Importante enfatizar que o prazo para conclusão da customização deve considerar a data planejada para início dos testes integrados do projeto de implantação.

Descrever no campo comentários:

- Data Prevista de GO-LIVE

- Data da Expectativa para entrega da especificação/ entrega estimativa

Para mais detalhes, consulte o processo de alocação descrito na instrução de trabalho: IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

Entradas

Alocar recurso através do Fast Project

Plano de recurso/ação criado e aprovado no ServiceNow

* Informações da Demanda.

* Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP).

Saídas

Desenvolvimento das Customizações

* Registro da demanda no portal Fast Project.

Responsável

Analista/Gerentes de Projetos

2.2.1.15 ☐ Realizar a Transição Técnica

Descrição

Tendo definido quem fará o papel de Líder Técnico do Projeto, o Analista ou Gerente do Projetos providencia agora a Reunião de Transição Técnica do projeto.

Importante notar que a reunião de transição deve ser programada com antecedência e deve considerar o porte do projeto na estimativa de duração. É preciso considerar que ela deve ter duração suficiente para discussão de detalhes técnicos do negócio, que variam conforme o projeto. Para que a reunião de transição técnica tenha sucesso, é preciso envolver obrigatoriamente os seguintes papéis:

- Executivo da Conta
- Executivo Técnico de Negócios
- Líder Técnico
- Analista ou Gerente do Projeto
- Responsável pela Consultoria
- Consultores de Implantação
- Analista de Negócio e Analista de Sistemas (caso existam customizações comercializadas).

Conforme a necessidade, também poderão participar o coordenador de projetos da torre, o gestor de serviços da filial e o líder comercial. É recomendado ainda que a reunião seja presencial, de modo a tirar o maior proveito da troca de informações.

É recomendado ainda que a reunião seja gravada e acrescentada aos artefatos do projeto para consulta futura

A reunião deve iniciar considerando o histórico da negociação e as dificuldades encontradas. O Executivo de Conta deve passar aqui suas impressões sobre a cultura do cliente, principais partes interessadas e fatores de risco da negociação, de modo que os participantes técnicos possam considerar essas informações em seu planejamento.

O objetivo principal da transição técnica é discutir os produtos vendidos para o cliente, considerando agora o ponto de vista técnico da implementação dos mesmos. Em geral, os assuntos abordados nesta reunião passam por:

- Empresas e filiais do cliente

- Empresas e filiais onde ocorrerá a implantação
- Modelo de tributação do cliente
- Segmento de atuação do cliente
- Principais processos do cliente
- Diferenciais do cliente em seu segmento
- Produtos negociados e como serão usados
- Customizações negociadas
- Possíveis customizações e produtos não negociados
- Decisões sobre produtos ou customizações sabidamente não contratadas
- Riscos para processos e negócio
- Obtenção de dados para migração
- Identificação de possíveis gaps e alternativas.
- Parceria do cliente com escritório contábil
- Integrações com outros sistemas

Ao final desta reunião o Gerente do Projeto e o Líder Técnico devem ter um maior refino dos detalhes técnicos do projeto. Desta forma o Analista ou Gerente do Projeto finaliza o CIV com as informações captadas nesta reunião, e envia para assinatura dos envolvidos.

Caso sejam identificados GAPs durante a transição técnica, os mesmos precisam ser registrados no CIV, com os devidos encaminhamentos e responsáveis. O Analista ou Gerente de Projetos será a pessoa responsável por fazer o acompanhamento dos mesmos.

Importante: Para formalizar o resultado da reunião, o **Checklist de Informações da Venda (CIV)** deve ser preenchido no **Project Life** e enviado ao executivo da conta para aprovação via DOC Studio.

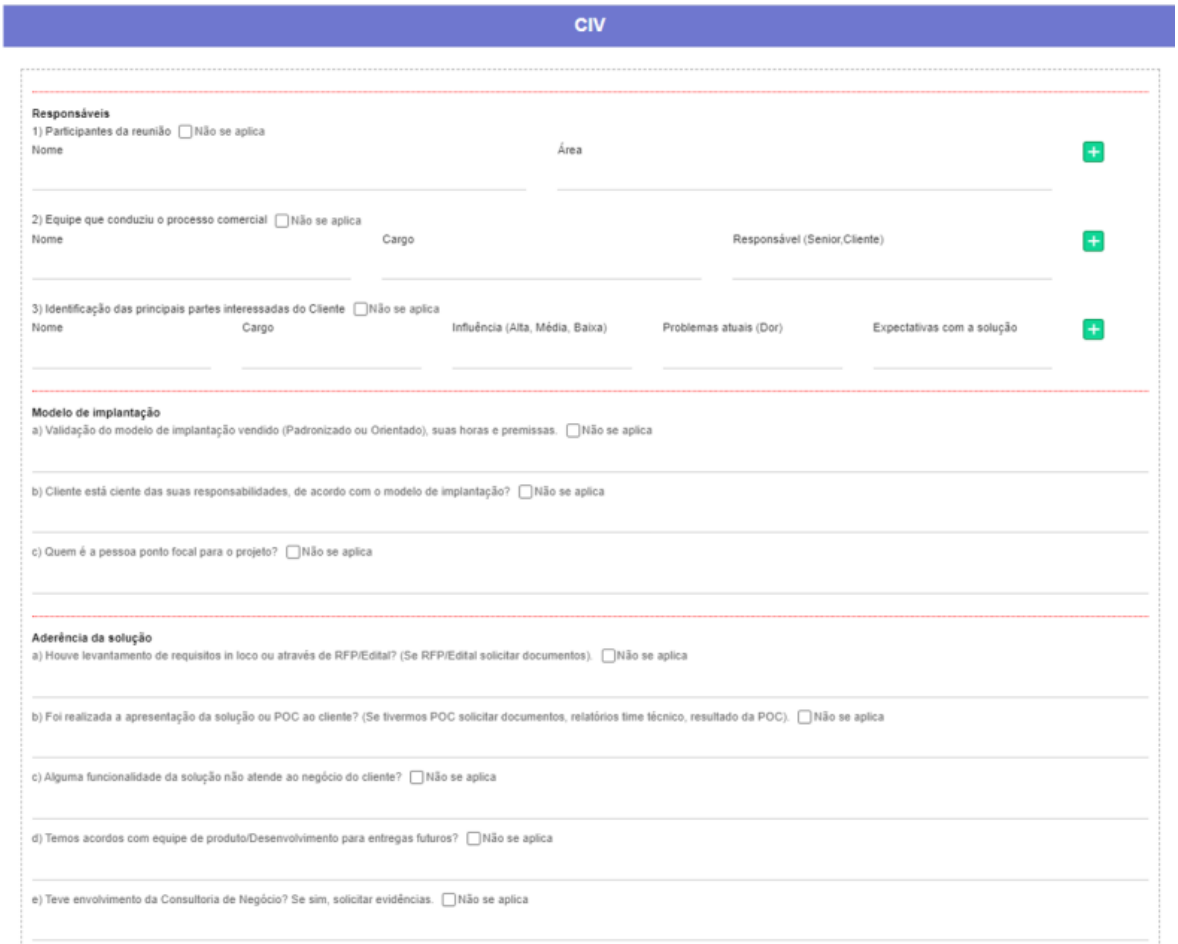

CIV

Responsáveis

1) Participantes da reunião ☐ Não se aplica

Nome	Área

2) Equipe que conduziu o processo comercial ☐ Não se aplica

Nome	Cargo	Responsável (Senior,Cliente)

3) Identificação das principais partes interessadas do Cliente ☐ Não se aplica

Nome	Cargo	Influência (Alta, Média, Baixa)	Problemas atuais (Dor)	Expectativas com a solução

Modelo de implantação

a) Validação do modelo de implantação vendido (Padronizado ou Orientado), suas horas e premissas. ☐ Não se aplica

b) Cliente está ciente das suas responsabilidades, de acordo com o modelo de implantação? ☐ Não se aplica

c) Quem é a pessoa ponto focal para o projeto? ☐ Não se aplica

Aderência da solução

a) Houve levantamento de requisitos in loco ou através de RFP/Edital? (Se RFP/Edital solicitar documentos). ☐ Não se aplica

b) Foi realizada a apresentação da solução ou POC ao cliente? (Se tivermos POC solicitar documentos, relatórios time técnico, resultado da POC). ☐ Não se aplica

c) Alguma funcionalidade da solução não atende ao negócio do cliente? ☐ Não se aplica

d) Temos acordos com equipe de produto/Desenvolvimento para entregas futuros? ☐ Não se aplica

e) Teve envolvimento da Consultoria de Negócio? Se sim, solicitar evidências. ☐ Não se aplica

Atenção: Caso sejam identificadas pendências, estas devem ser registradas no checklist para fins de formalização. Contudo, para acompanhar e dar seguimento nas tratativas o Analista ou Gerente de Projetos pode utilizar o Plano de Ação na ferramenta ServiceNow.

Entradas

Leitura dos documentos comerciais disponíveis no ServiceNow.

Saídas

Checklist de Informações da Venda

CIV preenchido e aprovado através do Doc Studio

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.16 ☐ Desenvolver Cronograma Inicial

Descrição

O cronograma inicial do projeto pode ser criado a partir dos cronogramas padrões de cada solução Senior, podendo ser adaptado ou ajustado conforme necessidade do projeto (exemplo: remover os módulos não adquiridos pelo cliente, agrupamento de tarefas etc.).

É necessário ter um planejamento macro do projeto e realizar uma distribuição das horas nas atividades, podendo ser planejadas com as horas associadas, tendo como base as informações do DEAP (Documento de Escopo Analítico do Projeto), a estrutura deve considerar as fases da metodologia da Senior.

O cronograma inicial será a linha base e de referência. O baseline será salvo quando submeter o projeto para fase de Planejamento.

- Submeter o projeto para a fase de planejamento e a primeira linha de base será salva de forma automática:

- Mensagem Finalizando primeira fase do projeto com linha de base salva:

Horas UCS:

As horas da UCS/EAD são adicionadas ao total de horas do projeto e deve-se criar uma tarefa no cronograma com estas horas e atualizar como 100% ou concluída para descontar do total, pois estas horas não devem ser consideradas para gestão.

Horas de reserva e contingência

É indicado realizar a reserva de horas de contingência no projeto, para uso em caso de emergência com o sugerido de 10% das horas totais.

As horas de reserva de contingência devem ser incluídas no cronograma, quebrando as atividades por tipo de recurso.

Importante que estas atividades possuam como data final a mesma data da atividade de TEP, pois desta forma não terá interferência na apuração de indicadores.

Caso seja necessário utilizar a reserva de contingência, somente precisará atualizar o cronograma acrescentando as horas na tarefa correta e subtrair as horas da tarefa de contingencia.

Importante: O cronograma inicial será considerado como a primeira linha de base, conforme o escopo do projeto. Essa primeira baseline corresponde ao cronograma macro e não necessita da aprovação do cliente.

Instrução de Trabalho: IT179 - Cronograma ServiceNow (sharepoint.com)

Entradas
Documento de Escopo Analítico do Projeto - DEAP

- TAP

Saídas
Cronograma criado

1º baseline salva

Responsável

Analista / Gerente de Projetos

2.2.1.17 ☐Realizar apresentação de Reunião Inicial/Kick Off

Descrição
Em projetos de desenvolvimento com mais de 300 horas, é obrigatória a realização da reunião inicial e da reunião de Kick-Off.

Na **reunião inicial** devem ser revisados os componentes e documentos detalhados do projeto:

· Leitura em conjunto com o cliente,de cada item do Documento de Escopo Sintético **(Obrigatório)**

· Mapear as expectativas do cliente com a implantação do sistema, seus objetivos e propósito

· Metodologia: fases do projeto e seus entregáveis **(Obrigatório - Evidencia)**

· Comunicar as necessidades de participação das pessoas, com papéis e responsabilidades (GP do cliente, usuarios chavez)

· Horário de trabalho e ambiente físico/remoto necessário

· Escopo e fora do escopo

· Premissas e restrições

· Faturamento de serviços e despesas do projeto

· Marcos do projeto

· Avaliação inicial das datas para apresentação das DPS's

· Disponibilizar as DPs através do Doc Studio para leitura do cliente e prévio entendimento do que será implementado

· Prazo esperado para a conclusão dos treinamentos EAD e dados de acesso

· Validação do entendimento da DETI

· Alinhamentos de riscos iniciais

· Identificar partes interessadas

· Explicar aprovações no Doc Studio

Os assuntos abordados devem ser formalizados no Termo de Abertura do Projeto - TAP (Documento encontra-se na pasta Entrega Acelerada Senior) e registrados em ata, junto com as pendências e os próximos passos do projeto.

É importante a participação do executivo da conta (Comercial) e em caso de projetos TIER 1 e 2 recomenda-se a participação do ETN.

Listar alinhas GAPs:

Após reunião com o cliente, baseado nos alinhamentos feitos e na análise do escopo e horas do projeto, é necessário internamente formalizar os pontos não aderentes.

Quando a solução padrão não atender completamente o negócio do cliente ou existir divergência entre o que cliente espera e alega ter sido comercializado, o gerente de projetos deverá envolver as áreas/pessoas necessárias para analisar e viabilizar alternativas para implantação, de acordo com o cenário identificado.

Deve-se analisar:

· Os riscos em relação à implantação;

· Os pontos de não aderência da solução e os seus impactos;

· Se as horas estimadas na venda são suficientes para continuidade do projeto ou se serão necessárias horas não faturadas, bem como a área responsável;

· As expectativas do cliente em relação ao que foi vendido.

A partir disto, os envolvidos devem decidir a melhor alternativa para prosseguir com a implantação, as ações necessárias e as responsabilidades.

Se houver desvios, preocupações e problemas identificados, eles devem ser tratados internamente, antes continuar as tratativas com o cliente e iniciar as entregas da próxima fase.

As decisões deste alinhamento devem ser registradas em ata de reunião, aprovadas via DOC Studio.

Na reunião de **Kickoff** é necessário alinhar todo o escopo contratado, apresentar a metodologia de implantação, falar sobre possíveis identificações de customizações, reforçar a importância do envolvimento, comprometimento e engajamento do time do projeto, reforçar todas as premissas alinhadas no inicio do projeto, apresentar o time do projeto, papeis e responsabilidades e também o plano de comunicação.

É importante disponibilizar o material apresentado na reunião para o cliente, sendo assim, anexar no DOC Studio o e-mail enviado ao cliente com **Apresentação de Kick Off - AKO.**

Observação: Para projetos mais complexos ou conforme o Analista ou Gerente de Projetos avaliar a necessidade de acordo com o cliente, uma reunião inicial pode ser realizada antes do Kick Off.

Entradas

DEAP Validada;

TAP;

Cronograma Macro.

Saídas

PPT de apresentação de Kick Off;

E-mail enviado ao cliente com apresentação do Kick Off arquivado no Doc Studio;

Planejar e controlar riscos.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.18 ☐ Encerrar o projeto com o cliente

Descrição

Esta atividade representa a conclusão do projeto de implantação do sistema, abrangendo a totalidade ou apenas módulos específicos que foram implementados conjuntamente.

Nesta fase, a equipe Senior e o cliente verificam se os objetivos e as expectativas definidos no início do projeto foram cumpridos.

É essencial ouvir o feedback do cliente e informá-lo sobre o envio da pesquisa NPS, destacando a importância de sua participação.

Com o encerramento do projeto, a equipe envolvida será desativada. Caso haja continuidade de trabalhos por parte dos consultores da Senior, estes serão realizados como serviços avulsos.

Se a formalização do encerramento do projeto não estiver documentada na DOSP, o gerente de projetos deve elaborar o **Termo de Encerramento do Projeto (TEP)** e solicitar a aprovação do cliente.

O Analista/Gerente de Projetos deve assegurar que toda a documentação gerada esteja arquivada na pasta do projeto no Doc Studio, que todas as atividades estejam concluídas e que o saldo de horas no cronograma seja zerado.

Encerramento administrativo do projeto

O Processo de encerramento administrativo deverá ser realizada após 90 dias da conclusão do projeto.

O processo completo está na IT337- Encerramento Administrativo de Projetos

Entradas
Documento de Oficialização de Sistema em Produção - DOSP
Sistema em produção

Saídas
Comunicado sobre encerramento do projeto para o Cliente

Termo de Encerramento do Projeto - TEP aprovado pelo cliente via Doc Studio (opcional, caso o DOSP contenha o termo de encerramento).

Projeto encerrado ServiceNow.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.19 ☐ Atribuir Analista Responsável pela Demanda

Descrição

1. Verificar as demandas em aberto para garantir que todas as informações necessárias estejam disponíveis e distribuí-las entre a equipe de analistas.

2. Deve ser indicado um analista de negócios responsável pela demanda, que deve ser aprovada com uma data para o início da atuação. Após a aprovação, uma tarefa no Jira será gerada automaticamente.

3. Incluir um comentário na demanda para notificar o gerente de projetos por e-mail sobre quem assumiu a tarefa e o prazo de início.

4. Caso a documentação esteja ausente ou incompleta, notificar o gerente de projetos para que ele tome as providências necessárias. Nesses casos, a demanda não deverá ser aprovada e ficará aguardando retorno.

5. Se não houver retorno com as informações ausentes e nenhum posicionamento em 7 dias, inserir uma nova mensagem notificando o gerente de projetos que a demanda será mantida em aberto por mais 7 dias. Se não houver retorno ou posicionamento com previsão de retorno, a demanda deverá ser cancelada, sendo necessário abrir uma nova demanda futuramente.

Entradas
* Demanda registrada no portal contendo:

a. Documentação do projeto: DEAP e outros documentos relevantes.

b. Informações sobre as necessidades e expectativas do cliente.

c. Dados sobre o prazo e horas disponíveis para execução.

Saídas
* Notificação ao gerente de projetos sobre a situação da documentação, aprovação da demanda com data de início definida e comentário na demanda informando o responsável e o prazo.

* Tarefa no JIRA referente a demanda.

Responsável

Business Analyst

2.2.1.20 ☐ Avaliar Escopo e Esforço para Executar a Demanda

Descrição

Avaliar criteriosamente o escopo do projeto dentro do prazo estipulado ao assumir a demanda, a fim de contextualizar a necessidade e providenciar o seguimento adequado para o atendimento. Caso surjam impedimentos referentes ao escopo ou à estimativa de esforço, estas podem ser discutidas com o ETN responsável pela elaboração do escopo de venda, conforme indicado no documento de escopo (DEAP).

Entradas

* Tarefa no JIRA referente a demanda.

Saídas

* Contextualização sobre o escopo do projeto.

* Lista de questões a serem discutidas com o ETN, em caso de impedimentos.

* Diretrizes para o seguimento do atendimento.

Responsável

Business Analyst

2.2.1.21 ☐ Discutir Escopo de Venda e Resolver Impedimentos

Descrição

Contatar o ETN responsável pela elaboração do escopo de venda para discutir juntos questões relacionadas ao escopo e ao esforço necessário. O objetivo é resolver os impedimentos que estão dificultando a execução da demanda.

Entradas

* Informações sobre o escopo atual.

* Detalhes sobre os impedimentos identificados.

Saídas
* Soluções propostas para os impedimentos.

* Diretrizes para o seguimento do atendimento.

Responsável

Business Analyst

2.2.1.22 Notificar GP sobre Impedimentos

Implementação

Serviço Web

Descrição
Caso não haja consenso entre os analistas da equipe de desenvolvimento e o ETN sobre os impedimentos identificados, seja em relação ao escopo ou à estimativa de esforço, o gerente de projetos deverá ser notificado. Ele será responsável por escalar a questão para avaliação e tomada de decisão pela coordenação.

Entradas
* Lista de impedimentos identificados pelos analistas.

* Feedback da equipe de desenvolvimento e do ETN.

* Documentação sobre o escopo e estimativas de esforço.

Saídas
* Notificação formal por e-mail ao gerente de projetos.

Responsável

Business Analyst

2.2.1.23 Escalonar Demanda p/ Tomada de Decisão

Descrição
Levar as informações e opiniões coletadas da equipe de desenvolvimento e do ETN para um nível superior de decisão, ou seja, apresentar esses dados ao coordenador de

desenvolvimento. O objetivo é garantir que os impedimentos identificados sejam avaliados adequadamente, permitindo que a coordenação tome decisões informadas sobre como prosseguir com a demanda.

Entradas
* Feedback da equipe de desenvolvimento e do ETN.

Saídas
* Decisão da coordenação sobre o seguimento da demanda.

Responsável

Gerente de Projetos

2.2.1.24 ☐Planejar Elaboração da Especificação

Descrição
Com o escopo de venda claramente definido e sem impedimentos, deve-se planejar a elaboração do documento de especificação de desenvolvimento. Neste estágio, é necessário contatar o gerente de projetos para identificar os recursos requeridos e iniciar os trâmites para alocação.

Para demandas de base instalada, a elaboração da especificação pode ser realizada pelo analista de negócios da equipe de desenvolvimento, caso não tenha o Analista de Negócio disponível o Gerente de Projetos deverá alocar algum consultor credenciado a ser designado.

Entradas
* Informações sobre a demanda sem impedimentos.

Saídas
* Prazos para a elaboração do documento de especificação.

Responsável

Business Analyst

2.2.1.25 ☐Registrar Demanda para Consultor

Descrição
Registrar a demanda de solicitação de consultor no portal Fast Project para a elaboração do documento de especificação, incluindo todas as informações relevantes que orientem o processo técnico.

O gerente de projetos poderá agendar uma reunião, se necessário, entre o consultor que se candidatou à demanda e o analista da equipe de desenvolvimento, para discutir detalhes sobre o escopo e alinhar expectativas.

Entradas
* Informações da Demanda.

* Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP).

Saídas
* Registro da demanda no portal Fast Project.

* Identificação do consultor requerido para a atividade.

* Alinhamento de expectativas entre consultor e equipe de desenvolvimento.

Responsável

Gerente de Projetos

2.2.1.26 ☐Alocar Consultor Dev.

Descrição
Alocar o consultor no cronograma do projeto para a elaboração do documento de especificação. Além disso, deve-se levantar com o analista da equipe de desenvolvimento as horas previstas para essa atividade. A aprovação dos apontamentos será realizada mediante a concordância do analista da equipe de desenvolvimento.

Entradas
* Informações da Demanda.

* Identificação dos consultores requeridos para a atividade.

Saídas
* Cronograma atualizado que inclua a alocação do consultor.

Responsável

Gerente de Projetos

2.2.1.27 ☐Elaborar Especificação

Descrição
Elaborar o documento de especificação funcional seguindo o template disponibilizado. Este documento deve descrever detalhadamente o cenário atual do processo, o problema a ser resolvido, os objetivos do cliente e as funcionalidades do processo proposto para desenvolvimento. Além disso, é fundamental que sejam apresentados os requisitos funcionais de forma clara, garantindo a compreensão dos objetivos do desenvolvimento e dos resultados esperados.

A solução proposta deve estar embasada no documento de escopo comercial (DEAP), respeitando as premissas estabelecidas e funcionalidades adicionais que não estejam previstas no escopo.

Se necessário, deve-se entrar em contato com o cliente para esclarecer dúvidas e solicitar informações complementares que ajudem a enriquecer o detalhamento do documento.

Entradas
* Informações sobre a demanda sem impedimentos.

* Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP).

* Atividade liberada no projeto para o Consultor de Implantação.

Saídas
* Documento de Especificação Funcional (EF).

Responsável

Consultor Desenvolvedor

2.2.1.28 ☐Encaminhar Especificação para Avaliar

Descrição

Antes de enviar ao cliente, encaminhar por e-mail o documento de especificação para que o analista de negócios da equipe de desenvolvimento o avalie. Aguardar o feedback para prosseguir.

Entradas
* Documento de especificação a ser revisado.

Saídas
* Envio de e-mail ao analista da equipe de desenvolvimento.

Responsável

Consultor Desenvolvedor

2.2.1.29 ☐Verificar Conformidade do Documento

Descrição
Avaliar se o documento está conforme o formato esperado e se contém todas as informações necessárias para viabilizar o desenvolvimento, incluindo a identificação de possíveis impedimentos técnicos. Além disso, verificar a possibilidade de reaproveitamento consultando a biblioteca de personalizações.

Entradas
* Documento de especificação a ser revisado.

Saídas
* Feedback e sugestões do analista sobre o documento de especificação.

* Identificação de impedimentos técnicos, se houver.

* Sugestões de reaproveitamento de personalizações.

Responsável

Business Analyst

2.2.1.30 ☐Encaminhar p/ Gerente de Projetos

Descrição
Após receber o feedback do analista de negócios, se não houver necessidade de ajustes, encaminhar o documento de especificação ao gerente de projetos para que ele possa iniciar os trâmites necessários para a coleta da assinatura eletrônica do cliente.

Entradas
* Feedback do analista de negócios.

* Documento de especificação revisado.

Saídas
* Documento de especificação encaminhado ao gerente de projetos.

Responsável

Consultor Desenvolvedor

2.2.1.31 ☐Solicitar Assinatura Eletrônica do Cliente

Descrição
Submeter o documento de especificação funcional para a assinatura eletrônica dos responsáveis do cliente por meio da ferramenta SIGN. Se necessário, agendar uma reunião com o cliente e o consultor para alinhamento e validação prévia.

Entradas
* Documento de especificação revisado.

* Lista de responsáveis do cliente.

Saídas
* Documento de especificação funcional submetido para assinatura eletrônica.

* Registro da reunião, se realizada, com feedback e validações do cliente.

Responsável

Gerente de Projetos

2.2.1.32 ☐Direcionar Retorno do Cliente

Descrição
O gerente de projetos avalia o retorno do cliente e direciona as tratativas conforme a seguinte classificação:

a) Escopo Aprovado: Comunica ao analista de negócios para que este dê seguimento ao planejamento junto à equipe.

b) Requer Ajustes: Encaminha ao consultor para realizar a avaliação e os ajustes necessários. O consultor deve atualizar os requisitos reportados que não contrariam o escopo contratado e reencaminhar a especificação para revisão do analista sênior. Se forem apenas esclarecimentos, sem necessidade de alteração do documento, o consultor tratará diretamente com o cliente.

c) Mudança de Escopo: Informa o cliente sobre o escopo adicional e questiona sobre a abertura de uma solicitação de mudança para dar prosseguimento aos trâmites.

Entradas
* Retorno do cliente sobre documento de especificação.

Saídas
a) Especificação aprovada via SIGN.

b) E-mail com objeções, se houver, encaminhado ao consultor.

c) Registro de Solicitação de Mudança na ferramenta Service Now.

Responsável

Gerente de Projetos

2.2.1.33 Elaborar Especificação

Descrição
Elaborar o documento de especificação funcional seguindo o template disponibilizado. Este documento deve descrever detalhadamente o cenário atual do processo, o problema a ser resolvido, os objetivos do cliente e as funcionalidades do processo proposto para desenvolvimento. Além disso, é fundamental que sejam apresentados os requisitos funcionais de forma clara, garantindo a compreensão dos objetivos do desenvolvimento e dos resultados esperados.

A solução proposta deve estar embasada no documento de escopo comercial (DEAP), respeitando as premissas estabelecidas e funcionalidades adicionais que não estejam previstas no escopo.

Se necessário, deve-se entrar em contato com o cliente para esclarecer dúvidas e solicitar informações complementares que ajudem a enriquecer o detalhamento do documento.

Entradas
* Informações sobre a demanda sem impedimentos.

* Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP).

* Atividade liberada no projeto para o Analista de Negócios.

Saídas
* Documento de Especificação Funcional (EF).

Responsável

Business Analyst

2.2.1.34 ☐Encaminhar p/ Gerente de Projetos

Descrição
Encaminhar o documento de especificação ao gerente de projetos para que ele possa iniciar os trâmites necessários para a coleta da assinatura eletrônica do cliente.

Entradas
* Documento de especificação revisado.

Saídas
* Documento de especificação encaminhado ao gerente de projetos.

Responsável

Business Analyst

2.2.1.35 ☐Planejar Desenvolvimento

Descrição
Planejar tecnicamente as atividades de desenvolvimento, gerando as tarefas na ferramenta Jira de acordo com as diretrizes do documento IT226 - Uso da ferramenta Jira. Para isso, deve-se utilizar como base o documento de especificação do projeto.

Caso haja necessidade, é importante complementar a tarefa com informações técnicas adicionais relacionadas à análise de sistemas que não estejam descritas no documento de especificação.

A tarefa deve incluir todas as informações necessárias para que o desenvolvedor compreenda e execute a atividade de forma eficaz, como uma descrição clara da atividade, critérios de aceitação, dependências e pré-requisitos, além de uma estimativa de tempo para conclusão.

Após a criação do backlog de tarefas, é importante verificar a capacidade de alocação dos recursos disponíveis. Esses recursos podem ser da equipe de desenvolvimento da Senior ou de consultorias externas. Neste estágio, é fundamental entrar em contato com o gerente de projetos para organizar os trâmites necessários para a alocação e alinhamento de prazo em relação ao cronograma do projeto.

Entradas
* Documento de especificação assinado eletronicamente pelo cliente.

Saídas
* Projeto, Épicos e Tarefas criadas na ferramenta Jira.

Responsável

Software Developer

2.2.1.36 ☐Desenvolver

Descrição
Desenvolver as atividades planejadas para a sprint, incluindo a incorporação de feedbacks de tarefas validados pelo analista de qualidade, conforme as diretrizes da IT226 – Uso da ferramenta Jira.

Serão realizadas reuniões diárias para monitorar o progresso das atividades e discutir eventuais impedimentos. Para atividades executadas por consultorias externas, a frequência dessas reuniões poderá variar conforme a necessidade.

Além disso, deve-se elaborar o Documento de Configuração da Customização (DCC) referente a funcionalidade desenvolvida.

Entradas
* Tarefas da Sprint no Jira com Análise Técnica Concluída.

Saídas
* Desenvolvimento concluído, com tarefas finalizadas e documentadas no Jira.

* Documento de Configuração da Customização.

Responsável

Software Developer

2.2.1.37 ☐Homologar Funcionalidade

Descrição
Elaborar os Cenários de Testes (CTS) e executar os testes de sistema correspondentes. Os resultados obtidos (OK e Não OK) devem ser registrados nas tarefas da ferramenta Jira.

Entradas
* Desenvolvimento concluído, com tarefas finalizadas e documentadas no Jira.

* Ambiente de teste configurado com desenvolvimento aplicado, onde os testes serão realizados.

Saídas

* Cenários de Testes (CTS): Documento detalhando os testes a serem realizados.

* Resultados dos Testes: Registro dos resultados obtidos, categorizados como OK ou Não OK.

* Tarefa de ajuste aberta (se necessário).

Responsável

Software Quality Analyst

2.2.1.38 ☐Conduzir Homologação com Cliente

Descrição

Conduzir a homologação da solução com o usuário-chave do cliente, fornecendo orientações claras sobre o preenchimento dos Cenários de Teste (CTS).

Entradas

* Ambiente de teste configurado com desenvolvimento aplicado, onde os testes serão realizados.

* Documentação da funcionalidade desenvolvida.

* Cenários de teste detalhados.

Saídas

* Usuário-chave do cliente orientado sobre o processo de homologação.

Responsável

Software Quality Analyst

2.2.1.39 ☐Avaliar e Direcionar Retorno do Cliente

Descrição

Avaliar os resultados dos testes fornecidos pelo cliente por meio da CTS e fornecer o direcionamento adequado conforme as classificações.

a) OK: Comunicar ao analista de negócios e fornecer os artefatos de desenvolvimento para revisão e arquivamento.

b) Não OK: Realizar uma avaliação detalhada e revalidar o processo. Se o consultor confirmar que há um erro que não contraria o escopo contratado, o item deve ser reencaminhado para revisão pelo analista de qualidade, que por sua vez irá proceder com abertura de tarefa para ajuste. Caso sejam apenas esclarecimentos, o consultor tratará diretamente com o cliente.

c) Melhoria: Informar o cliente sobre o escopo adicional e questionar sobre a abertura de uma solicitação de mudança para dar prosseguimento aos trâmites. Caso o cliente confirme o desejo de prosseguir com a solicitação de mudança, o Gerente de Projetos deve ser notificado para registrar a solicitação na ferramenta ServiceNow.

Entradas
* Resultados dos testes pelo cliente categorizados como OK, Não OK ou Melhoria.

Saídas
a) Cenários de Teste aprovados via SIGN.

b) E-mail com objeções, se houver, encaminhado ao consultor.

c) Registro de Solicitação de Mudança na ferramenta Service Now.

Responsável

Consultor Desenvolvedor

2.2.1.40 ☐Conferir e Catalogar Artefatos

Descrição
Conferir os artefatos disponibilizados para confirmar se todos foram disponibilizados ou se falta algum.

Avaliar se a solução é passível de reaproveitamento e, caso positivo, realizar o cadastro na biblioteca de customizações através do endereço: [TAB] BIBLIOTECA DE CUSTOMIZAÇÃO

Os artefatos a serem disponibilizados são os seguintes: Especificação, CTS, DCC e Artefatos de desenvolvimento.

Entradas
* Especificação, CTS, DCC e Artefatos de desenvolvimento.

Saídas
* Verificação dos artefatos e cadastro da solução na biblioteca de customizações, se aplicável.

Responsável

Software Developer

2.2.1.41 ☐ Avaliar e Direcionar Retorno do Cliente

Descrição
Avaliar os resultados dos testes fornecidos pelo cliente por meio da CTS e fornecer o direcionamento adequado conforme as classificações.

a) OK: Comunicar ao analista de negócios e fornecer os artefatos de desenvolvimento para revisão e arquivamento.

b) Não OK: Realizar uma avaliação detalhada e revalidar o processo. Se o consultor confirmar que há um erro que não contraria o escopo contratado, o item deve ser reencaminhado para revisão pelo analista de qualidade, que por sua vez irá proceder com abertura de tarefa para ajuste. Caso sejam apenas esclarecimentos, o consultor tratará diretamente com o cliente.

c) Melhoria: Informar o cliente sobre o escopo adicional e questionar sobre a abertura de uma solicitação de mudança para dar prosseguimento aos trâmites. Caso o cliente confirme o desejo de prosseguir com a solicitação de mudança, o Gerente de Projetos deve ser notificado para registrar a solicitação na ferramenta ServiceNow.

Entradas

* Resultados dos testes pelo cliente categorizados como OK, Não OK ou Melhoria.

Saídas
a) Cenários de Teste aprovados via SIGN.

b) E-mail com objeções, se houver, encaminhado ao consultor.

c) Registro de Solicitação de Mudança na ferramenta Service Now.

Responsável

Software Quality Analyst

2.2.1.42 ☐Alocar Consultor Dev.

Descrição
Para realizar alocação do Consultor de Desenvolvimento, é imprescindível seguir as diretrizes estabelecidas na Instrução de Trabalho - IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

Entradas
Planejar Elaboração da Especificação

Saídas

Agenda solicitada na ferramenta FAST

Plano de recurso/ação aprovado no ServiceNow

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

2.2.1.43 ☐Desenvolver

Descrição
As atividades planejadas para a sprint serão desenvolvidas, incluindo a incorporação dos feedbacks validados pelo analista de qualidade, conforme as diretrizes da IT226 – Uso da ferramenta Jira.

Reuniões diárias serão realizadas para monitorar o progresso das atividades e tratar eventuais impedimentos. No caso de atividades executadas por consultorias externas, a frequência dessas reuniões poderá ser ajustada conforme a necessidade.

Importante: O consultor externo deve atualizar as informações no Card do Fast Project, enquanto a equipe interna é responsável por atualizá-las no Jira.

Entradas
* Tarefas da Sprint no Jira com Análise Técnica Concluída.

Saídas
* Desenvolvimento concluído, com tarefas finalizadas e documentadas no Card do Fast Projct e no Jira.

Responsável

Consultor ou Equipe de Desenvolvedor

2.2.1.44 ☐Homologar Funcionalidade

Descrição
Elaborar os Cenários de Testes (CTS) e executar os testes de sistema correspondentes. Os resultados obtidos (OK e Não OK) devem ser registrados nas tarefas da ferramenta Jira.

Entradas
* Desenvolvimento concluído, com tarefas finalizadas e documentadas no Jira.

* Ambiente de teste configurado com desenvolvimento aplicado, onde os testes serão realizados.

Saídas
* Cenários de Testes (CTS): Documento detalhando os testes a serem realizados.

* Resultados dos Testes: Registro dos resultados obtidos, categorizados como OK ou Não OK.

* Tarefa de ajuste aberta (se necessário).

Responsável

Consultor Desenvolvedor

2.2.1.45 ☐Conduzir Homologação com Cliente

Descrição

Conduzir a homologação da solução com o usuário-chave do cliente, fornecendo orientações claras sobre o preenchimento dos Cenários de Teste (CTS).

Entradas

* Ambiente de teste configurado com desenvolvimento aplicado, onde os testes serão realizados.

* Documentação da funcionalidade desenvolvida.

* Cenários de teste detalhados.

Saídas

* Usuário-chave do cliente orientado sobre o processo de homologação.

Responsável

Consultor Desenvolvedor

2.2.1.46 ☐Alocar Analista Negócios

Descrição

Alocar o analista de negócios no cronograma do projeto para a elaboração do documento de especificação. Além disso, deve-se levantar com o analista da equipe de desenvolvimento as horas previstas para essa atividade.

Entradas

* Informações da Demanda.

* Definição do analista de negócios requerido para a atividade.

Saídas

* Cronograma atualizado que inclua a alocação do analista.

Responsável

Gerente de Projetos

3 PO250 - SUBPROCESSO DE DESENVOLVIMENTO EM PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO

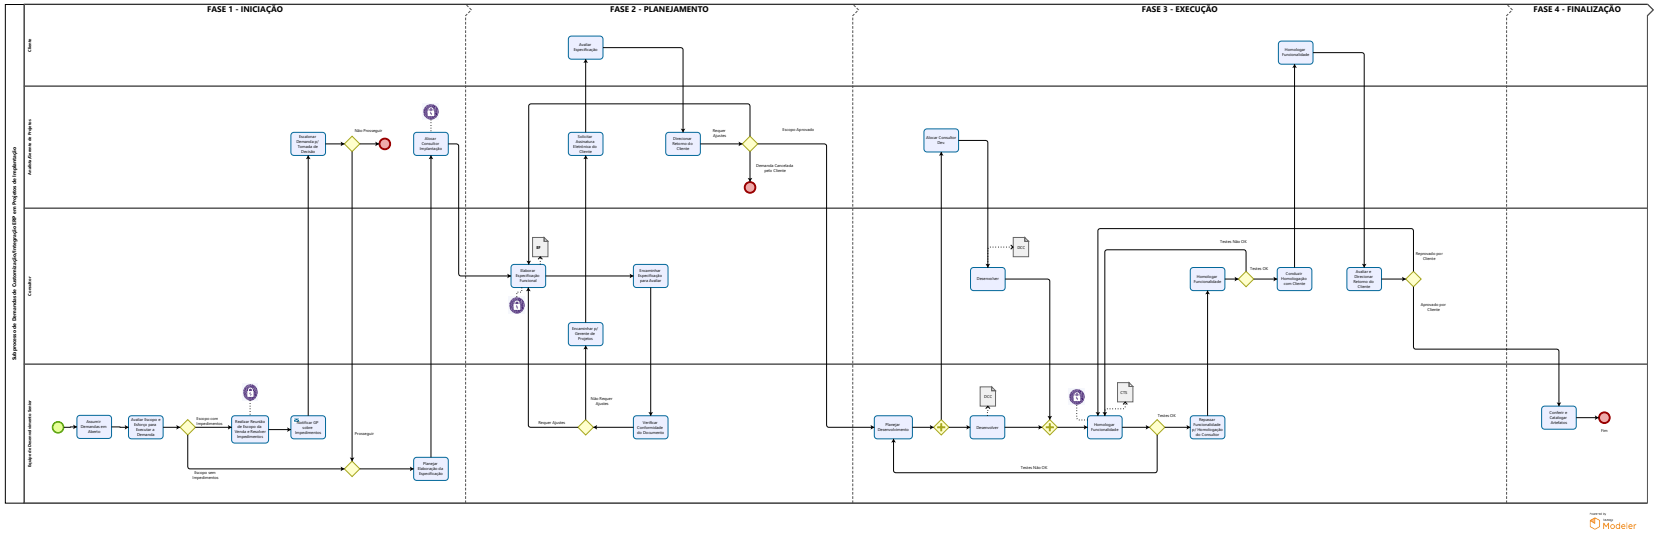

Descrição
Novo Cliente

Versão:

1.0

Autor:

Pmo

3.1 SUBPROCESSO DE DEMANDAS DE CUSTOMIZAÇÃO/INTEGRAÇÃO ERP EM PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO

3.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

3.1.1.1 Assumir Demandas em Aberto

Descrição

1. Verificar as demandas em aberto referentes à sua região de atendimento, para garantir que todas as informações necessárias estejam disponíveis.

2. Assumir a demanda, que deve ser aprovada com uma data para o início da atuação. Após a aprovação, uma tarefa no Jira será gerada automaticamente.

3. Incluir um comentário na demanda para notificar o gerente de projetos por e-mail sobre quem assumiu a tarefa e o prazo de início.

4. Caso a documentação esteja ausente ou incompleta, notificar o gerente de projetos para que ele tome as providências necessárias. Nesses casos, a demanda não deverá ser aprovada e ficará aguardando retorno.

5. Se não houver retorno com as informações ausentes e nenhum posicionamento em 7 dias, inserir uma nova mensagem notificando o gerente de projetos que a demanda será mantida em aberto por mais 7 dias. Se não houver retorno ou posicionamento com previsão de retorno, a demanda deverá ser cancelada, sendo necessário abrir uma nova demanda futuramente.

Entradas
* Demanda registrada no portal contendo:

a. Documentação do projeto: DEAP e outros documentos relevantes.

b. Informações sobre as necessidades e expectativas do cliente.

c. Dados sobre o prazo e horas disponíveis para execução.

Saídas
* Notificação ao gerente de projetos sobre a situação da documentação, aprovação da demanda com data de início definida e comentário na demanda informando o responsável e o prazo.

* Tarefa no JIRA referente a demanda.

Responsável

Business Analyst

3.1.1.2 Avaliar Escopo e Esforço para Executar a Demanda

Descrição
Avaliar criteriosamente o escopo do projeto dentro do prazo estipulado ao assumir a demanda, a fim de contextualizar a necessidade e providenciar o seguimento adequado para o atendimento. Caso surjam impedimentos referentes ao escopo ou à estimativa de esforço, estas podem ser discutidas com o ETN responsável pela elaboração do escopo de venda, conforme indicado no documento de escopo (DEAP).

Entradas
Tarefa no JIRA referente a demanda.

Saídas
Contextualização sobre o escopo do projeto.

Lista de questões a serem discutidas com o ETN, em caso de impedimentos.

Diretrizes para o seguimento do atendimento.

Responsável

Business Analyst

3.1.1.3 Realizar Reunião de Escopo da Venda e Resolver Impedimentos

Descrição

Contatar o ETN responsável pela elaboração do escopo de venda para discutir juntos questões relacionadas ao escopo e ao esforço necessário. O objetivo é resolver os impedimentos que estão dificultando a execução da demanda.

Entradas

* Informações sobre o escopo atual.

* Detalhes sobre os impedimentos identificados.

Saídas

* Soluções propostas para os impedimentos.

* Diretrizes para o seguimento do atendimento.

Responsável

Business Analyst

3.1.1.4 Notificar GP sobre Impedimentos

Implementação

Serviço Web

Descrição

Caso não haja consenso entre os analistas da equipe de desenvolvimento e o ETN sobre os impedimentos identificados, seja em relação ao escopo ou à estimativa de esforço, o gerente de projetos deverá ser notificado. Ele será responsável por escalar a questão para avaliação e tomada de decisão pela coordenação.

Entradas

* Lista de impedimentos identificados pelos analistas.

* Feedback da equipe de desenvolvimento e do ETN.

* Documentação sobre o escopo e estimativas de esforço.

Ferramentas

* Notificação formal por e-mail ao gerente de projetos.

3.1.1.5 Escalonar Demanda p/ Tomada de Decisão

Descrição

Levar as informações e opiniões coletadas da equipe de desenvolvimento e do ETN para um nível superior de decisão, ou seja, apresentar esses dados ao coordenador de desenvolvimento. O objetivo é garantir que os impedimentos identificados sejam avaliados adequadamente, permitindo que a coordenação tome decisões informadas sobre como prosseguir com a demanda.

Entradas

* Feedback da equipe de desenvolvimento e do ETN.

Saídas
* Decisão da coordenação sobre o seguimento da demanda.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

3.1.1.6 Planejar Elaboração da Especificação

Descrição
Com o escopo de venda claramente definido e sem impedimentos, deve-se planejar a elaboração do documento de especificação de desenvolvimento. Neste estágio, é necessário contatar o gerente de projetos para identificar os recursos requeridos e iniciar os trâmites para alocação.

Para projetos de implantação, a elaboração da especificação deve ser obrigatoriamente realizada pelo consultor do projeto da área de negócio relacionada ao desenvolvimento.

O gerente de projetos poderá agendar uma reunião, se necessário, entre o consultor e o analista da equipe de desenvolvimento, para discutir detalhes sobre o escopo e alinhar expectativas.

Entradas
* Informações sobre a demanda sem impedimentos.

* Identificação dos consultores requeridos para a atividade.

Saídas
* Alinhamento de expectativas entre consultor e equipe de desenvolvimento.

* Prazos para a elaboração do documento de especificação.

Responsável

Business Analyst

3.1.1.7 ☐Alocar Consultor Implantação

Descrição

Para realizar essa alocação do Consultor de Implantação, é imprescindível seguir as diretrizes estabelecidas na Instrução de Trabalho - IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

Além disso, deve-se levantar com o analista da equipe de desenvolvimento as horas previstas para essa atividade. A aprovação dos apontamentos será realizada mediante a concordância do analista da equipe de desenvolvimento.

Entradas

* Informações da Demanda.

* Identificação dos consultores requeridos para a atividade.

Saídas

Agenda solicitada na ferramenta FAST

Plano de recurso/ação aprovado no ServiceNow

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

3.1.1.8 ☐Elaborar Especificação Funcional

Descrição

Elaborar o documento de especificação funcional seguindo o template disponibilizado. Este documento deve descrever detalhadamente o cenário atual do processo, o problema a ser resolvido, os objetivos do cliente e as funcionalidades do processo proposto para

desenvolvimento. Além disso, é fundamental que sejam apresentados os requisitos funcionais de forma clara, garantindo a compreensão dos objetivos do desenvolvimento e dos resultados esperados.

A solução proposta deve estar embasada no documento de escopo comercial (DEAP), respeitando as premissas estabelecidas e funcionalidades adicionais que não estejam previstas no escopo.

Se necessário, deve-se entrar em contato com o cliente para esclarecer dúvidas e solicitar informações complementares que ajudem a enriquecer o detalhamento do documento.

Entradas

* Informações sobre a demanda sem impedimentos.

* Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP).

* Atividade liberada no projeto para o Consultor de Implantação.

Saídas

* Documento de Especificação Funcional (EF).

Responsável

Consultor de Implantação

3.1.1.9 Encaminhar Especificação para Avaliar

Descrição

Antes de enviar ao cliente, encaminhar por e-mail o documento de especificação para que o analista de negócios da equipe de desenvolvimento o avalie. Aguardar o feedback para prosseguir.

Entradas
* Documento de especificação a ser revisado.

Saídas
* Envio de e-mail ao analista da equipe de desenvolvimento.

Responsável

Consultor de Implantação

3.1.1.10 Verificar Conformidade do Documento

Descrição
Avaliar se o documento está conforme o formato esperado e se contém todas as informações necessárias para viabilizar o desenvolvimento, incluindo a identificação de possíveis impedimentos técnicos. Além disso, verificar a possibilidade de reaproveitamento consultando a biblioteca de personalizações.

Entradas
* Documento de especificação a ser revisado.

Saídas
* Feedback e sugestões do analista sobre o documento de especificação.

* Identificação de impedimentos técnicos, se houver.

* Sugestões de reaproveitamento de personalizações.

Responsável

Business Analyst

3.1.1.11 ☐Encaminhar p/ Gerente de Projetos

Descrição
Após receber o feedback do analista de negócios, se não houver necessidade de ajustes, encaminhar o documento de especificação ao Analista ou Gerente de Projetos para que ele possa iniciar os trâmites necessários para a coleta da assinatura eletrônica do cliente.

Entradas
* Feedback do analista de negócios.

* Documento de especificação revisado.

Saídas
* Documento de especificação encaminhado ao gerente de projetos.

Responsável

Consultor de Implantação

3.1.1.12 ☐Solicitar Assinatura Eletrônica do Cliente

Descrição
Submeter o documento de especificação funcional para a assinatura eletrônica dos responsáveis do cliente por meio da ferramenta SIGN. Se necessário, agendar uma reunião com o cliente e o consultor para alinhamento e validação prévia.

Entradas
* Documento de especificação revisado.

* Lista de responsáveis do cliente.

Saídas
* Documento de especificação funcional submetido para assinatura eletrônica.

* Registro da reunião, se realizada, com feedback e validações do cliente.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

3.1.1.13 ☐Avaliar Especificação

Descrição
O cliente deve ler atentamente o conteúdo da especificação enviada e, caso concorde, registrar o aceite formal por meio da assinatura do documento na ferramenta SIGN.

Se houver objeções, o cliente deve retornar por e-mail ao gerente de projetos, detalhando os pontos identificados. Esses pontos serão encaminhados para avaliação do consultor.

Entradas
* Documento de especificação enviado ao cliente.

Saídas
* Registro do aceite formal do cliente.

* E-mail com objeções, se houver, enviado ao gerente de projetos.

Responsável

Cliente

3.1.1.14 ☐Direcionar Retorno do Cliente

Descrição

O Analista ou Gerente de projetos avalia o retorno do cliente e direciona as tratativas conforme a seguinte classificação:

a) Escopo Aprovado: Comunica ao analista de negócios para que este dê seguimento ao planejamento junto à equipe.

b) Requer Ajustes: Encaminha ao consultor para realizar a avaliação e os ajustes necessários. O consultor deve atualizar os requisitos reportados que não contrariam o escopo contratado e reencaminhar a especificação para revisão do analista sênior. Se forem apenas esclarecimentos, sem necessidade de alteração do documento, o consultor tratará diretamente com o cliente.

c) Mudança de Escopo: Informa o cliente sobre o escopo adicional e questiona sobre a abertura de uma solicitação de mudança para dar prosseguimento aos trâmites.

Entradas

* Retorno do cliente sobre documento de especificação.

Saídas

a) Especificação aprovada via SIGN.

b) E-mail com objeções, se houver, encaminhado ao consultor.

c) Registro de Solicitação de Mudança na ferramenta Service Now.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

3.1.1.15 Planejar Desenvolvimento

Descrição

Planejar tecnicamente as atividades de desenvolvimento, gerando as tarefas na ferramenta Jira de acordo com as diretrizes do documento IT226 - Uso da ferramenta Jira. Para isso, deve-se utilizar como base o documento de especificação do projeto.

Caso haja necessidade, é importante complementar a tarefa com informações técnicas adicionais relacionadas à análise de sistemas que não estejam descritas no documento de especificação.

A tarefa deve incluir todas as informações necessárias para que o desenvolvedor compreenda e execute a atividade de forma eficaz, como uma descrição clara da atividade, critérios de aceitação, dependências e pré-requisitos, além de uma estimativa de tempo para conclusão.

Após a criação do backlog de tarefas, é importante verificar a capacidade de alocação dos recursos disponíveis. Esses recursos podem ser da equipe de desenvolvimento da Senior ou de consultorias externas. Neste estágio, é fundamental entrar em contato com o gerente de projetos para organizar os trâmites necessários para a alocação e alinhamento de prazo em relação ao cronograma do projeto.

Entradas

* Documento de especificação assinado eletronicamente pelo cliente.

Saídas

* Projeto, Épicos e Tarefas criadas na ferramenta Jira.

Responsável

Software Developer

3.1.1.16 ☐Alocar Consultor Dev.

Descrição
Para realizar alocação do Consultor de Desenvolvimento, é imprescindível seguir as diretrizes estabelecidas na Instrução de Trabalho - IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

Entradas
Planejar Elaboração da Especificação

Saídas
Agenda solicitada na ferramenta FAST

Plano de recurso/ação aprovado no ServiceNow

3.1.1.17 ☐Desenvolver

Descrição
Desenvolver as atividades planejadas para a sprint, incluindo a incorporação de feedbacks de tarefas validados pelo analista de qualidade, conforme as diretrizes da IT226 – Uso da ferramenta Jira.

Serão realizadas reuniões diárias para monitorar o progresso das atividades e discutir eventuais impedimentos. Para atividades executadas por consultorias externas, a frequência dessas reuniões poderá variar conforme a necessidade.

Entradas
* Tarefas da Sprint no Jira com Análise Técnica Concluída.

Saídas
* Desenvolvimento concluído, com tarefas finalizadas e documentadas no Jira.

Responsável

Software Developer e/ou Consultor Desenvolvedor

3.1.1.18 ☐Homologar Funcionalidade

Descrição
Elaborar os Cenários de Testes (CTS) e executar os testes de sistema correspondentes. Os resultados obtidos (OK e Não OK) devem ser registrados nas tarefas da ferramenta Jira.

Entradas
* Desenvolvimento concluído, com tarefas finalizadas e documentadas no Jira.

* Ambiente de teste configurado com desenvolvimento aplicado, onde os testes serão realizados.

Saídas
* Cenários de Testes (CTS): Documento detalhando os testes a serem realizados.

* Resultados dos Testes: Registro dos resultados obtidos, categorizados como OK ou Não OK.

* Tarefa de ajuste aberta (se necessário).

Responsável

Software Quality Analyst

3.1.1.19 ☐Repassar Funcionalidade p/ Homologação do Consultor

Descrição
Após a homologação interna, e na ausência de ajustes necessários, a funcionalidade desenvolvida deverá ser repassada ao consultor do projeto da área de negócio correspondente. Juntamente com isso, devem ser fornecidos os cenários de teste a serem realizados, para que o consultor possa proceder com a homologação.

Entradas
* Ambiente de teste configurado com desenvolvimento aplicado, onde os testes serão realizados.

* Documentação da funcionalidade desenvolvida.

* Cenários de teste detalhados.

Saídas
* Funcionalidade repassada ao consultor.

Responsável

Software Quality Analyst

3.1.1.20 ☐Homologar Funcionalidade

Descrição
Realizar a homologação da funcionalidade desenvolvida, avaliando o processo do cliente no sistema como um todo, para garantir que todas as necessidades do cliente sejam plenamente atendidas.

Caso sejam identificadas necessidades de ajuste, o consultor deverá reportar ao QA para avaliação. Se confirmado que se trata de um erro, o QA abrirá uma tarefa para o ajuste necessário. Na ausência de ajustes, o consultor poderá dar seguimento ao processo e disponibilizar a funcionalidade ao cliente.

Entradas
* Ambiente de teste configurado com desenvolvimento aplicado, onde os testes serão realizados.

* Documentação da funcionalidade desenvolvida.

* Cenários de teste detalhados.

Saídas
* Resultados dos Testes: Registro dos resultados obtidos, categorizados como OK ou Não OK.

* Necessidade de ajuste reportada ao QA (se necessário).

Responsável

Consultor de Implantação

3.1.1.21 ☐Conduzir Homologação com Cliente

Descrição
Conduzir a homologação da solução com o usuário-chave do cliente, fornecendo orientações claras sobre o preenchimento dos Cenários de Teste (CTS).

Entradas
* Ambiente de teste configurado com desenvolvimento aplicado, onde os testes serão realizados.

* Documentação da funcionalidade desenvolvida.

* Cenários de teste detalhados.

Saídas
* Usuário-chave do cliente orientado sobre o processo de homologação.

Responsável

Consultor de Implantação

3.1.1.22 ☐Homologar Funcionalidade

Descrição

O Usuário-Chave do cliente deverá realizar a homologação da solução, orientado pelos Cenários de Teste (CTS) previamente disponibilizados. Durante os testes, o cliente deverá preencher a CTS, indicando os resultados obtidos na homologação, categorizando-os como OK, Não OK ou Melhoria.

Caso sejam identificados itens que necessitem de ajustes (classificados como Não OK ou Melhoria), esses devem ser encaminhados ao consultor de implantação e sinalizados ao gerente de projetos. É fundamental que o cliente valide todos os cenários previstos para que a homologação seja considerada finalizada. O aceite do cliente poderá ser realizado de forma eletrônica.

Entradas

* Ambiente de teste configurado com desenvolvimento aplicado, onde os testes serão realizados.

* Documentação da funcionalidade desenvolvida.

* Cenários de teste detalhados.

* Usuário-chave do cliente orientado sobre o processo de homologação.

Saídas

* Resultados dos Testes: Registro dos resultados obtidos, categorizados como OK, Não OK ou Melhoria.

Responsável

Cliente

3.1.1.23 ☐Avaliar e Direcionar Retorno do Cliente

Descrição

Avaliar os resultados dos testes fornecidos pelo cliente por meio da CTS e fornecer o direcionamento adequado conforme as classificações.

a) OK: Comunicar ao analista de negócios e fornecer os artefatos de desenvolvimento para revisão e arquivamento.

b) Não OK: Realizar uma avaliação detalhada e revalidar o processo. Se o consultor confirmar que há um erro que não contraria o escopo contratado, o item deve ser reencaminhado para revisão pelo analista de qualidade, que por sua vez irá proceder com abertura de tarefa para ajuste. Caso sejam apenas esclarecimentos, o consultor tratará diretamente com o cliente.

c) Melhoria: Informar o cliente sobre o escopo adicional e questionar sobre a abertura de uma solicitação de mudança para dar prosseguimento aos trâmites. Caso o cliente confirme o desejo de prosseguir com a solicitação de mudança, o Gerente de Projetos deve ser notificado para registrar a solicitação na ferramenta ServiceNow.

Entradas

* Resultados dos testes pelo cliente categorizados como OK, Não OK ou Melhoria.

Saídas

a) Cenários de Teste aprovados via SIGN.

b) E-mail com objeções, se houver, encaminhado ao consultor.

c) Registro de Solicitação de Mudança na ferramenta Service Now.

Responsável

Consultor de Implantação

3.1.1.24 ☐Conferir e Catalogar Artefatos

Descrição

Conferir os artefatos disponibilizados para confirmar se todos foram disponibilizados ou se falta algum.

Avaliar se a solução é passível de reaproveitamento e, caso positivo, realizar o cadastro na biblioteca de customizações através do endereço: HISTÓRICO REAPROVEITAMENTO - CUSTOMIZAÇÕES

Para adicionar novas listas de customizações, acessar o seguinte link: [TAB] BIBLIOTECA DE CUSTOMIZAÇÃO

Os artefatos a serem disponibilizados são os seguintes: Especificação, CTS, DCC e Artefatos de desenvolvimento.

Entradas

* Especificação, CTS, DCC e Artefatos de desenvolvimento.

Saídas

* Verificação dos artefatos e cadastro da solução na biblioteca de customizações, se aplicável.

Responsável

Software Developer

3.1.1.25 ☐Desenvolver

Descrição

Desenvolver as atividades planejadas para a sprint, incluindo a incorporação de feedbacks de tarefas validados pelo analista de qualidade, conforme as diretrizes da IT226 – Uso da ferramenta Jira.

Serão realizadas reuniões diárias para monitorar o progresso das atividades e discutir eventuais impedimentos. Para atividades executadas por consultorias externas, a frequência dessas reuniões poderá variar conforme a necessidade.

Além disso, deve-se elaborar o Documento de Configuração da Customização (DCC) referente a funcionalidade desenvolvida.

Entradas

* Tarefas da Sprint no Jira com Análise Técnica Concluída.

Saídas

* Desenvolvimento concluído, com tarefas finalizadas e documentadas no Jira.

* Documento de Configuração da Customização.

Responsável

Software Developer e/ou Consultor Desenvolvedor

4 PO250 - SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO PADRONIZADA

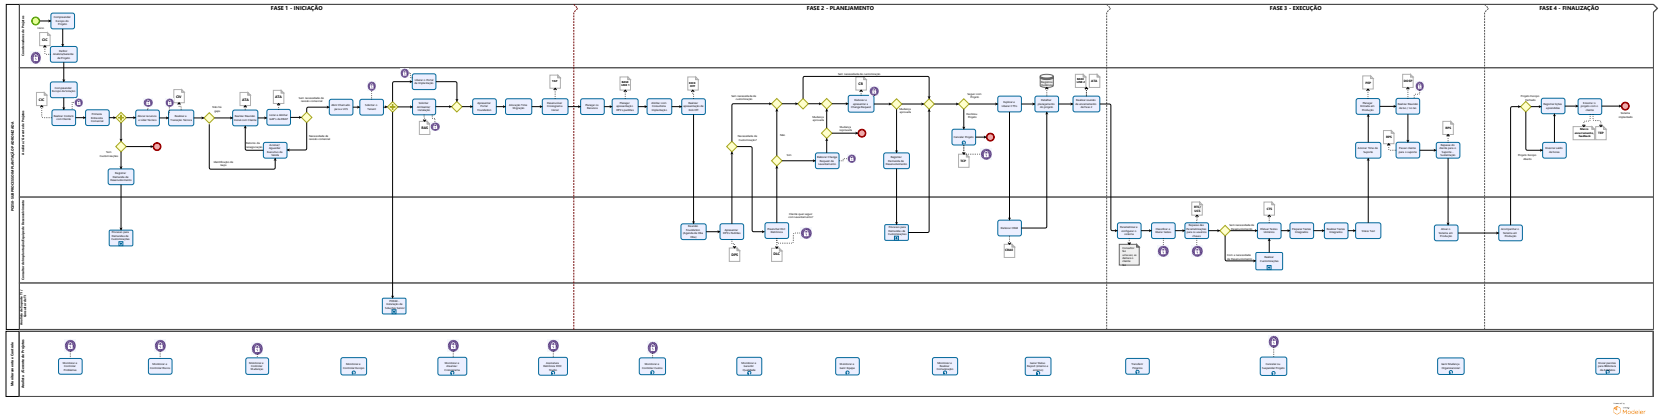

Versão:

1.0

Autor:

PMO

4.1 MONITORAMENTO E CONTROLE

4.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

4.1.1.1 Monitorar e Realizar Comunicação

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

É imprescindível que durante a execução do projeto haja comunicação entre todas as partes interessadas e pessoas envolvidas: cliente, analista/gerente de projetos, coordenador de serviços, consultoria de implantação, produto, suporte e terceiros.

Quando a comunicação é contínua e assertiva significa que existe alinhamento de expectativas e todos estão cientes de suas responsabilidades e sobre o andamento do projeto.

A comunicação facilita negociações, planos de ações e evita desalinhamentos.

Entradas

Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP (quando houver)

Saídas

Status Report

Atas de Reunião

4.1.1.2 Monitorar e Gerir Equipe

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Gerenciar a equipe do projeto abrange as seguintes atividades:

• Monitorar o desempenho dos membros da equipe.

• Fornecer feedback aos consultores utilizando o Fast Project (https://fastproject.senior.com.br).

• Manter uma comunicação contínua e assertiva.

• Negociar os interesses do projeto.

• Resolver problemas que surgirem.

• Coordenar mudanças que visem a melhoria do desempenho do projeto.

Caso haja alterações na equipe durante o andamento do projeto, é necessário registrar no **Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)**, se aplicável, e obter a validação do cliente.

Entradas
Equipe do projeto

Saídas
Equipe do projeto atualizada no Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP

Ata ou e-mail de feedback e reuniões de alinhamento

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.1.1.3 ☐Monitorar e Controlar Escopo

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Analisar a situação do escopo em relação ao previsto no planejamento do projeto, conforme Documento de Escopo Analítico do Projeto - DEAP e identificar os possíveis desvios.

Verificar continuamente a evolução do projeto e a realização das tarefas, tanto o tempo programado vs o executado, quanto a descrição das atividades.

As mudanças de escopo podem afetar as outras áreas do projeto como o tempo, custo, riscos e qualidade, que devem ser analisadas conjuntamente com a equipe do projeto, antes de serem validadas e colocadas em prática.

Se houver alteração de escopo durante o projeto, deve-se formalizar através da change request e gerar uma nova linha de base no cronograma, adicionando novas atividades e modificando os prazos das já existentes, se houver necessidade.

É fundamental acompanhar de perto as customizações em desenvolvimento para o projeto. Apesar de a equipe de Customizados ser responsável pela gestão e execução dessas atividades, cabe ao Analista ou Gerente de Projetos monitorar o progresso e

garantir a entrega, atuando em parceria com o time de Customizados.

Para realizar a Change Request, consulte a Instrução de Trabalho: IT264 - Change Request

Entradas
Documento de Escopo Analítico do Projeto -DEAP

Cronograma

Change Request e/ou Ata de Reunião

Saídas
Cronograma do projeto atualizado

Responsável

Analista / Gerente de Projetos

4.1.1.4 Monitorar e Garantir Qualidade

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Realizar a análise dos entregáveis do projeto, assegurando junto aos times de consultoria e do cliente a qualidade das atividades e das funcionalidades do produto.

Examinar as informações dos Cenários de Teste de Sistema (CTS) e suas evidências, identificando eventuais desvios ou problemas no produto por meio do **BI-CTS eletrônico**.

Envolver os times de Produto e Suporte para corrigir eventuais erros do produto, caso sejam detectados.

Entradas

Entregáveis do projeto

Cenários de Teste de Sistema - CTS

Saídas

Cenários de Teste de Sistema - CTS verificado

Envolvimento dos times de Produto e Suporte, caso sejam identificados erros e/ou problemas

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.1.1.5 Monitorar e Controlar Custos

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

As informações financeiras do projeto devem ser atualizadas periodicamente para garantir a precisão do Status Report e do cadastro financeiro. Esta atualização inclui a inserção de dados financeiros relevantes no sistema, revisão das despesas e receitas do projeto, e a geração de relatórios financeiros precisos. Para orientações sobre monitorar e controlar os custos, verificar nas instruções de trabalho abaixo:

- IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)
- IT179 - Cronograma ServiceNow (sharepoint.com)

Entradas

Cronograma do projeto

Saídas
Informações financeiras do projeto atualizadas para compor o Status Report e cadastro financeiro

4.1.1.6 ☐Gerar Status Report (interno e externo)

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição
Status externo (cliente)

Marcar uma reunião recorrente de apresentação de Status Report com o cliente e as partes interessadas, como parte do plano de comunicação. Preparar e usar o arquivo de apresentação de Status Report na pasta da Torre EAS EAS021 - Status Report Cliente.

No mínimo, um status report regular deve ser gerado no mês. Esse status deve ser direcionado para a equipe do projeto e deve conter as informações atuais sobre o escopo do projeto, prazos, desvios, problemas, riscos, mudanças, custos e evolução do projeto.

Pelo menos uma vez ao mês é obrigatória uma reunião de Status Executivo com o Patrocinador do projeto. É sugerido que nesta reunião seja feito um status diferenciado, com duração em torno de meia hora, focando no progresso do projeto e nas principais *issues* que necessitam da atenção, intervenção ou direcionamento do Patrocinador.

Os riscos devem ser cadastrados no ServiceNow, verificar IT de riscos: IT269 - Gerenciamento de Risco (sharepoint.com)

Os Problemas devem ser cadastrados no Snow, ver IT de Problemas.

Status Executivo interno

Os gerentes devem usar o modelo EAS021 - Status Report Interno usando o Excel Template Status Report Projeto para reportar o status do projeto internamente. O objetivo do reporte é apresentar as informações dos projetos às partes interessadas da Senior, possibilitando o acompanhamento das entregas, tomada de decisões e ações necessárias.

POWER POINT SR Executivo interno

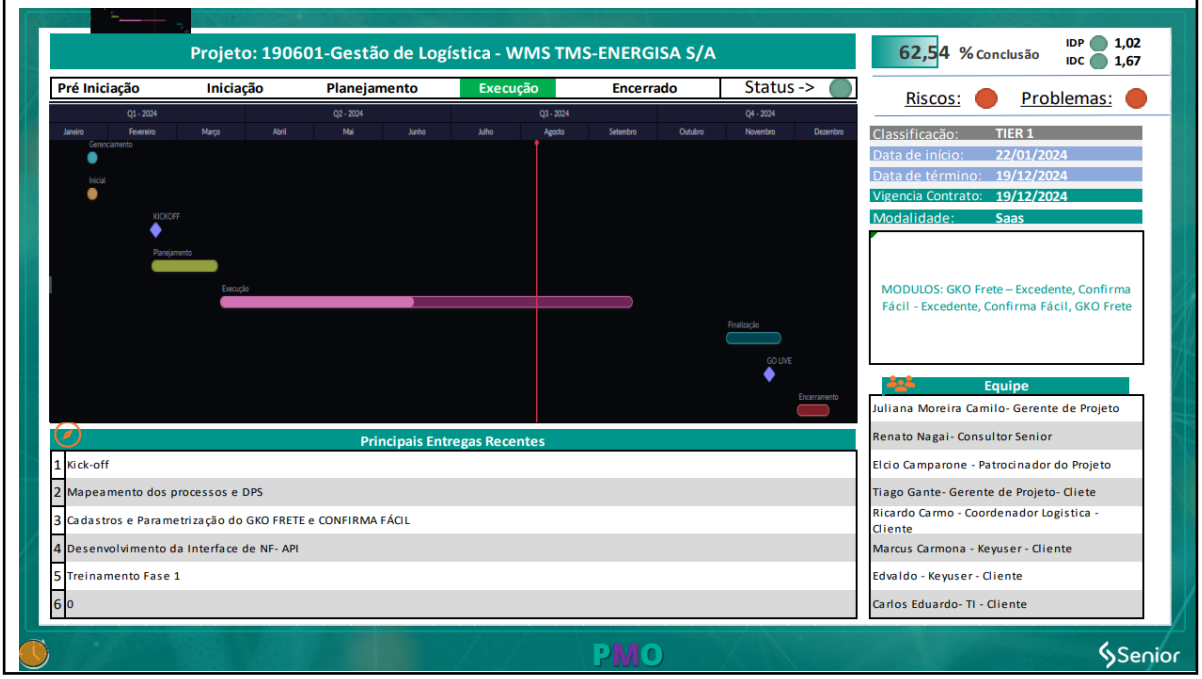

Entradas

-Cronograma atualizado

-Riscos no Snow

-Problemas no Snow

-Entregas do projeto

Saídas
-Status Report Interno ou Cliente

Responsável

Gerente Projeto

4.1.1.7 Transferir Projetos

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição
A transferência do projeto acontece para distribuição de demandas na equipe (capacidade), férias ou desligamento de profissionais.

É necessário registrar o momento em que o projeto é transferido entre Analistas/Gerentes de Projetos, evidenciando as entregas e responsabilidades de cada um.

É responsabilidade do Analista/Gerente de Projetos transferidor:

· Preencher o Documento de Transferência do Projeto - DTP, informando a fase, valores financeiros, entregas feitas, pendências e entregas não realizadas (de acordo com a fase), incluindo observações e histórico do projeto.

· Aprovar todas as horas pendentes do projeto na planilha de horas.

· Solicitar aprovações de horas não faturadas para a coordenação, copiando o Gerente de Projeto recebedor, quando necessário.

· Realizar reunião com o cliente o com o GP recebedor, para passagem de bastão das entregas e definição de agendas.

· Deixar o reporte semanal atualizado para o projeto.

É papel do Analista/Gerente de Projetos recebedor:

· Conferir os itens apontados no DTP, conversar com o Gerente de Projetos transferidor, tirar dúvidas e aprovar a transferência. Desta forma, registra que está de acordo com o que foi relatado, tem ciência das entregas do projeto e as pendências que serão assumidas.

· Continuar as ações previstas pela antiga gestão.

· Participar da reunião com o Gerente de Projeto transferidor e o cliente, se apresentando como o novo gerente de projetos.

Quando o profissional anterior não estiver mais na empresa, a transferência deverá ser efetuada e formalizada com o coordenador de projetos.

Entradas

Necessidade de substituição do Analista/Gerente de Projetos

Saídas

Documento de Transferência de Projetos - DTP

Documento de Transferência de Projetos - DTP - Férias

Responsável

Analista/Gerente de Projetos e Coordenador

4.1.1.8 Monitorar e Atualizar Cronograma

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Para controlar e monitorar um cronograma de forma eficaz, é essencial seguir uma série de passos estruturados que garantem o acompanhamento adequado das atividades planejadas e a identificação precoce de desvios. Aqui estão as principais ações que devem ser realizadas:

1. **Definição Clara do Cronograma**: Certifique-se de que o cronograma está bem definido, com atividades detalhadas, marcos, responsáveis, prazos e dependências claramente estabelecidos. A clareza desde o início é fundamental para um bom controle.

2. **Atualização Regular do Cronograma**: Realize atualizações periódicas para refletir o progresso real das atividades. Isso pode ser feito semanalmente ou de acordo com o ciclo de relatórios do projeto.

3. **Reuniões de Status**: Conduza reuniões regulares de status report com a equipe do projeto para discutir o progresso, identificar obstáculos e planejar ações corretivas.

4. **Gestão de Riscos e Mudanças**: Monitore os riscos e gerencie as solicitações de mudanças que possam impactar o cronograma. Avalie o impacto das mudanças antes de aprová-las, ajustando o cronograma conforme necessário.

5. **Revisão e Aprendizado Contínuo**: Periodicamente, reveja o cronograma e o processo de controle para identificar lições aprendidas e melhorias que podem ser aplicadas em projetos futuros.

6. **Baseline:** Toda alteração de escopo, custo ou prazo requer o replanejamento da data de Go Live no cronograma. Para isso, é necessário solicitar a aprovação do cliente no DOC Studio.

Para mais detalhes, consulte a Instrução de Trabalho: Instrução de Trabalho: IT179 - Cronograma ServiceNow (sharepoint.com)

Entradas

Documento de Escopo Analítico do Projeto - DEAP

Documento change Resquest ou Ata de Reunião-

Saídas

Cronograma do projeto atualizado

Responsável

Analista

4.1.1.9 ☐Gerir Mudança Organizacional

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

A Gestão de Mudança Organizacional - GMO é uma área de conhecimento do fator humano, que tem o foco na comunicação e mobilização das equipes, mapeamento de stakeholders, seus papeis e responsabilidades, identificar os antagonistas e os agentes de mudança, apoiar na gestão de conflitos, gerenciamento de expectativas, atuar na capacitação e treinamento das pessoas, acompanhar e reportar regularmente as mudanças do projeto ao comitê, com intuito de gerar as ações necessárias para o projeto de forma positiva.

Se para o projeto houver esta premissa de atuação do Gerente de Projetos, deve-se verificar o DA032 - Documento de Apoio para execução da Gestão da Mudança

Organizacional em projetos (sharepoint.com) , que possui as orientações para a condução de projetos aplicando o GMO.

Entradas
Projetos que tenham como premissa a Gestão de Mudança Organizacional

Saídas
Gestão da Mudança Organizacional aplicada no projeto

4.1.1.10 Assinatura Eletrônica DOC Studio

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição
Este processo permite que o responsável receba e assine documentos eletronicamente, com a opção de enviar uma cópia assinada. O documento é enviado por e-mail, podendo ser visualizado no GED/DOC Studio, disponível na Senior X Platform.

Funcionalidades do GED/DOC Studio:

· Carregar documentos no DOC Studio

· Configurar permissões para Consultores

· Enviar documentos para assinatura

· Receber e Assinar documentos Eletronicamente

Para mais detalhes, consulte a Instrução de Trabalho: IT270-Assinatura Eletrônica (sharepoint.com)

Entradas

Documentação do projeto pronta para carregar no Doc Studio;
Pasta no Doc Studio para compartilhar com consultor;

Documentos do projeto que necessitam de assinatura eletrônica carregados no Doc Studio;

Documentos do projeto para assinar e/ou assinados.

Saídas
Documentos salvos no Doc Studio;

Pasta no Doc Studio compartilhada;

Solicitação de assinatura eletrônica enviadas por e-mail;
Assinaturas dos documentos monitoradas.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.1.1.11 ☐Enviar pacotes para Biblioteca de Artefatos

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição
Para enviar pacotes de customizações ERP desenvolvidos para Biblioteca de Serviços:

Preencher o template > enviar para biblioteca.servicos@senior.com.br.

Para reutilizar os serviços:

1- Acessar a BIBLIOTECA DE CUSTOMIZAÇÃO e HISTÓRICO REAPROVEITAMENTO - CUSTOMIZAÇÕES localizar o pacote;

2- Caso não tenha os artefatos na biblioteca, você pode utilizar a estimativa cadastrada para o determinado pacote;

3- Se tiver os artefatos na biblioteca, baixar todos artefatos e entregar o recurso para (consultor ou desenvolvedor) que irá adaptar a solução;

4- Ao encerrar a adaptação da customização, coletar artefatos e estimativa utilizada, para análise e calibragem;

5 - Caso houver ajuste no pacote ou na estimativa, notificar o time de manutenção da biblioteca de serviços (biblioteca.servicos@senior.com.br).

Para localizar pacotes na biblioteca:

Você pode filtrar por palavras chaves na funcionalidade de "pesquisa" do SharePoint:

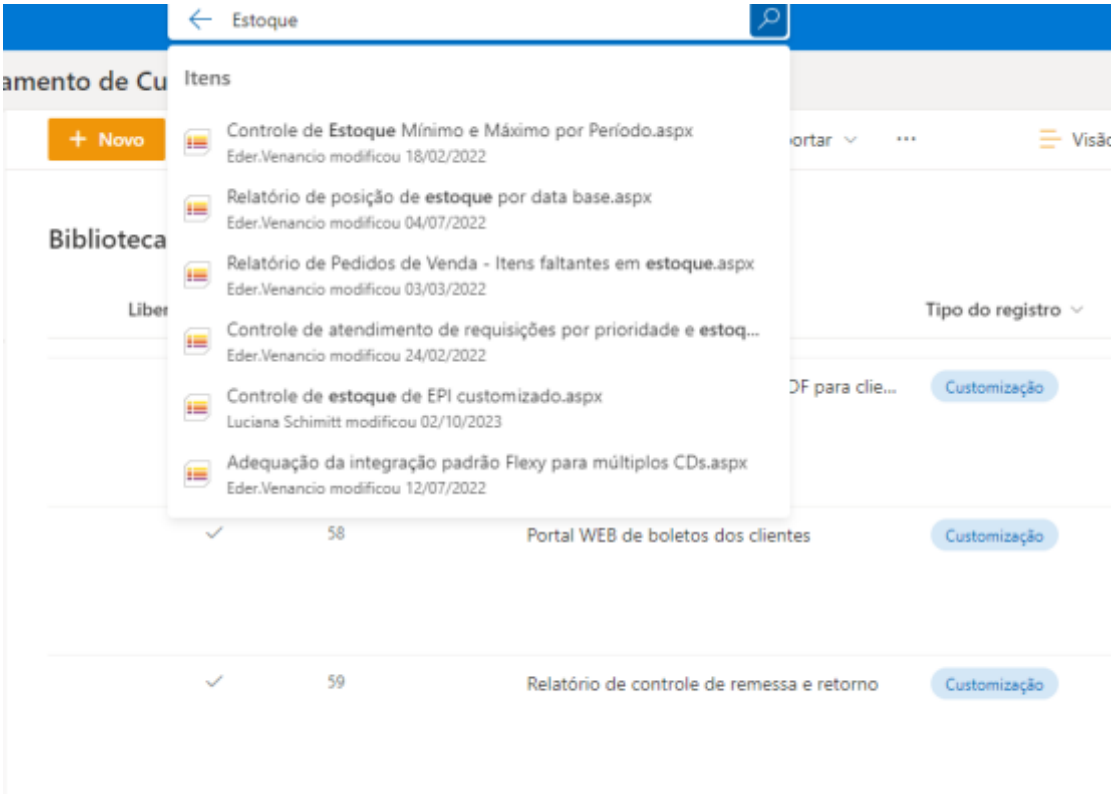

Entradas
Especificação Funcional

DPS's.

Saídas
Especificação Funcional na Biblioteca de artefatos

DPS's na Biblioteca de artefatos.

Responsável

Analista / Gerente de Projetos

4.1.1.12 ☐Monitorar e Controlar Mudanças

Descrição

Qualquer alteração de serviço que divergir do inicialmente acordado e contratado deve ser formalizada pelo Gerente de Projetos por meio da funcionalidade "Solicitar Mudança" no ServiceNow, disponível na lista relacionada ao Projeto. Após identificar a necessidade de mudança, o Gerente de Projetos, em conjunto com o cliente, avaliará e providenciará a execução da alteração durante o andamento do projeto. Existem três tipos de Change Request:

Alterações com Custo: Alterações com custo referem-se a quaisquer modificações no projeto que resultem em custos adicionais ao cliente, gerando uma nova fatura.

Alterações sem Custo: Alterações sem custo referem-se a modificações no projeto que não resultam em custos adicionais ao cliente. Estas mudanças são realizadas dentro do escopo e dos recursos já acordados na proposta inicial, sem a necessidade de gerar uma nova fatura.

Horas Não Faturadas / Transferência de Custo: Horas não faturadas ou transferência de custo referem-se a situações onde há um aumento no escopo do projeto sem que isso resulte em custos adicionais ao cliente, sem geração de nova fatura.

Abaixo seguem orientações explícitas que devem ser obrigatoriamente seguidas para a alteração da data de Go Live dos projetos da Torre ERP, considerando a gravidade e a importância desta definição:

1. Solicitação Inicial de Mudança de Data

- Quando o **Gerente de Projeto** identificar a necessidade de alteração da data de Go Live (seja por iniciativa própria ou por solicitação do cliente):
    - **É obrigatório** obter aprovação prévia do **Coordenador da Torre** antes de comunicar qualquer alteração ao cliente.
    - Apenas **após aprovação do Coordenador**, o Gerente de Projeto poderá:
        - Informar o cliente sobre a alteração;

        - Formalizar a nova data de Go Live.

2. A partir da Segunda Solicitação de Mudança de Go Live

- Quando já houver uma alteração de Go Live aprovada anteriormente, e surgir uma **nova necessidade de mudança**:
    - A solicitação deve ser **avaliada e aprovada** por:
        - **Coordenador da Torre**;
        - **Gerente da Torre**.
    - Ambos deverão discutir e avaliar **alternativas para evitar nova postergação**.
    - Apenas **com a aprovação conjunta**, o Gerente de Projeto poderá:
        - Comunicar o cliente;
        - Formalizar a nova data de Go Live.

3. Aprovação do Patrocinador do Projeto

- Em **todas as situações** de repactuação da data de Go Live:
    - O **Patrocinador do Projeto** deve ser:
        - **Comunicado previamente**;
        - Emitir uma **aprovação explícita** da nova data.
        - Formalizar através de ata.

Instrução de Trabalho: IT264 - Change Request (sharepoint.com)

Entradas
ATA de reunião;
Change Request aprovado pelo cliente via DOC Studio

Saídas
Change Request aprovado pelo cliente via DOC Studio.

Cronograma do projeto atualizado.

Responsável

Analista / Gerente de Projetos

4.1.1.13 ☐Monitorar e Controlar Riscos

Descrição

Ao longo do projeto, os riscos precisam ser monitorados e gerenciados continuamente. Quando um novo risco for identificado, deve-se avaliar tanto a probabilidade quanto a gravidade potencial, caso ele se concretize. Após essa avaliação, é essencial estabelecer uma estratégia para gerenciar o risco. O risco deve ser registrado no ServiceNow.

Para mais detalhes, consulte a Instrução de Trabalho: IT269 - Gerenciamento de Risco (sharepoint.com)

Entradas

Riscos identificados.

Saídas

Riscos cadastrado no ServiceNow;
RIscos encerrados.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.1.1.14 ☐Monitorar e Controlar Problemas

Descrição

De modo geral, um problema é um obstáculo que impede a concretização de um objetivo. Pode ser algo que gera dificuldade e representa uma situação que demanda uma solução. Problemas podem surgir ao longo de um projeto e, para serem devidamente resolvidos, precisam ser registrados, comunicados, monitorados e acompanhados. Para o registro de problemas, o Analista ou Gerente de Projetos deve utilizar o ServiceNow.

Para mais informações, consulte a Instrução de Trabalho: IT275 - Processo Gerenciamento do Problemas

Entradas

Problema identificado no projeto.

Saídas

Registro do problema no ServiceNow

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.1.1.15 ☐Cancelar ou Suspender Projeto

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Cancelamento de Projetos: Quando o cliente declina da implantação, o projeto deve ser cancelado na fase em que se encontra. Para proceder, registre a solicitação do cliente, informe o executivo responsável e, se o cancelamento não puder ser evitado, notifique o time de Customer Success. Assegure que todas as horas trabalhadas e entregas sejam registradas e faturadas corretamente. Arquive toda a documentação de cancelamento na pasta de monitoramento do projeto no Doc Studio e atualize a situação do projeto no ServiceNow conforme instrução de trabalho.

Suspensão de Projetos: Caso o cliente solicite a suspensão ou não retorne os contatos, suspenda o projeto. Preencha e obtenha a assinatura do Termo de Suspensão do Projeto (TSP). Atualize a situação no ServiceNow, informe a coordenação e gerencie a reativação com a mesma.

Importante: Para detalhes de como proceder no cancelamento ou suspensão, verifique a instrução de trabalho: IT280-Solicitar Cancelamento do Projeto (sharepoint.com)

Entradas

Solicitação do cliente para cancelar ou suspender o projeto

Saídas

Projeto cancelado ou suspenso no ServiceNow

Termo de Suspensão do Projeto - TSP ou e-mail de cancelamento aprovado via Doc Studio

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2 PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO PADRONIZADA

Orientações Gerais

Entradas

Saídas

Treinamentos disponibilizados na UCS

4.2.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

4.2.1.1 Repasse do cliente para o Suporte - Sustentação

Descrição

Quando um projeto inclui customizações e/ou integrações desenvolvidas, e o cliente possui o serviço **Suporte Premium Sustentação** contratado, é obrigatório realizar o preenchimento do documento de repasse para a Sustentação, chamado "Repasse do cliente para o Suporte - Sustentação" e o mesmo deve ser enviado a equipe responsável.

Procedimentos para repasse ao Suporte de Sustentação:

1. Preencher o formulário de informações

Utilize o formulário disponível no SharePoint dos Templates ;
Sharepoint > Entrega Acelerada Senior > Templates > Diretório de Templates da Torre

2. Enviar o formulário preenchido

Encaminhe o formulário ao coordenador e analista técnico responsável, conforme orientações disponíveis no Portal de Documentação, no link a seguir (opção "Lideranças Responsáveis por Produto > Suporte Premium"):
https://documentacao.senior.com.br/guia-do-suporte.htm

No e-mail, inclua a seguinte orientação:

- *Documento de "Repasse do cliente para o Suporte - Sustentação" totalmente preenchido.*

- *Solicitação de agenda para repasse técnico entre time do projeto e time de Sustentação.*

3. Arquivar o e-mail de repasse

Salve o e-mail enviado ao Suporte, com o formulário anexo, na pasta **"Repasse ao Suporte"** localizada no **DOC Studio**.

Observação: O repasse para o suporte de **Sustentação** aplica-se exclusivamente aos produtos **HCM**, **ERP** e **Acesso**.

Entradas
Documento de Oficialização de Sistema em Produção - DOSP aprovado via Doc Studio
Demais documentações técnicas do projeto.

Saídas
Documento de "Repasse do cliente para o Suporte - Sustentação".

Agendamento do repasse técnico para o time de Sustentação.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.2 ☐Compreender Escopo do Projeto

Descrição
Antes de designar um Analista ou Gerente de Projetos, o Coordenador deve compreender detalhadamente a solução vendida ao cliente. Isso inclui as premissas da implantação, as negociações realizadas, e a identificação das informações técnicas da venda e do cliente. É necessário verificar se há outros projetos em andamento nesse cliente, seja do mesmo

produto ou de produtos diferentes, e mapear essas informações para informar ao Analista ou Gerente de Projetos, garantindo os devidos cuidados de integração. Além disso, deve-se consultar o CS para verificar o histórico do cliente (passado, atual, e se é um caso de revitalização).

Os documentos comerciais que auxiliam nesse entendimento são:

· **Proposta Comercial/Edital**

· **Folha de Rosto - Pedido**

· **Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP)**: Realizar uma análise prévia do DEAP, comparando o escopo com as horas estimadas.

Entradas
Documentos comercias disponíveis no ServiceNow.

Saídas
Definição do Analista/Gerente de Projetos e alocação nas ferramentas.

Responsável

Coordenador de Projetos

4.2.1.3 ☐ Definir Analista/Gerente de Projeto

Descrição
O Coordenador irá designar um Analista ou Gerente de Projetos com base na análise de disponibilidade, conhecimento e experiência, utilizando os documentos comerciais e as informações disponíveis no ServiceNow.
Para clientes novos, o Coordenador deve realizar o primeiro contato, informando que estará acompanhando o projeto. Nesse contato, ele deve apresentar o Analista ou Gerente de Projetos, que será responsável pela condução e comunicação do projeto.

O repasse e alocação nas ferramentas devem ser realizadas conforme a Instrução de Trabalho: IT261 - Definição Gerente de Projeto (sharepoint.com)

Importante: o Coordenador deve repassar o projeto para o Analista ou Gerente de Projetos em até 3 dias úteis.

Entradas
Projeto cadastrado na ferramenta ServiceNow, Doc Studio e Fast Project.
Contato Inicial do Coordenador.

Saídas
Definição do Analista/Gerente de Projetos e alocação nas ferramentas.

Responsável

Coordenador de Projetos

4.2.1.4 ☐Compreender Escopo da Solução

Descrição
Após analise brevia do Coordenador, o Analista ou Gerente de Projetos tem como primeira etapa a preparação do projeto e envolve uma compreensão detalhada da solução vendida ao cliente. Isso inclui as premissas da implantação, as negociações realizadas, e a identificação das informações técnicas tanto da venda quanto do cliente.

Documentos Comerciais Auxiliares:

Para auxiliar nesse entendimento, os seguintes documentos são essenciais:

· **Proposta Comercial/Edital**

· **Folha de Rosto - Pedido**

· **Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP)**: Realizar uma análise prévia da DEAP, comparando o escopo com as horas estimadas.

Ação em Caso de Documentação Incompleta:

1 - Senior X > PMO de Serviços > Ellevo



2 - Selecionar Diretoria de Serviços > Governança e Performance > Solicitações > Projetos > 01.04 Realizar ajustes gerais dos projetos:

Entradas

Documentos comercias disponíveis no ServiceNow.

Saídas

Agendamento reunião de repasse com comercial

Responsável

Analista/Gerente de Projeto

4.2.1.5 ☐Realizar Contato com Cliente

Descrição

O primeiro contato com o cliente tem como objetivo informá-lo brevemente que a sua demanda foi recebida na área de Serviços, formalizando assim, a transição de pedido comercial para projeto. Este Contato deve ser realizado pelo ServiceNow, conforme instrução de trabalho: IT260 - Processo Contato Inicial (sharepoint.com)

Importante: Esta ação deve ser realizada em até 3 dias úteis a partir do recebimento do projeto.

Entradas

Projeto em nome do Analista/Gerente de Projetos e situação Ativo na ferramenta ServiceNow

Saídas

· Contato Inicial com Cliente

· CIC arquivado no Doc Studio/ServiceNow

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.6 ☐Primeira Entrevista Comercial

Descrição

De posse de todas as informações do projeto recebidas através das documentações no ServiceNow, o Analista ou Gerente do Projeto realiza uma reunião com o Executivo de Conta responsável pela venda para receber mais detalhes a respeito do negócio. O objetivo desta reunião é captar a maior riqueza de detalhes possível a respeito da negociação, e em geral deverá abordar temas como:

- Principais motivadores da contratação.

- Dificuldades da negociação.
- Principais stakeholders.
- Ambiente do cliente.
- Detalhes a respeito dos produtos negociados.
- Riscos percebidos até aqui.
- Cronograma de entrega.
- Modelo de implantação.
- Volume de horas negociado.
- Detalhes das customizações.
- Sistemas legados existentes.
- Infraestrutura disponível ou ambiente cloud.
- Detalhes da migração de dados.
    - Modalidade da implantação, se remota, presencial ou híbrida.

Após entender o contexto geral do projeto, o Gerente do Projeto deve registrar no CIV quais documentos foram utilizados para a passagem do negócio, usualmente a Proposta Comercial, Pedido do CRM, Escopo Sintético e Escopo Analítico. O Gerente do Projeto também deve questionar o Executivo da Venda se houve alterações de contrato, se existe uma RFP, se possui e-mails extras com combinados sobre customizações ou faturamentos, entre outros itens significativos que possam apoiar no entendimento da venda.

Os detalhes acima auxiliarão o Analista ou Gerente de Projetos no planejamento geral do projeto e no atendimento dos principais interesses do cliente.

Com base nessas informações o Analista ou Gerente de Projetos inicia o preenchimento do CIV, que será complementado quando realizada a reunião de Transição Técnica.

Após o término da entrevista, o Gerente do Projeto formaliza por e-mail a solicitação ao Executivo de Conta para que o mesmo aloque o Executivo Técnico de Negócio para Reunião de Transição Técnica **(esta solicitação deve ser realizada pelo via BPM com o nome de "Repasse Técnico").** Esta reunião deve ser marcada com a devida antecedência para que o Gerente do Projeto tenha tempo de alocar os Consultores de Implantação e o Líder Técnico. Também deve ser enfatizado neste e-mail que não é possível iniciar as ações do projeto junto ao cliente sem a devida transição técnica junto ao ETN.

Entradas
Compreender o escopo da solução
Realizar contato com cliente
Agendar entrevista com executivo da venda

Saídas
Iniciar o preenchimento do CIV

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.7 Alocar recursos e Líder Técnico

Descrição
O Analista ou Gerente de Projetos, ao receber o projeto, analisa o escopo para compreender todas as entregas previstas. Posteriormente, calcula o total de horas necessárias para cada Modulo a ser implantado, levando em conta os profissionais envolvidos, e elabora uma planilha consolidada. Após concluir a planilha, subtrai a reserva de contingência aplicável e detalha as horas de consultoria previstas para a execução dos Módulos.

Com as informações organizadas, o Analista ou Gerente de Projetos acessa o Fast Project e cadastra um CARD para cada módulo. Nesse processo, não é necessário desmembrar sub processo de cada módulo. Nos cards, deve constar que a consultoria contratada será responsável pela execução completa do projeto, com a indicação dos módulos vinculados.

Após o time de alocação de recursos definir os profissionais alocados, o Analista ou Gerente de Projetos entra em contato com a consultoria para designar o líder técnico responsável pelo projeto" para "Após o time de alocação de recursos definir os profissionais alocados, o Analista ou Gerente de Projetos entra em contato com o

Responsável pela Consultoria para confirmar os nomes e as responsabilidades de cada consultor.

Após a definição da equipe que fará a implantação, o Gerente do Projeto define em conjunto com o Coordenador da Torre se será necessária a alocação de um Líder Técnico para o projeto, visto que somente projetos estratégicos recebem este tipo de acompanhamento. Caso seja decidido que sim, o Gerente do Projeto envia um e-mail para *csierp@senior.com.br* solicitando a alocação de um Líder Técnico para o projeto.

Para realizar essa alocação, tanto para colaboradores CLT quanto para prestadores de serviços PJ, é imprescindível seguir as diretrizes estabelecidas na Instrução de Trabalho - IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

Entradas

CIC arquivado no Doc Studio/ServiceNow
Compreensão do escopo do projeto

Saídas

Alocação dos Recursos

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.8 Realizar a Transição Técnica

Descrição

Tendo definido quem fará o papel de Líder Técnico do Projeto, o Analista ou Gerente do Projetos providencia agora a Reunião de Transição Técnica do projeto.

Importante notar que a reunião de transição deve ser programada com antecedência e deve considerar o porte do projeto na estimativa de duração. É preciso considerar que ela deve ter duração suficiente para discussão de detalhes técnicos do negócio, que variam conforme o projeto. Para que a reunião de transição técnica tenha sucesso, é preciso envolver obrigatoriamente os seguintes papéis:

- Executivo da Conta
- Executivo Técnico de Negócios
- Líder Técnico

- Analista ou Gerente do Projeto
- Responsável pela Consultoria
- Consultores de Implantação
- Analista de Negócio e Analista de Sistemas (caso existam customizações comercializadas).

Conforme a necessidade, também poderão participar o coordenador de projetos da torre, o gestor de serviços da filial e o líder comercial. É recomendado ainda que a reunião seja presencial, de modo a tirar o maior proveito da troca de informações.

É recomendado ainda que a reunião seja gravada e acrescentada aos artefatos do projeto para consulta futura

A reunião deve iniciar considerando o histórico da negociação e as dificuldades encontradas. O Executivo de Conta deve passar aqui suas impressões sobre a cultura do cliente, principais partes interessadas e fatores de risco da negociação, de modo que os participantes técnicos possam considerar essas informações em seu planejamento.

O objetivo principal da transição técnica é discutir os produtos vendidos para o cliente, considerando agora o ponto de vista técnico da implementação dos mesmos. Em geral, os assuntos abordados nesta reunião passam por:

- Empresas e filiais do cliente
- Empresas e filiais onde ocorrerá a implantação
- Modelo de tributação do cliente
- Segmento de atuação do cliente
- Principais processos do cliente
- Diferenciais do cliente em seu segmento
- Produtos negociados e como serão usados
- Customizações negociadas
- Possíveis customizações e produtos não negociados

- Decisões sobre produtos ou customizações sabidamente não contratadas
- Riscos para processos e negócio
- Obtenção de dados para migração
- Identificação de possíveis gaps e alternativas.
- Parceria do cliente com escritório contábil
- Integrações com outros sistemas

Ao final desta reunião o Gerente do Projeto e o Líder Técnico devem ter um maior refino dos detalhes técnicos do projeto. Desta forma o Analista ou Gerente do Projeto finaliza o CIV com as informações captadas nesta reunião, e envia para assinatura dos envolvidos.

Caso sejam identificados GAPs durante a transição técnica, os mesmos precisam ser registrados no CIV, com os devidos encaminhamentos e responsáveis. O Analista ou Gerente de Projetos será a pessoa responsável por fazer o acompanhamento dos mesmos.

Importante: Para formalizar o resultado da reunião, o **Checklist de Informações da Venda (CIV)** deve ser preenchido no **Project Life** e enviado ao executivo da conta para aprovação via DOC Studio.

CIV

Responsáveis

1) Participantes da reunião ☐ Não se aplica

Nome	Área

2) Equipe que conduziu o processo comercial ☐ Não se aplica

Nome	Cargo	Responsável (Senior,Cliente)

3) Identificação das principais partes interessadas do Cliente ☐ Não se aplica

Nome	Cargo	Influência (Alta, Média, Baixa)	Problemas atuais (Dor)	Expectativas com a solução

Modelo de implantação

a) Validação do modelo de implantação vendido (Padronizado ou Orientado), suas horas e premissas. ☐ Não se aplica

b) Cliente está ciente das suas responsabilidades, de acordo com o modelo de implantação? ☐ Não se aplica

c) Quem é a pessoa ponto focal para o projeto? ☐ Não se aplica

Aderência da solução

a) Houve levantamento de requisitos in loco ou através de RFP/Edital? (Se RFP/Edital solicitar documentos). ☐ Não se aplica

b) Foi realizada a apresentação da solução ou POC ao cliente? (Se tivermos POC solicitar documentos, relatórios time técnico, resultado da POC). ☐ Não se aplica

c) Alguma funcionalidade da solução não atende ao negócio do cliente? ☐ Não se aplica

d) Temos acordos com equipe de produto/Desenvolvimento para entregas futuros? ☐ Não se aplica

e) Teve envolvimento da Consultoria de Negócio? Se sim, solicitar evidências. ☐ Não se aplica

Atenção: Caso sejam identificadas pendências, estas devem ser registradas no checklist para fins de formalização. Contudo, para acompanhar e dar seguimento nas tratativas o Analista ou Gerente de Projetos pode utilizar o Plano de Ação na ferramenta ServiceNow.

Entradas

Leitura dos documentos comerciais disponíveis no ServiceNow.

Saídas

Checklist de Informações da Venda

CIV preenchido e aprovado através do Doc Studio

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.9 ☐Realizar Reunião Inicial com Cliente

Descrição

Nesta reunião devem ser revisados os componentes e documentos detalhados do projeto:

· Leitura em conjunto com o cliente,de cada item do Documento de Escopo Sintético **(Obrigatório)**

· Mapear as expectativas do cliente com a implantação do sistema, seus objetivos e propósito

· Metodologia: fases do projeto e seus entregáveis **(Obrigatório - Evidencia)**

· Comunicar as necessidades de participação das pessoas, com papéis e responsabilidades (GP do cliente, usuarios chavez)

· Horário de trabalho e ambiente físico/remoto necessário

· Escopo e fora do escopo

· Premissas e restrições

· Faturamento de serviços e despesas do projeto

· Marcos do projeto

· Avaliação inicial das datas para apresentação das DPS's

· Disponibilizar as DPs através do Doc Studio para leitura do cliente e prévio entendimento do que será implementado

· Prazo esperado para a conclusão dos treinamentos EAD e dados de acesso

· Validação do entendimento da DETI

· Alinhamentos de riscos iniciais

· Identificar partes interessadas

· Explicar aprovações no Doc Studio

Os assuntos abordados devem ser formalizados no Termo de Abertura do Projeto - TAP (Documento encontra-se na pasta Entrega Acelerada Senior) e registrados em ata, junto com as pendências e os próximos passos do projeto.

É importante a participação do executivo da conta (Comercial) e em caso de projetos TIER 1 e 2 recomenda-se a participação do ETN.

IMPORTANTE: Nesta reunião o Analista ou Gerente do Projeto deve ser bastante enfático quanto ao respeito às agendas do projeto. As mesmas não podem em hipótese alguma serem desmarcadas sem um aviso prévio, pois os consultores possuem agenda compartilhada entre projetos. Importante destacar que esta é uma questão prevista em contrato, e que requer 10 dias de antecedência para o cancelamento de agendas.

Entradas

Documentação comercial

Checklist de Informações da Venda - CIV

Documento de Escopo Sintético - DEAP

Contato Inicial com Cliente - CIC

Chamado atendido pela Universidade Corporativa

Saídas

Termo de Abertura do Projeto - TAP aprovado pelo cliente via Doc Studio

DPS's através do Doc Studio para leitura do cliente

Monitorar e Controlar Riscos

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.10 ☐ Listar e Alinhar GAP's da DEAP

Descrição

Após reunião com o cliente, baseado nos alinhamentos feitos e na análise do escopo e horas do projeto, é necessário internamente formalizar os pontos não aderentes.

Quando a solução padrão não atender completamente o negócio do cliente ou existir divergência entre o que cliente espera e alega ter sido comercializado, o gerente de projetos deverá envolver as áreas/pessoas necessárias para analisar e viabilizar alternativas para implantação, de acordo com o cenário identificado.

Deve-se analisar:

· Os riscos em relação à implantação;

· Os pontos de não aderência da solução e os seus impactos;

· Se as horas estimadas na venda são suficientes para continuidade do projeto ou se serão necessárias horas não faturadas, bem como a área responsável;

· As expectativas do cliente em relação ao que foi vendido.

A partir disto, os envolvidos devem decidir a melhor alternativa para prosseguir com a implantação, as ações necessárias e as responsabilidades.

Se houver desvios, preocupações e problemas identificados, eles devem ser tratados internamente, antes continuar as tratativas com o cliente e iniciar as entregas da próxima fase.

As decisões deste alinhamento devem ser registradas em ata de reunião, aprovadas via DOC Studio.

Entradas
Documentos comerciais;

Termo de Abertura do Projeto - TAP.

Saídas
Ata de reunião aprovada via Doc Studio

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.11 ☐Acionar/ Aguardar Executivo da Venda

Descrição

Neste momento, a partir do que foi registrado previamente como GAP e/ou risco na atividade anterior, é necessário internamente realizar as tratativas com coordenação, time comercial e em alguns casos CSI e ETN.

É possível formalizar via atas de reunião, e-mails ou utilizando o ServiceNow na gestão de Problemas e Riscos do projeto, conforme os processos descritos em Monitoramento e Controle.

O resultado destes alinhamentos deverão ser formalizados via aditivo da proposta comercial para situações de ajustes financeiros, de prazos e escopo.

Após definições e renegociação, o gerente de projetos poderá retomar o planejamento junto ao cliente.

Instrução de Trabalho: IT264 - Change Request (sharepoint.com)

Entradas

Documentos comerciais e registro das divergências identificadas na reunião inicial.

Saídas

Contato com o Comercial

Change Request aprovado pelo cliente via Doc Studio(quando houver)

Envio Change Request para Comercial no ServiceNow (quando houver)

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.12 ☐Abrir Chamado para a UCS

Descrição
Para projetos nos quais foram vendidas horas para a Universidade Corporativa (UCS), o Analista ou Gerente de Projetos deve abrir um chamado solicitando a liberação dos treinamentos gravados referentes às rotinas ou módulos adquiridos pelo cliente.

Importante: Caso o Analista ou Gerente de Projetos não tenha o perfil de gestor, é necessário solicitar seu cadastro para que possa acompanhar o andamento dos treinamentos.

Para orientações sobre a abertura de chamados para a Universidade Corporativa, consulte a instrução de trabalho : IT279 - Solicitação e Registro de Treinamentos (sharepoint.com)

Entradas
Contato Inicial com Cliente - CIC

Saídas
Chamado registrado para a Universidade Corporativa.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.13 ☐ Solicitar o Tenant

Descrição
De acordo com as necessidades do cliente, é necessário criar ou solicitar um Tenant, conforme a instrução de trabalho: IT263 - Solicitar o Tenant (sharepoint.com)

Entradas
Informações do cliente.

Saídas
Tenant Admin do cliente disponibilizado e e-mail salvo na pasta do DOC Studio.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.14 ☐Liberar o Portal de Implantação

Descrição

Para que o cliente tenha acesso aos Documentos de Processo e Sistemas (DPS), Questionários Eletrônicos, Cenários de Testes e Foundation (ERP), deve ser solicitada a criação do **Portal de Implantação** no **Fast Project,** conforme as instruções de trabalho: IT265 - Portal de Implantação (sharepoint.com)

Entradas

Dados de acesso do administrador do tenant.

Saídas

Portal de Implantação liberado e configurado.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.15 ☐Solicitar Ambiente/ Instalação

Descrição

Para solicitar o ambiente e/ou instalação tanto para On Premises (CDU) ou Cloud (Saas) é necessário registrar a demanda no Fast Project, conforme instrução de Trabalho: IT266 - Processo para Solicitar Ambiente e Instalação (sharepoint.com)

Importante: Para demandas On Premises (CDU), o time responsável para alocar Consultor de TI é a Administração de Serviços, enquanto para solicitações Cloud (SaaS), o time responsável é o IT Services. Ambas as solicitações devem ser feitas pelo Fast Project.

Entradas

Solicitação do ambiente através do Fast Project.

Saídas

RAS - Relatório de Atendimento de Serviços (não há RAS para soluções G7/Ronda Senior X) disponível no DOC Studio;

Documento Dados Ambiente aprovado pelo Analista/Gerente de Projeto via DOC Studio;

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.16 ☐Apresentar Portal Foundation

Descrição

Após solicitar os dados do Portal de Implantação no Fast Project, o Analista ou Gerente de Projetos entra em contato com o cliente para agendar um momento destinado à apresentação do Portal Foundation.

Durante essa reunião, o Analista ou Gerente de Projetos deve explicar o objetivo do Foundation, acessar a Plataforma X em conjunto com o cliente e orientar sobre os dados que devem ser obrigatoriamente preenchidos. Também é necessário alinhar uma data para a entrega dessas informações.

Após a reunião, o Analista ou Gerente de Projetos deve acompanhar o preenchimento dos dados pelo cliente, assegurando a conclusão dessa etapa. Uma vez finalizado o preenchimento, a equipe do Foundation dará sequência ao processo automaticamente.

Entendimento do processo Foundation

Entradas

Portal de Implantação liberado e configurado.

Saídas

Apresentação do Portal Foundation

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.17 ☐Alocação Time Migração

Descrição

Descrição

Todas as atividades de migração de dados de ERP devem ser realizadas pela equipe de migração ou desenvolvimento, mesmo que seja necessário alocar um consultor de implantação.

Para o produto ERP, a alocação da equipe de migração continua na fase 1. No entanto, o início das atividades de envio de layouts e extração/importação de dados deve ocorrer após a apresentação das DPSs. Ao concluir o processo de aderência do módulo, a equipe de migração deve ser informada para iniciar as atividades. **É imprescindível comunicar a equipe de migração após a finalização da apresentação de cada módulo para evitar atrasos no projeto**.

Importante: o processo de migração ocorre ao longo do projeto, em paralelo às demais atividades. Portanto, no cronograma, as atividades de migração acompanham a fase em que o projeto se encontra.

As solicitações de migração de dados devem ser feitas através do Fast Project no Portal de Demanda, conforme abaixo:



Entradas
Solicitações de migração de dados e através do Fast Project

Plano de recurso/ação criado e aprovado no ServiceNow

Saídas

Relatório de validação disponibilizado e arquivado na pasta no Doc Studio para produto HCM

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.18 Desenvolver Cronograma Inicial

Descrição

O cronograma inicial do projeto pode ser criado a partir dos cronogramas padrões de cada solução Senior, podendo ser adaptado ou ajustado conforme necessidade do projeto (exemplo: remover os módulos não adquiridos pelo cliente, agrupamento de tarefas etc.).

É obrigatório que nesse momento o Gerente do Projeto elabore um cronograma completo do projeto. Mesmo que que não haja a completa certeza dos recursos que realizarão as atividades, é preciso realizar a distribuição das horas por fase da metodologia e também considerando as informações da DEAP (Documento de Escopo Analítico do Projeto).

A tabela de tracionamento padrão do ERP de 13 meses deve ser utilizada como base de referência para criação do cronograma inicial, conforme abaixo (exceto para os casos onde foi acordado um prazo diferente com o cliente ainda no processo comercial):

Mês	%Execução	
1	1%	Transição técnica
2	6%	Planejamento e validação do escopo (Fase 2)
3	6%	Validação Escopo (Fase 2)
4	7%	Validação Escopo (Fase 2)
5	6%	Parametrização e Cadastros
6	7%	Parametrização e Cadastros
7	7%	Parametrização e Cadastros
8	7%	Repasses + Testes Unitários
9	8%	Testes Unitários
10	12%	Testes Integrados
11	13%	Testes Integrados
12	15%	Cutover + Operação Assistida
13	5%	Operação Assistida + Primeiro Fechamento
	100%	

O cronograma inicial será a linha base e de referência. O baseline será salvo quando submeter o projeto para fase de Planejamento.

- Submeter o projeto para a fase de planejamento e a primeira linha de base será salva de forma automática:

- Mensagem Finalizando primeira fase do projeto com linha de base salva:

Horas UCS:

As horas da UCS/EAD são adicionadas ao total de horas do projeto e deve-se criar uma tarefa no cronograma com estas horas e atualizar como 100% ou concluída para descontar do total, pois estas horas não devem ser consideradas para gestão.

Horas de reserva e contingência

É indicado realizar a reserva de horas de contingência no projeto, para uso em caso de emergência com o sugerido de 10% das horas totais.

As horas de reserva de contingência devem ser incluídas no cronograma, quebrando as atividades por tipo de recurso.

Importante que estas atividades possuam como data final a mesma data da atividade de TEP, pois desta forma não terá interferência na apuração de indicadores.

Caso seja necessário utilizar a reserva de contingência, somente precisará atualizar o cronograma acrescentando as horas na tarefa correta e subtrair as horas da tarefa de contingencia.

Importante: O cronograma inicial será considerado como a primeira linha de base, conforme o escopo do projeto. Essa primeira baseline corresponde ao cronograma macro e não necessita da aprovação do cliente.

Instrução de Trabalho: IT179 - Cronograma ServiceNow (sharepoint.com)

Entradas
Documento de Escopo Analítico do Projeto - DEAP

- TAP

Saídas
Cronograma criado

1º baseline salva

Responsável

Analista / Gerente de Projetos

4.2.1.19 ☐Planejar os Recursos

Descrição
Caso os recursos alocados na Fase 1 não possam ser utilizados na Fase 2, será necessário replanejá-los. Para efetivar essa alocação, tanto de colaboradores CLT quanto de prestadores de serviço PJ, é imprescindível observar as diretrizes estabelecidas na Instrução de Trabalho - IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

Entradas
Ata de Reunião Inicial

Termo de Abertura do Projeto - TAP

Saídas
Agenda solicitada na ferramenta FAST

Plano de recurso/ação aprovado no ServiceNow

Responsável

Analista/ Gerente de Projetos

4.2.1.20 ☐Planejar apresentação DPS's padrões

Descrição
Uma vez feito a reunião inicial com o cliente, deve-se ter o registro da lista dos usuários chaves, ter esclarecido as responsabilidades e disponibilidades. Com isto alinhar com o cliente as datas que os consultores de implantação façam a apresentação das DPS's (Documento de Processo e Sistema)

Antes da apresentação, é imprescindível disponibilizar os questionários eletrônicos no **Portal de Implantação -** IT265 - Portal de Implantação (sharepoint.com)

Caso não haja uma DPS padrão para o processo nativo, será preciso estabelecer um pacote de trabalho com o consultor para a criação desse documento.

O tempo necessário para essas apresentações varia de acordo com o módulo e o produto adquiridos, e pode ser confirmado com o consultor de implantação. É muito importante que nesta etapa seja apresentada APENAS o sistema padrão e os módulos padrões.

A Baseline 1 é salva automaticamente pelo sistema assim que o Analista/Gerente de Projeto altera a fase, submetendo o projeto para a etapa de Planejamento.



Entradas
Acesso ao Tenant e dados de acesso do administrador do tenant;

Portal de Implantação;

Usuários chaves;

DPS's e questionário;

Cronograma.

Saídas
DPS's;
Questionário eletrônico disponibilizado;

Monitorar e Controlar Riscos.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.21 ☐Alinhar com Consultoria Implantação

Descrição

1. Alinhamento Detalhado com Consultores de Implantação

Com a conclusão da análise do escopo e das horas, bem como dos alinhamentos iniciais realizados, é essencial realizar um alinhamento detalhado com os Consultores de Implantação. É crucial garantir que eles tenham total visibilidade sobre o escopo contratado, o orçamento, as expectativas de prazo e a estratégia de implantação.

Além disso, é importante que os pacotes de trabalho, incluindo o detalhamento das atividades, o esforço requerido e os prazos estabelecidos, sejam discutidos e formalizados com os consultores, baseando-se nas apresentações das DPS's padrões e no apoio ao planejamento.

2. Apresentar DPS's Padrões

• Realizar a apresentação dos processos padrão descritos nas DPS's.

• **Nota Importante**: Neste momento, não devemos questionar o processo atual do cliente. O objetivo é que o cliente ouça a descrição do processo padrão adotado na ferramenta Senior.

• Ao final, o cliente deverá identificar e sinalizar quaisquer partes do processo que não sejam aderentes à sua realidade, para que o consultor possa registrar essas divergências em DLC.

3. Estratégia de Identificação de Customizações

• Alinhar com o consultor e com o cliente o momento exato em que as customizações devem ser identificadas, levantadas, detalhadas, aprovadas e desenvolvidas.

• **Observação**: As customizações não devem ser levantadas durante a apresentação das DPS's padrões. Em vez disso, elas devem ser listadas e registradas em DLC para aprovação de escopo e horas adicionais.

• As horas gastas no levantamento de customizações que não estejam formalizadas nos pacotes de trabalho acordados com os consultores não serão aprovadas no apontamento ou na Planilha de Horas.

4. Listar Qualquer Necessidade de Customização em DLC

• Todas as necessidades de customizações sinalizadas devem ser registradas no Fast Project na DLC.

• O registro deve incluir:

- O processo
- A indicação de se é um impeditivo
- A prioridade
- Quem solicitou
- Uma estimativa de horas para o levantamento do processo customizado.

5. Estimar Horas para o Levantamento das Customizações Identificadas

• Se for identificada a necessidade de customização conforme registrado em DLC, deverão ser estimadas as horas necessárias para a realização dessas customizações.

• A estimativa pode ser realizada:

- Pelo consultor de implantação (para customizações que envolvem regras de negócio)
- Pelo desenvolvedor (para desenvolvimentos específicos e integrações entre sistemas).

6. Colher Aprovação da Change Request de Levantamento de Customizações

• Com a lista de customizações identificadas e a estimativa de horas prevista para o levantamento, deve-se apresentar ao patrocinador do cliente a Change Request.

• A apresentação deve incluir a relação de itens e os valores correspondentes, permitindo que o patrocinador analise e decida sobre a aprovação do levantamento das customizações.

• **Nota Importante**: Durante a reunião, esclareça que o esforço de horas proposto é destinado ao detalhamento e à documentação das customizações. Após essa etapa, será submetida uma nova solicitação para a aprovação das horas necessárias para a execução das customizações.

7. Planejar Agendas para Levantamento de Customizações

• Caso as customizações listadas em DLC tenham tido as horas de levantamento aprovadas pelo cliente, é necessário planejar as datas para o levantamento do processo customizado com o usuário chave daquele processo.

• As agendas devem ser organizadas com base no volume de horas aprovado para este levantamento e devem estar fechadas em pacotes de trabalho com o consultor, assim como no início da fase 2.

8. Levantar Customizações

• Durante o levantamento das customizações mapeadas, o consultor deverá sempre buscar soluções nativas para atender ao processo, mesmo que isso implique em alterações no processo atual do cliente.

• O objetivo é que, ao final da fase 2, tenhamos o menor número possível de customizações.

9. Mapear as Integrações Necessárias

• Além das integrações mapeadas na venda e previstas em proposta, é necessário, durante a fase 2, avaliar a necessidade de outras integrações não mapeadas inicialmente.

• O processo de levantamento dessas integrações deve seguir o mesmo procedimento das customizações, sendo listadas em DLC e com aprovação das horas para o levantamento.

• As DPS's de integração devem especificar os pré-requisitos que precisam ser providenciados pelo cliente.

10. Elaborar DPS's de Customização e Integrações

• Todas as customizações e integrações devem ser acompanhadas por DPS detalhados, especificando:

- O que será customizado e integrado
- Como isso será realizado, incluindo telas, regras, campos e tabelas.

• Esses documentos devem ser submetidos para aprovação antes do início do desenvolvimento.

• As horas estimadas para o levantamento desses itens devem contemplar a entrega completa dos artefatos necessários.

11. Estimar Horas para Desenvolvimento das Customizações

• Quando for identificada a necessidade de customizações ou integrações conforme DLC, deve-se proceder com a estimativa das horas necessárias para a realização dessas atividades.

• A estimativa pode ser feita:

- Pelo consultor de implantação (para customizações que envolvem regras de negócio)

- Pelo desenvolvedor (para desenvolvimentos específicos e integrações entre sistemas).

• Caso o desenvolvimento de customizações e integrações seja aprovado pelo cliente, deverão ser formalizados com os consultores de implantação através do Plano de Recurso e Ação.

12. Explicar Responsabilidade do Consultor no Processo de CTS 12.1. Classificação dos Cenários de Teste

• O consultor é responsável por categorizar os diferentes cenários de testes no Fast Project.

• Isso inclui a identificação e organização dos cenários com base em critérios predefinidos, garantindo que cada cenário seja devidamente classificado para facilitar o acompanhamento e a execução.

12.2. Liberação dos Cenários de Teste

• Após a classificação, o consultor deve liberar os cenários de teste para execução.

• Esse processo envolve garantir que todos os cenários estejam prontos e acessíveis para a equipe de testes, removendo quaisquer impedimentos que possam existir.

12.3. Definição de Evidências Obrigatórias e Previsão de Término

• O consultor define quais evidências são obrigatórias para cada cenário de teste e estabelece uma previsão de término.

• Isso assegura que todos os testes sejam documentados de forma consistente e que haja uma estimativa clara de quando cada teste será concluído.

12.4. Geração de Documentos dos Testes Concluídos

• O cliente ou Gerente de projetos gera documentos dos testes que foram concluídos com sucesso na plataforma do cliente.

• Esses documentos são posteriormente enviados para o Doc Studio.

13. CRAE (Cronograma de Atividades Específicas)

• Alinhar com os consultores que, até o final da fase 2, eles devem disponibilizar o CRAE para permitir o acompanhamento das atividades do projeto.

• Importante também alinhar com o time do projeto como funcionarão as aprovações via Doc Studio.

Entradas

Plano de recursos/ação no ServiceNow;

Cronograma;

DEAP.

Saídas

Ata;

E-mails;

Cronograma atualizado;

Recursos cadastrados no Fast Project.

Responsável

Analista/ Gerente de Projeto e Consultor

4.2.1.22 ☐ Realizar apresentação de Kick Off

Descrição

Na reunião de Kickoff é necessário alinhar todo o escopo contratado, apresentar a metodologia de implantação, falar sobre possíveis identificações de customizações,

reforçar a importância do envolvimento, comprometimento e engajamento do time do projeto, reforçar todas as premissas alinhadas no inicio do projeto, apresentar o time do projeto, papeis e responsabilidades e também o plano de comunicação.

É importante disponibilizar o material apresentado na reunião para o cliente, sendo assim, anexar no DOC Studio o e-mail enviado ao cliente com **Apresentação de Kick Off - AKO.**

Observação: Para projetos mais complexos ou conforme o Analista ou Gerente de Projetos avaliar a necessidade de acordo com o cliente, uma reunião inicial pode ser realizada antes do Kick Off.

Entradas

DEAP Validada;

TAP;

Cronograma Macro.

Saídas

PPT de apresentação de Kick Off;

E-mail enviado ao cliente com apresentação do Kick Off arquivado no Doc Studio;

Planejar e controlar riscos.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.23 ☐ Reunião Foundation (Agenda de Oba Oba)

Descrição

Ao concluir o processo de parametrização, o Analista ou Gerente de Projetos organiza uma apresentação do sistema em conjunto com o cliente. A condução dessa sessão ficará a cargo do Analista de Implantação, que será responsável por demonstrar, de forma abrangente, o funcionamento do sistema.

Durante a apresentação, serão abordados os seguintes tópicos:

- Base pré-populada com alguns cadastros.
- Emissão das Notas.
- Recebimento das Notas.
- Analytics.

Importante: Esta programação tem como objetivo impressionar o cliente

Ao término desta etapa, é fundamental agendar uma nova reunião com o cliente para realizar o primeiro acesso e cadastros nos principais produtos (SGU, Plataforma, eDocs e Flowreset).

Entradas
Apresentação Portal Foundation
Parametrização inicial

Saídas
Apresentação Foundation cobrindo: Cadastros, Emissão e recebimento de notas e Funcionalidades de analytics.

Responsável

Analista de Implantação

4.2.1.24 ☐ Apresentar DPS's Padrões

Descrição

Nesta atividade, o consultor/analista de implantação deve apresentar os processos padrões/nativos descritos em **Documento de Processo e Sistema - DPS** e também eventuais customizações que já foram previstas em proposta e DEAP.

No entanto, não se deve levantar todo o processo atual do cliente, primeiro ele deve ouvir o processo padrão adotado na ferramenta Senior e ao final sinalizar se alguma parte não é aderente, para que sejam então registrados os pontos de ruptura pelo o consultor.

O registro destes pontos de ruptura pode ser feito, sendo opcional, por meio do **Documento de Levantamento de Customização - DLC eletrônico**.

A partir do que foi demonstrado e explicado ao cliente, ele estará apto a responder os **Questionários Eletrônicos**, com auxílio ou não do próprio consultor. Assim que finalizados, os questionários devem ser gerados no Portal de Implantação para que os documentos estejam disponibilizados no DOC Studio.

Importante: Havendo necessidade ou na ausência de algum DPS padrão, o consultor deverá confeccionar o DPS de forma manual, conforme as orientações acordadas no Kick Off Técnico e no pacote de horas da alocação.

Atenção: Nos casos de maior complexidade para levantar as customizações, deve estar claro para o cliente de que primeiramente será informado o esforço de horas requerido para fazer o detalhamento do processo e documentação. Se for impeditivo ou desejado pelo cliente seguir com o detalhamento, será apresentado ao patrocinador a Change Request, relação de itens e valores para analisar e aprovar ou não o seguimento do detalhamento desas customizações. Apenas posteriormente à etapa de detalhamento e com a estimativa de horas para executar, será submetido o investimento para a aprovação de horas da execução.

Todos os documentos, DPS's e Questionários eletrônicos, devem ser submetidos para aprovação dos usuários-chaves envolvidos, via DOC Studio. É essencial que estes documentos sejam aprovados para dar continuidade no projeto.

Entradas

· DPS's disponibilizados no DOC Studio e enviados para leitura prévia do cliente;

· Base de demonstração do consultor para demonstração dos processos no sistema.

Saídas

DPS's e Questionários Eletrônicos aprovados pelos usuários-chave via DOC Studio.

Responsável

Consultor/Analista de Implantação

4.2.1.25 ☐ Preencher DLC Eletrônica

Descrição

Uma maneira de listar, organizar e classificar os pontos de ruptura dos processos é a partir do **Documento de Levantamento de Customizações - DLC.**

No processo de implementação da torre ERP, o Consultor de Implantação deve verificar com o cliente se há interesse em prosseguir com o processo de customização. É necessário alinhar com o cliente que, para a realização deste primeiro levantamento, será obrigatória a emissão de uma solicitação de mudança.

Após aprovação da Change Request, as necessidades de customizações sinalizadas que não foram previstas na venda devem ser registradas em um Documento de Levantamento de Customização (DLC). Esse documento deve incluir informações sobre o processo, se ele é impeditivo, sua prioridade, o solicitante e uma estimativa de horas para o levantamento do processo customizado, conforme a instrução de trabalho: IT268 - Documento e Levantamento e Customização (DLC)

Entradas

Pontos de ruptura registrados eletronicamente.

DPS's disponibilizados no DOC Studio e assinadas

Saídas
Documento de Levantamento de Customizações

DLC aprovado pelo cliente via DOC Studio.

Responsável

Consultor/Analista de Implantação

4.2.1.26 ☐Elaborar Change Request de Levantamento

Descrição
Caso o cliente demonstre interesse em prosseguir com o levantamento inicial, o Analista ou Gerente de Projetos deverá elaborar o documento de solicitação de mudança (Change Request) e apresentá-lo ao patrocinador do projeto. É importante ressaltar que esta primeira solicitação contempla apenas as horas destinadas ao levantamento das customizações.

Verificar instrução de trabalho IT264 - Change Request (sharepoint.com)

Entradas
DPS's padrões apresentadas
Documento de Levantamento e Customizações - DLC.

Saídas
Solicitação de mudança aprovada ou reprovada através do Doc Studio

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.27 ☐Elaborar e apresentar a Change Request

Descrição
Após a aprovação da Change Request pelo cliente, o Analista ou Gerente de Projetos deve elaborar uma segunda solicitação de mudança (Change Request), incluindo o planejamento do gerenciamento e dos recursos necessários para a execução das

atividades. Este documento deverá ser apresentado ao cliente, assegurando a aprovação final do patrocinador por meio do Doc Studio.

Verificar instrução de trabalho IT264 - Change Request (sharepoint.com)

Entradas
DLC

Saídas
DLC's aprovadas através do Doc Studio

Solicitação de mudança aprovada ou reprovada através do Doc Studio

Responsável

Analista/ Gerente de Projeto

4.2.1.28 Registrar Demanda de Desenvolvimento

Descrição
As atividades de customização identificadas devem ser conduzidas exclusivamente pela equipe de Desenvolvimento do ERP. Se houver necessidade de alocar o Consultor de Implantação, a equipe será responsável por informar o Analista ou o Gerente de Projetos.

Registrar a demanda de solicitação de desenvolvimento no portal Fast Project, incluindo todas as informações relevantes para orientar o processo técnico. Se houver mais de um desenvolvimento previsto no escopo, deve-se cadastrar uma demanda para cada item de desenvolvimento. Para cada demanda, é necessário indicar a data de conclusão desejada e o total de horas estimadas para a execução. O documento de escopo analítico do projeto deve ser anexado à demanda. Comentários adicionais podem ser inseridos para facilitar a compreensão da necessidade e para alinhamentos complementares.

Importante enfatizar que o prazo para conclusão da customização deve considerar a data planejada para início dos testes integrados do projeto de implantação.

Para mais detalhes, consulte o processo de alocação descrito na instrução de trabalho: IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

Entradas

• Recurso através do Fast Project

• Informações da Demanda.

• Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP).

Saídas

* Registro da demanda no portal Fast Project.

Responsável

Analista/Gerentes de Projetos

4.2.1.29 Processo para Demandas de Customizações

Processo

PO250 - Subprocesso de Desenvolvimento em Projetos de Implantação - Subprocesso de Demandas de Customização/Integração ERP em Projetos de Implantação

4.2.1.30 Explicar e Liberar CTS's

Descrição

Com as DPS's padrões, de customizações e de integrações aprovadas, é importante disponibilizar na plataforma Senior X do cliente, página de Cenários de Testes, todas as CTS's referentes ao escopo do projeto. É muito importante que o cliente tenha antes do fechamento da fase 2, a visibilidade do volume e complexidade dos testes a serem realizados por ele na fase de homologação. Isso será muito importante para elaboração do cronograma detalhado.

Importante destacar que à medida que o Consultor se apropria do projeto e compreende os processos de negócio do cliente, ele deve começar a criar cenários integrados de teste. Esses cenários devem prever o fluxo completo de testes, e deverão ser construídos e compartilhados com os demais consultores à medida que o projeto avança. Esses cenários devem transpassar as customizações e integrações, e serão utilizados quando chegar na tarefa de Efetuar Testes Integrados.

Para liberar as Cenários de Testes (CTS) é necessário seguir conforme instrução de trabalho: IT 271-Liberação e Classificação dos Testes CTS´s (sharepoint.com)

Na fase de execução existe um documento de orientação ao cliente de como realizar o teste CTS, segue o link do documento: Orientação-Teste-do-Sistema-para-o-cliente

Entradas
Disponibilização dos cenários de teste

Saídas
Entendimento dos cenários de testes

Responsável

Analista/ Gerente de Projeto

4.2.1.31 ☐ Elaborar CRAE

Descrição
O Consultor de Implantação deve detalhar todas as atividades técnicas a serem entregues no Cronograma de Atividades Específicas (CRAE), especificando a data, o responsável e o horário para cada atividade. Esse detalhamento é fundamental para o acompanhamento das entregas acordadas, garantindo que todas as partes envolvidas estejam cientes das responsabilidades e dos prazos.

Importante: O Consultor de Implantação deve encaminhar ao Analista ou Gerente de Projetos o Cronograma de Atividades Específicas (CRAE) de todos os módulos aos quais foi designado.

Entradas
DPS's Aprovadas via Doc Studio

DLC's Aprovadas via Doc Studio

Fechamento Pacote Fase 2

Saídas
CRAE (Cronograma de Atividades Específicas)

Responsável

Consultor de Implantação

4.2.1.32 ☐Detalhar planejamento do projeto

Descrição
O Analista ou Gerente de Projeto deve, primeiramente, assegurar a correta distribuição das horas destinadas à Consultoria e ao Gerenciamento do projeto, observando a mesma proporção definida na tarefa "Desenvolver Cronograma Inicial".

Todas as atividades relacionadas à Consultoria e ao Gerenciamento devem ser planejadas e distribuídas de acordo com essa proporção. Já as tarefas específicas de Customizações, TI e Migração devem ser organizadas conforme o planejamento específico de suas respectivas entregas.

Avaliar disponibilidade e períodos críticos dos usuários:

• **Passo 1:** Identificar os usuários-chave e consultores essenciais para a fase de homologação.

• **Passo 2:** Avaliar a disponibilidade desses profissionais, considerando períodos críticos de suas rotinas diárias.

• **Passo 3:** Identificar riscos associados à indisponibilidade dos envolvidos.

• **Passo 4:** Desenvolver um plano de resposta aos riscos identificados, assegurando que o cronograma do projeto se mantenha dentro do planejado.

Planejar as datas da homologação:

• **Passo 5:** Com a disponibilidade dos envolvidos alinhada, definir as datas para a fase de homologação

• **Passo 6:** Incluir as datas definidas para a homologação no cronograma do projeto.

• **Passo 7:** Considerar possíveis restrições de tempo e a necessidade de ajustes conforme a evolução do projeto.

Planejar o Cutover:

• **Passo 8:** Planejar a entrada em produção (Cutover) com antecedência, assegurando que as atividades relacionadas sejam incluídas nos pacotes de trabalho.

• **Passo 9:** Garantir que o cronograma contemple adequadamente as horas dedicadas às atividades de Cutover. Essa fase é crítica para a transição suave do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção.

CRAE:

• **Passo 10:** Os consultores devem preparar as CRAEs para acompanhamento detalhado das atividades do projeto.

• **Passo 11:** Assegurar que todas as tarefas sejam monitoradas continuamente e que o progresso esteja alinhado ao cronograma geral.

Sequenciar as atividades:

• **Passo 12:** Sequenciar corretamente as atividades do projeto, levando em consideração as interdependências entre elas.

• **Passo 13:** Utilizar cronogramas padrões e roteiros de implantação como referências, com apoio dos consultores de implantação.

Reforçar papeis e responsabilidades:

• **Passo 14:** Reforçar e realinhar os papéis e responsabilidades de cada membro da equipe, com base no escopo validado.

• **Passo 15:** Definir claramente as responsabilidades do consultor, dos usuários e as diferenças entre as funções do GP Senior e do GP do cliente.

Mapear riscos:

• **Passo 16:** Avaliar todos os riscos associados a cada pacote de trabalho com o avanço da Fase 2 do projeto.

• **Passo 17:** Identificar responsáveis, criticidade, impacto e ações de resposta para cada risco mapeado.

• **Passo 18:** Atualizar o mapeamento de riscos continuamente, refletindo o estado atual do projeto

Planejar o gerenciamento dos riscos:

• **Passo 19:** Formalizar um plano de gerenciamento de riscos que inclua acompanhamento contínuo, ferramentas específicas, reuniões recorrentes e atualizações de status.

• **Passo 20:** Assegurar que o plano visa antecipar possíveis impactos ao cronograma e mitigar riscos de forma proativa.

Planejar o Gerenciamento de Tempo, Escopo, Custo, Qualidade, RH, Comunicações, Riscos e Partes Interessadas:

• **Passo 21:** Todas as áreas mencionadas (Tempo, Escopo, Custo, Qualidade, RH, Comunicações, Riscos e Partes Interessadas) devem ser contempladas em um plano de gerenciamento abrangente.

• **Passo 22:** Assegurar que todos os aspectos do projeto estejam alinhados e integrados, com monitoramento contínuo para garantir que os objetivos sejam alcançados.

Elaborar/ Finalizar cronograma detalhado:

• **Passo 23:** Planejar as datas de cada atividade, verificar o caminho crítico e validar o cronograma detalhado com a equipe Sênior e o cliente.

• **Passo 24:** Após a validação, salvar a Baseline 2 como referência para o acompanhamento do projeto.

Validar Cadastro Financeiro e Plano de Recursos e Custos:

• **Passo 25:** Conferir o cadastro financeiro do projeto e o plano de recursos e custos, assegurando a correção das horas e valores previstos.

• **Passo 26:** Incluir no cadastro financeiro as alterações aprovadas nas solicitações de mudança (Change Request), como DEAP e aditivos.

Entradas

DEAP

Cronograma Macro

Acordos e restrições, acordos internos, riscos Iniciais, caminho crítico, premissas e pré requisitos alinhados e registrados em TAP e atas

CRAE's arquivadas no Doc Studio

DPS's aprovadas via Doc Studio

DLC's aprovadas via Doc Studio

Solicitações de mudanças (Change Request) aprovadas via Doc Studio

Saídas

Cronograma completo detalhado

Responsável

Analista/ Gerente de Projeto

4.2.1.33 ☐ Realizar reunião de encerramento de Fase 2

Descrição

Nesta reunião, inicia-se a transição da fase de planejamento para a fase de execução. O plano do projeto e seus elementos devem ser revisados e apresentados ao cliente, premissas, fatores de sucesso, cronograma, metodologia, ferramentas a serem utilizadas, regras definidas, documentação aprovada, plano de comunicação, papéis e responsabilidades.

Importante: No encerramento da fase 2, deve-se alinhar com o cliente a data de GO Live e registrá-la no cronograma do projeto. A baseline 2 é salva automaticamente pelo sistema ServiceNow, mas é necessária a aprovação do cliente.

Ponto de atenção: Antes de avançar para a fase de execução, verifique se toda a documentação das fases anteriores está aprovada pelo cliente e arquivada na pasta do projeto.

Instrução de Trabalho: [IT179 - Cronograma ServiceNow (sharepoint.com)]

Entradas

Cronograma detalhado

Documentos DPS's e DLC's aprovadas via Doc Studio

Solicitações de mudanças aprovadas via Doc Studio

CRAE's

Alinhamentos internos realizados e registrados (e-mail/ ata)

PPT de apresentação de fechamento da fase 2

Saídas

PPT de apresentação de fechamento da fase 2, email com formalização do envio do PPT arquivado no Doc Studio;

Ata de reunião no do Doc Studio;

Baseline 2 salva e aprovada pelo cliente via Doc Studio.

Responsável

Analista/Gerente de Projeto

4.2.1.34 ☐Parametrizar e configurar o sistema

Descrição
Esta atividade consiste em parametrizar/configurar/cadastrar dados no sistema com base nas definições da fase 2, conforme Documento de Processo e Sistema - DPS.

O trabalho é desenvolvido pelos consultores e os usuários-chave devem ser envolvidos. Desta maneira, o consultor deverá realizar o primeiro cadastro e/ou parametrização de uma rotina e ensinar o usuário-chave, para que ele faça os demais, como no caso no cadastro de empresas e colaboradores. Assim, o trabalho é compartilhado e os usuários-chaves iniciam o processo de capacitação.

Entradas
Documento de Processo e Sistema - DPS

Cronograma

Roteiros de implantação (quando aplicável) Solicitação de Alocação de Recursos

Saídas
Sistema parametrizado conforme especificações

Responsável

Consultor de Implantação

4.2.1.35 ☐Classificar e liberar testes

Descrição
O Consultor é responsável por classificar os cenários de teste de acordo com sua criticidade e complexidade, garantindo que todos estejam adequadamente identificados e prontos para serem testados pelo cliente.

Após a liberação dos testes, o Consultor deverá agendar uma reunião com o cliente para orientar e definir os prazos para a conclusão dos testes. Após a reunião, o Consultor poderá disponibilizar ao cliente o manual de orientação para a realização dos testes: Orientação-Teste-do-Sistema-para-o-cliente

Para mais detalhes, consulte a Instrução de Trabalho: IT 271-Liberação e Classificação dos Testes CTS´s (sharepoint.com)

Entradas
Classificação cenários de testes no Fast Project.

Saídas
Liberação dos testes na plataforma do cliente
Orientação para realização dos testes

Responsável

Consultor de Implantação

4.2.1.36 ☐Repasse das Parametrizações para os usuários chaves

Descrição
Após parametrizar o produto designado e liberar os testes relacionados na plataforma Fast, o Consultor de Implantação realiza agora o repasse das parametrizações realizadas para o usuário chave responsável pelo produto.

O repasse tem por finalidade capacitar o usuário chave na parametrização realizada, e seu objetivo principal é que o usuário chave possa correlacionar os conteúdos discutidos na fase de planejamento com o que foi parametrizado. O consultor também precisa repassar com o usuário chave o acesso ao Painel e se certificar de que o mesmo sabe localizar os cenários de teste inerentes aos seus produtos, e quais devem ser realizados para o produto ser considerado concluído.

Ao final deste processo o usuário chave deve estar apto a realizar os testes no sistema ERP, valendo-se das parametrizações e orientações repassadas pelo consultor.

Importante destacar que este momento é um repasse, e não uma capacitação completa. Espera-se que neste ponto o usuário chave tenha se capacitado na Universidade Corporativa. O Analista ou Gerente do Projeto deve orientar sobre a duração e sobre o teor do repasse, de modo que o consultor possa programar este momento de acordo com as características dos usuários chave e dos projetos.

Para obter orientações sobre como extrair o relatório (UCS) e/ou registrar o treinamento (RTC), consulte a instrução de trabalho: IT279 - Solicitação e Registro de Treinamentos (sharepoint.com)

Entradas
Sistema parametrizado conforme especificações

Saídas
Registro de Treinamento e Capacitação - RTC aprovado pelo cliente via Doc Studio

Relatório dos treinamentos EAD arquivados na pasta do projeto no Doc Studio

Responsável

Consultor de Implantação

4.2.1.37 Realizar Customizações

Processo

PO250 - Subprocesso de Desenvolvimento em Projetos de Implantação - Subprocesso de Demandas de Customização/Integração ERP em Projetos de Implantação

Portões

Efetuar Testes Unitários

4.2.1.38 Efetuar Testes Unitários

Descrição
A validação das parametrizações, cadastros e/ou dados importados deverá ser realizada primeiramente pelo consultor e posteriormente pelos usuários-chave, assim, se houver erros ou problemas, o consultor poderá ajustar antes que o usuário-chave faça as verificações.

O consultor de implantação deve promover os testes necessários para garantir o bom funcionamento do sistema que está sendo implantado. Todos os itens listados nos Documentos de Processo e Sistema - DPS, serão testados através do **CTS eletrônico** , inclusive as customizações desenvolvidas (quando houver).

Consultor poderá disponibilizar ao cliente o manual de orientação para a realização dos testes: Orientação-Teste-do-Sistema-para-o-cliente

Para a formalização dos testes realizados, o resultado deverá ser registrado pelo usuário-chave nos Cenários de Testes de Sistema - CTS, podem ser registrados imagens do sistema para comprovar o funcionamento ou não funcionamento da rotina testada através da ferramenta Fast Project, conforme o Manual CTS Eletrônica - GP e Consultor.docx .

Caso ocorra alguma inconsistência no produto padrão, o consultor de implantação deve acionar o time de suporte da Senior para que o item apontado seja corrigido, todas as inconsistências devem ser tratadas antes do cliente realizar os testes integrados.

Assim que os testes forem concluídos com sucesso, todos os documentos devem ser gerados para o DOC Studio e devem ser submetidos para aprovação eletrônica pelo consultor e cliente.

Nota: O Analista/Gerente de Projetos pode acompanhar os resultados dos testes através do BI CTS eletrônico. Além disso, o Analista/Gerente de Projeto receberá também uma notificação quando o teste for reprovado.

Entradas
Sistema parametrizado conforme especificações;

Customização desenvolvida.

Saídas
Cenário de Testes de Sistema - CTS validado pelo usuário-chave, armazenado no Doc Studio.

Responsável

Consultor de Implantação

4.2.1.39 Preparar Testes Integrados

Descrição

Esta atividade consiste na preparação para os testes integrados, a serem realizados entre todos os módulos sistema.

Para realizar a devida preparação, o Gerente do Projeto deve solicitar ao cliente uma massa de dados coerente para ser utilizada como teste. Usualmente é solicitado ao cliente que separe os documentos que representam 70% do seu faturamento, o que deve representar em torno de 30% das operações. Esses são os testes que devem ser priorizados, no entanto, o cliente deve garantir que todos os seus processos de trabalho foram contemplados na massa de dados. Todos esses testes devem compor a planilha de testes integrados.

Em seguida, deve ser realizada uma reunião para marcar o início dos testes integrados. É obrigatório que nesta reunião estejam presentes o patrocinador do projeto, o líder do projeto, os usuários chave, o Analista ou Gerente do projeto, o Líder Técnico, os Consultores de Implantação e os Usuários Finais. Deve ficar claro que a responsabilidade pela realização dos testes integrados é do Cliente, pois ele domina o seu processo e suas necessidades de negócio.

Nesta reunião é importante frisar a todos que os testes integrados são o cenário mais próximo possível da entrada em produção, e eles devem ser feitos exclusivamente pelos usuários (consultores conduzem, mas não podem realizar os testes integrados para o Cliente).

Deve ser solicitado ainda que os testes integrados ocorram no formato de war room, onde todos os participantes estejam em um mesmo ambiente, compartilhando o trabalho e resolvendo as questões em conjunto.

Deve ser colocado ainda que os testes integrados são usualmente realizados em três ciclos completos, e somente é possível encerrar os testes caso os mesmos atinjam uma acuracidade de 95% ou mais. A cada ciclo, os testes que foram reprovados no ciclo anterior devem ser refeitos, e assim sucessivamente.

Entradas
Teste Unitários validados

Saídas
Teste Integrado preparado

4.2.1.40 ☐Realizar Testes Integrados

Descrição

Esta atividade consiste na execução dos testes integrados entre todos os módulos do sistema.

A realização dos testes integrados é um processo conduzido pelo Gerente do Projeto e pelos Consultores de Implantação, no entanto, a responsabilidade pela execução é do Cliente e de seus Usuários. Os testes a serem realizados estão listados na Planilha de Testes Integrados, devem ser sequenciados, conduzidos e registrados neste documento, que servirá como base de consulta e tomada de decisão durante todo o processo.

Na realização dos testes integrados, o usuário-chave tem as seguintes responsabilidades:

- Capacitar os usuários finais para realização dos testes.

- Apoiar na construção dos testes integrados, garantindo que todas as rotinas do negócio sejam mapeadas e testadas.

- Seguir os cenários de teste conforme descrito nos Planilha de Testes Integrados e anotar o resultado.

- Gerar evidências, como capturas de tela, nos Cenários de Testes de Sistema, para que o analista ou gerente de projetos possa armazená-las nas evidências do projeto.

- Evidenciar para os consultores os processos que não tiveram o efeito esperado.

- Interagir com as demais áreas para encontrar soluções e melhorar a fluidez dos testes integrados.

Após a realização dos testes integrados, o Analista ou Gerente do Projeto deve evidenciar os resultados obtidos para o Cliente, de modo que esta informação servirá como base de decisão para entrada em produção ou para a repetição dos testes integrados.

Ao final dos testes integrados, o Gerente do projeto deve gerar uma evidência onde o cliente concorda que realizou com sucesso testes integrados que contemplam todas suas operações de negócio, garantindo que todos os cenários de sistema necessários foram testados. O Gerente de Projetos deve registrar ainda junto ao cliente qual o percentual de sucesso que foi atingido nos testes integrados, e também obter o consentimento de que os cenários de teste foram elaborados e formulados pelo próprio cliente

Entradas

Módulos parametrizados.

Customizações validadas.

Treinamentos realizados pelo consultor ou EAD

Saídas
Testes de integração validados pelo usuário-chave nos Cenários de Testes de Sistema - CTS com aprovação arquivada na pasta do projeto no Doc Studio

Responsável

Consultor de Implantação

4.2.1.41 ☐Stress Test

Descrição
Orientar e prestar suporte aos usuários-chaves do cliente durante a fase de homologação do sistema.

É necessário monitorar a performance da solução em operação, considerando um volume transacional significativo, para identificar eventuais problemas de lentidão na aplicação ou na infraestrutura.

Com base na homologação, verificar se as entregas da solução atendem ao escopo definido, se há presença de erros e se os usuários assimilaram o uso das rotinas.

Após a homologação de todas as rotinas e a confirmação do funcionamento adequado, será elaborado o planejamento para a entrada em produção.

Entradas
Registro de Treinamento e Capacitação - RTC

Cenário de Teste e Sistema - CTS.

Saídas
Solução homologada pelos usuários-chave

Responsável

Consultor de Implantação

4.2.1.42 ☐Acionar Time de Suporte

Descrição
De acordo com a necessidade e complexidade do projeto e cliente, o Analista/Gerente de Projetos pode acionar o Suporte previamente para repassar todas as informações necessárias antes do Go Live.

Quando o projeto estiver próximo à data de Go Live, o Gerente de Projetos deverá agendar uma conversa com o líder do suporte e/ou analista técnico responsável (de acordo com os responsáveis descritos no Guia do Suporte), para falar do histórico do projeto:

- Como foi a implantação até aquele momento;
- Relacionamento do cliente com a Senior e expectativas com o projeto;
- Se é necessário envolvimento do time do suporte no planejamento de virada em produção;
- Se foram desenvolvidas customizações e se há integrações;
- Demais pontos importantes para conhecimento do suporte.

Neste mesmo contato deve ser avaliado junto ao Time de Suporte a necessidade de plantão em fim de semana para acompanhar a preparação ou o Go Live do projeto. Esta questão deve ser planejada com antecedência para que o time de suporte possa realizar a devida programação.

O objetivo desta conversa é tornar a transição do projeto para o suporte mais humanizada, tanto para o suporte como para a experiência do Cliente.

E com base nesta conversa, o suporte decidirá se irá se apresentar para o cliente (forma de trabalho, canais de atendimento, prazos) e apoiar no planejamento da virada em produção. Se sim, o Analista/Gerente de Projetos fará o agendamento com o cliente e também envolverá o suporte nas próximas etapas do projeto.

Entradas

Solução homologada pelos usuários-chave

Saídas

Ata de reunião da conversa com o suporte

Reunião agendada para conversa entre Suporte, cliente e time do projeto

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.43 ☐Planejar Entrada em Produção

Descrição

Esta atividade consiste em realizar o planejamento da virada do sistema em produção em conjunto com o time técnico e do cliente, definindo as atividades e responsabilidades que antecedem esta etapa.

É importante ressaltar que este é um trabalho realizado a quatro mãos, ou seja, em colaboração com o Cliente. Usualmente são incluídos nesta atividade o Gerente do Projeto, os Consultores de Implantação, o Líder Técnico, o Líder do Projeto, o Usuário Chave e o Patrocinador. Todos devem analisar as premissas e restrições do projeto, assim como a cultura empresarial (hora extra, férias, alimentação, finais de semana, etc). Atentar ainda para a necessidade de identificar todas as comunicações a serem realizadas, que devem contemplar o público interno e todas as áreas interessadas da empresa, bem como a comunicação externa para o mercado, fornecedores e parceiros.

O Plano de Entrada em Produção deve passar pelas questões que envolvem a infraestrutura de TI, plano de backup, plano de rollback, inventário, migração de dados, implantação de saldos, testes realizados e se o time está capacitado, certificando que todas as partes estão prontas para a virada do sistema em ambiente de produção.

Em alguns casos, considerando a complexidade do projeto, a equipe de suporte da Senior deverá participar da elaboração do plano de virada.

Para formalizar o resultado do planejamento, o Gerente do Projeto utiliza o documento **Plano de Entrada em Produção - PEP. Após finalizado**, divulga a todos os stakeholders do projeto, certificando-se que cada participante do plano de virada entendeu seu papel e suas responsabilidades. Neste momento o Analista ou Gerente de Projeto deve coletar uma evidência de aceite do cliente no Plano de Entrada em Produção, ficando registrado que as partes estão de acordo com plano.

Entradas
Solução homologada pelo cliente

Cenários de Teste de Sistema - CTS

Registro de Treinamento e Capacitação - RTC

Ata de reunião da conversa com o suporte

Saídas
Plano de Entrada em Produção - PEP aprovado pelo cliente e arquivado na pasta do projeto no Doc Studio

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.44 ☐Realizar Reunião de Go / no Go

Descrição
A reunião de GO/NO GO é um momento chave do projeto, onde será realizada a formalização da conclusão do processo de parametrização e homologação da solução, bem como o alinhamento para a entrada em produção. Esta reunião deve ser realizada com no mínimo uma semana antes da data prevista do Go Live, e deve envolver o Gerente de Projetos do cliente, o Patrocinador, os Usuários Chave, o Gerente do Projeto e os Consultores envolvidos. A presença do Patrocinador é obrigatória e indispensável, e a reunião deverá ser remarcada até que ele possa participar. Esta reunião deverá ser obrigatoriamente gravada.

IMPORTANTE: Caso o Gerente do Projeto entenda que haverá divergência entre as partes na Reunião de GO/NO GO, onde o Cliente deseja fazer o Go Live mas a equipe do projeto não está segura, a presença do Gerente da Torre e da Coordenação será obrigatória nesta reunião, de modo que seja tomada e documentada uma decisão corporativa a respeito.

A reunião de GO/NO GO resulta no preenchimento da DOSP. Importante destacar que o texto padrão desse documento deve ser adequado à realidade do projeto, e deve obrigatoriamente conter:

- Pendências e restrições.

- Cenário de testes e testes faltantes.

- Riscos identificados e estratégias de tratamento.

- Impactos identificados.

Após finalizado o texto da DOSP, esse documento deve ser obrigatoriamente assinado pelo Patrocinador através do DOC Studio.

Como registro formal desta reunião, o Gerente do Projeto deve armazenar a gravação, e em seguida formar uma ata onde constam todos os aspectos discutidos na reunião. Essa ata e os materiais apresentados devem ser enviados em formato PDF para todo o time do projeto e para o Comitê Executivo.

Após assinatura do Patrocinador, a DOSP deve ser encaminhada ao e-mail dosp@senior.com.br, para que a Gestão de Faturamento faça a liberação de pagamento de ATST (quando alinhado em proposta). Com o retorno da Gestão do faturamento, é alterado no sistema ERP a situação do cliente para dar início ao atendimento de suporte.

Entradas

-Plano de Entrada em Produção – PEP

-Reunião de Go/No-Go

Saídas

-Documento de Oficialização de Sistema em Produção- DOSP aprovado

-Cronograma das atividades para entrada em produção validado

-Atualização Registro Riscos

-email dosp@senior.com.br

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.45 ☐Passar cliente para o suporte

Descrição
Após a liberação do suporte ERP pelo time de faturamento e o envio da DOSP, é necessário formalizar junto ao Suporte Técnico a documentação relacionada ao projeto e ao cliente. Seguem as instruções:

Suporte Senior/Unidade de Negócio:

1- Preencher o formulário Repasse do Cliente para o Suporte - ERP Padrão ou GO UP (revisão 3.0).docx disponível no SharePoint. Lembrando que a recomendação é preencher o formulário ao longo do projeto para que o trabalho não se acumule ao final do projeto.

2- Enviar formulário preenchido em formato Word para o Contact Owner do ERP, conforme orientações disponíveis no Portal de Documentação, no link a seguir (https://documentacao.senior.com.br/guia-do-suporte.htm). Após a leitura e análise da documentação, o responsável pela análise vai solicitar as correções necessárias. Quando o documento for concluído, o Time de Suporte disponibilizará horários para uma agenda de boas-vindas ao cliente, que deverá ser marcada, acompanhada e gravada pelo Gerente de Projetos. O SLA para resposta do Time de Suporte é de 7 dias.

3- Abrir chamado na Sara Corporativa para criação do Usuário Master, conforme passo a passo abaixo:

4- Pesquisar "Zendesk" e selecionar a opção "Cadastrar usuário para acessar o Zendesk" e selecionar "Usuário Master"



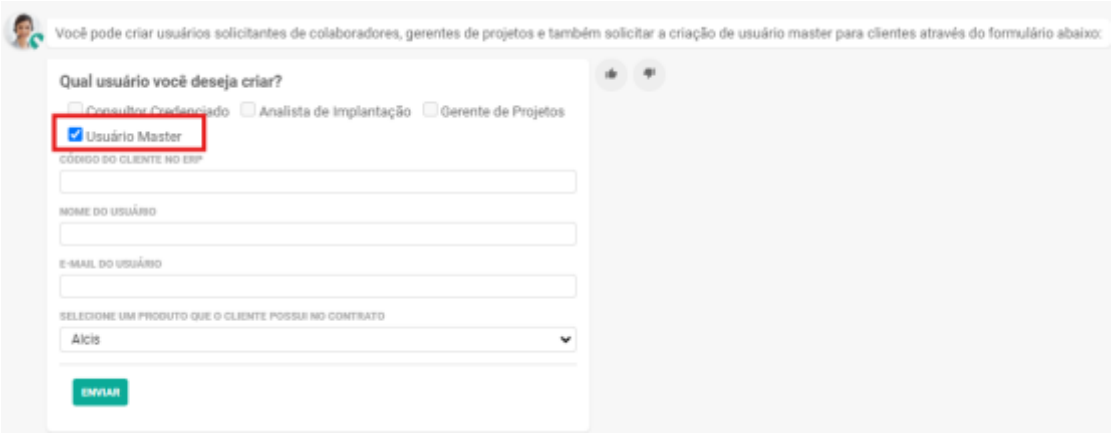

6- Após o chamado e criado BPM para coordenador do produto do cliente;

7- Arquivar o e-mail enviado ao suporte com documento anexo no DOC Studio na pasta Repasse ao Suporte.

Suporte Canal:

· Enviar e-mail ao contato responsável no Canal, comunicando a entrada do sistema em produção com os dados do cliente para suporte, baseando-se nas informações do formulário acima, utilizado para o suporte da Senior.

Notas:

· A comunicação ao suporte deverá ocorrer no prazo de até 7 dias a partir da assinatura do DOSP.

· Se houver chamados pendentes no final da implantação, deve-se transferi-los para o cliente conforme abaixo:

· Suporte realizado pela Senior: deve-se providenciar para que o solicitante seja alterado para o responsável pelo suporte no cliente.

· Suporte realizado pelo Canal de Distribuição: deve-se providenciar para que o solicitante seja alterado para o responsável pelo suporte do cliente credenciado no Canal, pois os chamados de clientes atendidos pelo suporte do canal devem ser abertos usando o canal de distribuição como cliente e como cliente representado, o próprio cliente.

Entradas
-Documento de Oficialização de Sistema em Produção - DOSP aprovado via Doc Studio
-Sistema em Produção

Saídas
-Handover enviado via ServiceNow
-Registro do Ticket no ZenDesk
-Reunião de repasse com a equipe de suporte

Responsável

Analista / Gerente de Projetos

4.2.1.46 ☐Ativar o Sistema em Produção

Descrição
Com o Documento de Oficialização de Entrada em Produção (DOSP) aprovado pelo cliente o consultor de implantação e/ou IT Services, com o auxílio da área de TI do cliente, deve deixar o sistema operando sobre o banco de dados de produção.

Entradas
Documento de Oficialização de Entrada em Produção - DOSP

Saídas
Sistema operando em ambiente de produção.

Responsável

Consultor de Implantação

4.2.1.47 ☐Acompanhar o Sistema em Produção

Descrição

O consultor de implantação será responsável por monitorar a operação do sistema em produção, conforme o período acordado entre o cliente e o gerente de projetos (ou conforme definido na proposta/DEAP), a partir da data de Go Live. Esse acompanhamento deverá estar previsto no cronograma, com as respectivas horas alocadas.

O acompanhamento poderá ser realizado presencialmente ou remotamente, dependendo da complexidade do cliente e do que foi acordado previamente.

Durante o acompanhamento, o consultor de implantação verificará a execução das rotinas do sistema e monitorará a performance da operação.

Se necessário, o consultor oferecerá suporte ao usuário-chave em caso de dúvidas, realizará treinamentos adicionais e, se surgirem problemas, envolverá as pessoas adequadas para a solução.

Registros de reuniões (atas) e documentos recebidos do cliente durante esse período serão considerados registros de acompanhamento.

Observação: O suporte estará disponível ao cliente a partir da data de alteração da situação do contrato no ERP. Recomenda-se negociar com o cliente que, durante o período de acompanhamento, qualquer erro ou problema seja tratado dentro do projeto.

Entradas
Sistema operando em produção

Saídas
Monitoramento do sistema em produção

Responsável

Consultor de Implantação

4.2.1.48 ☐Encerrar saldo de horas

Descrição

Para projetos com **escopo aberto**, é necessário informar o saldo disponível para o cliente utilizar em futuros projetos no Termo de Encerramento de Projeto (TEP). Para isso, deve-se abrir um chamado para o financeiro conforme as instruções a seguir:

1 - Senior X > PMO de Serviços > Ellevo



2 - Selecionar Diretoria de Serviços > Governança e Performance > Solicitações > Financeiro > 02.01 Enviar saldo do projeto:

3 - O executivo responsável deve lançar um novo pedido no CRM, garantindo que as horas e o valor sejam inseridos com **valor zerado.**

4- O Portfólio irá cadastrar o novo projeto nas ferramentas necessárias.

5- Após o cadastro no ServiceNow, o Analista/Gerente de Projetos deve transferir o saldo pendente do projeto original para o novo projeto.

6- Com a transferência do saldo concluída, o Analista/Gerente de Projetos deve informar o saldo disponível

7- Caso o projeto seja transferido para "Demanda Avulsa" o prazo máximo para utilizar o serviço deve ser informado no Termo de Encerramento de Projeto (TEP).

Quantidade de horas adquiridas	Prazo Máximo para Utilização dos Serviços
Até 300h	4 meses
Entre 301 e 600h	8 meses
Entre 601 e 1000h	10 meses
Acima de 1000h	12 meses

Importante: O projeto só poderá ser encerrado após a conclusão de todas as etapas descritas acima.

Entradas
Projeto implantado

Saídas
Chamado do financeiro atendido com saldo de horas

Projeto cadastrado no ServiceNow
TEP (Termo de Encerramento do Projeto) com saldo e aprovado pelo cliente.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.49 ☐Registrar lições aprendidas

Descrição

O Analista/Gerente de projetos é responsável por avaliar as ocorrências durante a execução do projeto e registrar as suas observações, sempre dando sugestões de melhorias, seja para incorporar na organização boas práticas usadas no projeto, ou para modificar procedimentos que se manifestaram inadequados durante o projeto.

É recomendado que esta atividade seja executada em conjunto com a equipe do projeto.

As lições aprendidas devem ser registradas na ferramenta Fast Project conforme abaixo:

1 - Acessar Senior X plataform >PMO de Serviços|Gestão de Projetos> Fast:

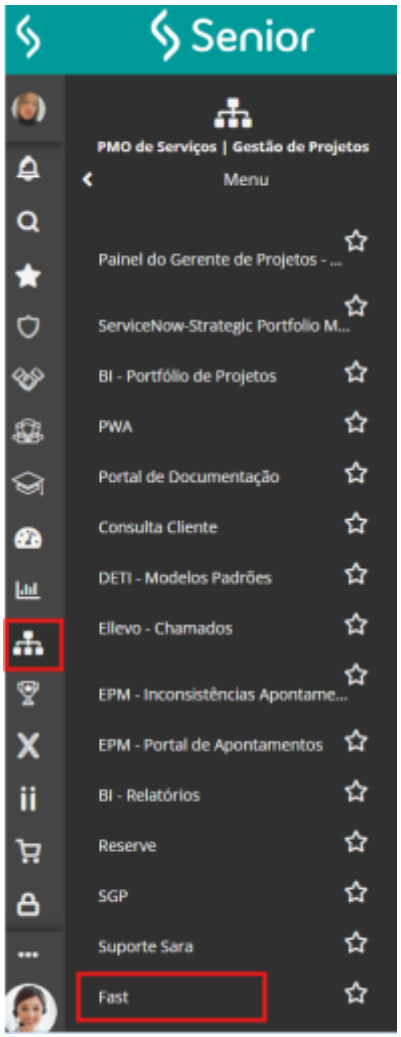

2 -Acessar o Fast Project com o login e senha de rede > Projetos > Filtre o projeto necessário > Project Life:



3 - No Project Life clique em "Registrar Lições Apreendidas":

4 -Lições Aprendidas > preencher as informações > Salvar:

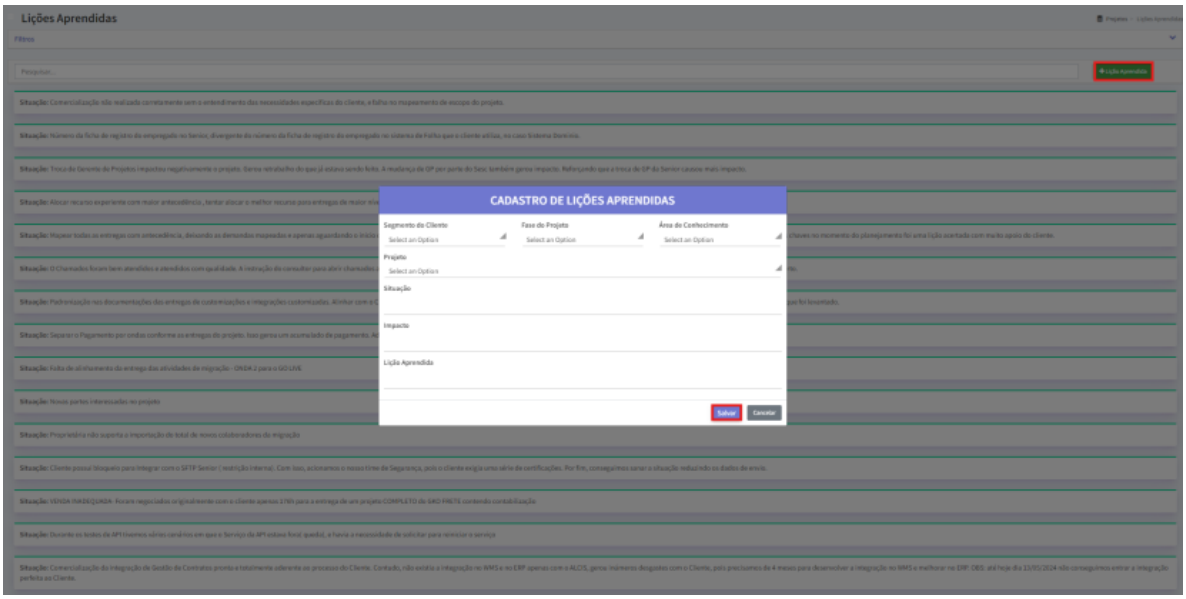

Entradas
Lições aprendidas percebidas ao longo do projeto

Saídas
Registro de lições aprendidas na ferramenta Fast Project

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.50 ☐Encerrar o projeto com o cliente

Descrição
Esta atividade representa a conclusão do projeto de implantação do sistema, abrangendo a totalidade ou apenas módulos específicos que foram implementados conjuntamente.

Nesta fase, a equipe Senior e o cliente verificam se os objetivos e as expectativas definidos no início do projeto foram cumpridos.

É essencial ouvir o feedback do cliente e informá-lo sobre o envio da pesquisa NPS, destacando a importância de sua participação.

Com o encerramento do projeto, a equipe envolvida será desativada. Caso haja continuidade de trabalhos por parte dos consultores da Senior, estes serão realizados como serviços avulsos.

Se a formalização do encerramento do projeto não estiver documentada na DOSP, o gerente de projetos deve elaborar o **Termo de Encerramento do Projeto (TEP)** e solicitar a aprovação do cliente.

O Analista/Gerente de Projetos deve assegurar que toda a documentação gerada esteja arquivada na pasta do projeto no Doc Studio, que todas as atividades estejam concluídas e que o saldo de horas no cronograma seja zerado.

Encerramento administrativo do projeto

O Processo de encerramento administrativo deverá ser realizada após 90 dias da conclusão do projeto.

O processo completo está na IT337- Encerramento Administrativo de Projetos

Entradas
Documento de Oficialização de Sistema em Produção - DOSP
Sistema em produção

Saídas
Comunicado sobre encerramento do projeto para o Cliente

Termo de Encerramento do Projeto - TEP aprovado pelo cliente via Doc Studio (opcional, caso o DOSP contenha o termo de encerramento).

Projeto encerrado ServiceNow.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.51 ☐Cancelar Projeto

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Cancelamento de Projetos: Quando o cliente declina da implantação, o projeto deve ser cancelado na fase em que se encontra. Para proceder, registre a solicitação do cliente, informe o executivo responsável e, se o cancelamento não puder ser evitado, notifique o time de Customer Success. Assegure que todas as horas trabalhadas e entregas sejam registradas e faturadas corretamente. Preencha o novo Artefato "Termo de Cancelamento", deve ser enviado para o time de Auditoria e Governança. Arquive toda a documentação de cancelamento na pasta de monitoramento do projeto no Doc Studio e atualize a situação do projeto no ServiceNow conforme instrução de trabalho.

Importante: Para detalhes de como proceder no cancelamento ou suspensão, verifique a instrução de trabalho: IT280-Solicitar Cancelamento do Projeto (sharepoint.com)

Entradas

Solicitação do cliente para cancelar ou suspender o projeto

Saídas

Projeto cancelado ou suspenso no ServiceNow

Termo de Suspensão do Projeto - TSP ou e-mail de cancelamento aprovado via DOC Studio.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

4.2.1.52 PO044 - Instalação de Soluções Senior

Descrição

Receber do Gerente de Projetos a proprietária do sistema que será implantado.

O Consultor instala o sistema, no ambiente disponibilizado pelo cliente, para testes das proposições e alternativas a serem discutidas na fase de definições da implantação.

A instalação deve seguir o PO-044, utilizando os roteiros de implantação conforme o processo orienta.

Link

PO044-Instalação de Soluções Senior

4.2.1.53 Registrar Demanda de Desenvolvimento

Descrição

As atividades de customização identificadas devem ser conduzidas exclusivamente pela equipe de Desenvolvimento do ERP. Se houver necessidade de alocar o Consultor de Implantação, a equipe será responsável por informar o Analista ou o Gerente de Projetos.

Registrar a demanda de solicitação de desenvolvimento no portal Fast Project, incluindo todas as informações relevantes para orientar o processo técnico. Se houver mais de um desenvolvimento previsto no escopo, deve-se cadastrar uma demanda para cada item de desenvolvimento. Para cada demanda, é necessário indicar a data de conclusão desejada e o total de horas estimadas para a execução. O documento de escopo analítico do projeto deve ser anexado à demanda. Comentários adicionais podem ser inseridos para facilitar a compreensão da necessidade e para alinhamentos complementares.

Importante enfatizar que o prazo para conclusão da customização deve considerar a data planejada para início dos testes integrados do projeto de implantação.

Descrever no campo comentários:

- Data Prevista de GO-LIVE

- Data da Expectativa para entrega da especificação/ entrega estimativa

Para mais detalhes, consulte o processo de alocação descrito na instrução de trabalho: IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

Entradas

Alocar recurso através do Fast Project

Plano de recurso/ação criado e aprovado no ServiceNow

* Informações da Demanda.

* Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP).

Saídas

Desenvolvimento das Customizações

* Registro da demanda no portal Fast Project.

Responsável

Analista/Gerentes de Projetos

4.2.1.54 Processo para Demandas de Customizações

Processo

PO250 - Subprocesso de Desenvolvimento em Projetos de Implantação - Subprocesso de Demandas de Customização/Integração ERP em Projetos de Implantação

4.2.1.55 ATA

Descrição

Ata de Reunião - Inicial

5 PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO ERP X - ATIVAÇÃO

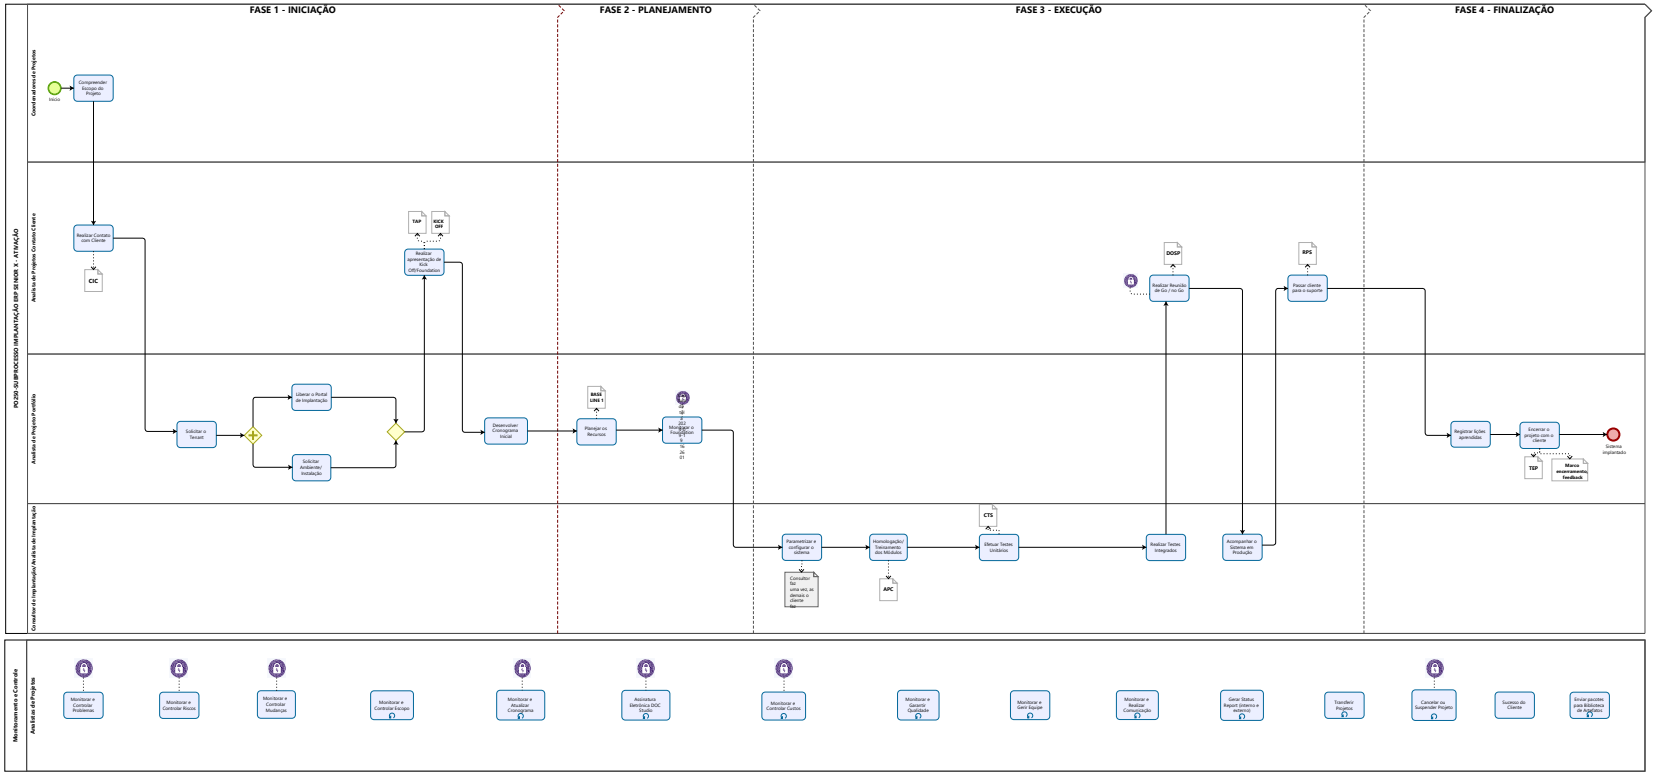

Versão:

1.0

Autor:

PMO

5.1 MONITORAMENTO E CONTROLE

5.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

5.1.1.1 ☐Sucesso do Cliente

Descrição
o Analista de Customer Sucess deve monitorar e controlar mensalmente os projetos estrategicos do ERP Senior X, focado em clientes acima de 30 milhões ou com a mensalidade acima de 5 mil.

Entradas
Necessidade de acompanhar os projetos

Saídas
Acompanhar e monitorar os projetos estrategicos

Responsável

Analista de Customer Sucess

5.1.1.2 ☐Monitorar e Realizar Comunicação

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição
É imprescindível que durante a execução do projeto haja comunicação entre todas as partes interessadas e pessoas envolvidas: cliente, analista/gerente de projetos, coordenador de serviços, consultoria de implantação, produto, suporte e terceiros.

Quando a comunicação é contínua e assertiva significa que existe alinhamento de expectativas e todos estão cientes de suas responsabilidades e sobre o andamento do projeto.

A comunicação facilita negociações, planos de ações e evita desalinhamentos.

Entradas
Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP (quando houver)

Saídas
Status Report

Atas de Reunião

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.3 Monitorar e Gerir Equipe

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Gerenciar a equipe do projeto abrange as seguintes atividades:

• Monitorar o desempenho dos membros da equipe.

• Fornecer feedback aos consultores utilizando o Fast Project (https://fastproject.senior.com.br).

• Manter uma comunicação contínua e assertiva.

• Negociar os interesses do projeto.

• Resolver problemas que surgirem.

• Coordenar mudanças que visem a melhoria do desempenho do projeto.

Caso haja alterações na equipe durante o andamento do projeto, é necessário registrar no **Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)**, se aplicável, e obter a validação do cliente.

Entradas
Equipe do projeto

Saídas
Equipe do projeto atualizada no Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP

Ata ou e-mail de feedback e reuniões de alinhamento

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.4 Monitorar e Controlar Escopo

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição
Analisar a situação do escopo em relação ao previsto no planejamento do projeto, conforme Documento de Escopo Analítico do Projeto - DEAP e identificar os possíveis desvios.

Verificar continuamente a evolução do projeto e a realização das tarefas, tanto o tempo programado vs o executado, quanto a descrição das atividades.

As mudanças de escopo podem afetar as outras áreas do projeto como o tempo, custo, riscos e qualidade, que devem ser analisadas conjuntamente com a equipe do projeto, antes de serem validadas e colocadas em prática.

Se houver alteração de escopo durante o projeto, deve-se formalizar através da change request e gerar uma nova linha de base no cronograma, adicionando novas atividades e modificando os prazos das já existentes, se houver necessidade.

É fundamental acompanhar de perto as customizações em desenvolvimento para o projeto. Apesar de a equipe de Customizados ser responsável pela gestão e execução dessas atividades, cabe ao Analista ou Gerente de Projetos monitorar o progresso e garantir a entrega, atuando em parceria com o time de Customizados.

Para realizar a Change Request, consulte a Instrução de Trabalho: IT264 - Change Request

Entradas
Documento de Escopo Analítico do Projeto -DEAP

Cronograma

Change Request e/ou Ata de Reunião

Saídas
Cronograma do projeto atualizado

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.5 Monitorar e Garantir Qualidade

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Realizar a análise dos entregáveis do projeto, assegurando junto aos times de consultoria e do cliente a qualidade das atividades e das funcionalidades do produto.

Examinar as informações dos Cenários de Teste de Sistema (CTS) e suas evidências, identificando eventuais desvios ou problemas no produto por meio do **BI-CTS eletrônico**.

Envolver os times de Produto e Suporte para corrigir eventuais erros do produto, caso sejam detectados.

Entradas

Entregáveis do projeto

Cenários de Teste de Sistema - CTS

Saídas

Cenários de Teste de Sistema - CTS verificado

Envolvimento dos times de Produto e Suporte, caso sejam identificados erros e/ou problemas

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.6 Monitorar e Controlar Custos

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

As informações financeiras do projeto devem ser atualizadas periodicamente para garantir a precisão do Status Report e do cadastro financeiro. Esta atualização inclui a inserção de dados financeiros relevantes no sistema, revisão das despesas e receitas do projeto, e a geração de relatórios financeiros precisos. Para orientações sobre monitorar e controlar os custos, verificar nas instruções de trabalho abaixo:

- IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

- IT179 - Cronograma ServiceNow (sharepoint.com)

Entradas
Cronograma do projeto

Saídas
Informações financeiras do projeto atualizadas para compor o Status Report e cadastro financeiro

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.7 Gerar Status Report (interno e externo)

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição
Status externo (cliente)

Marcar uma reunião recorrente de apresentação de Status Report com o cliente e as partes interessadas, como parte do plano de comunicação. Preparar e usar o arquivo de apresentação de Status Report na pasta da Torre EAS EAS021 - Status Report Cliente.

No mínimo, um status report regular deve ser gerado no mês. Esse status deve ser direcionado para a equipe do projeto e deve conter as informações atuais sobre o escopo do projeto, prazos, desvios, problemas, riscos, mudanças, custos e evolução do projeto.

Pelo menos uma vez ao mês é obrigatória uma reunião de Status Executivo com o Patrocinador do projeto. É sugerido que nesta reunião seja feito um status diferenciado, com duração em torno de meia hora, focando no progresso do projeto e nas principais *issues* que necessitam da atenção, intervenção ou direcionamento do Patrocinador.

Os riscos devem ser cadastrados no ServiceNow, verificar IT de riscos: IT269 - Gerenciamento de Risco (sharepoint.com)

Os Problemas devem ser cadastrados no Snow, ver IT de Problemas.

Status Executivo interno

Os gerentes devem usar o modelo EAS021 - Status Report Interno usando o Excel Template Status Report Projeto para reportar o status do projeto internamente. O objetivo do reporte é apresentar as informações dos projetos às partes interessadas da Senior, possibilitando o acompanhamento das entregas, tomada de decisões e ações necessárias.

POWER POINT SR Executivo interno

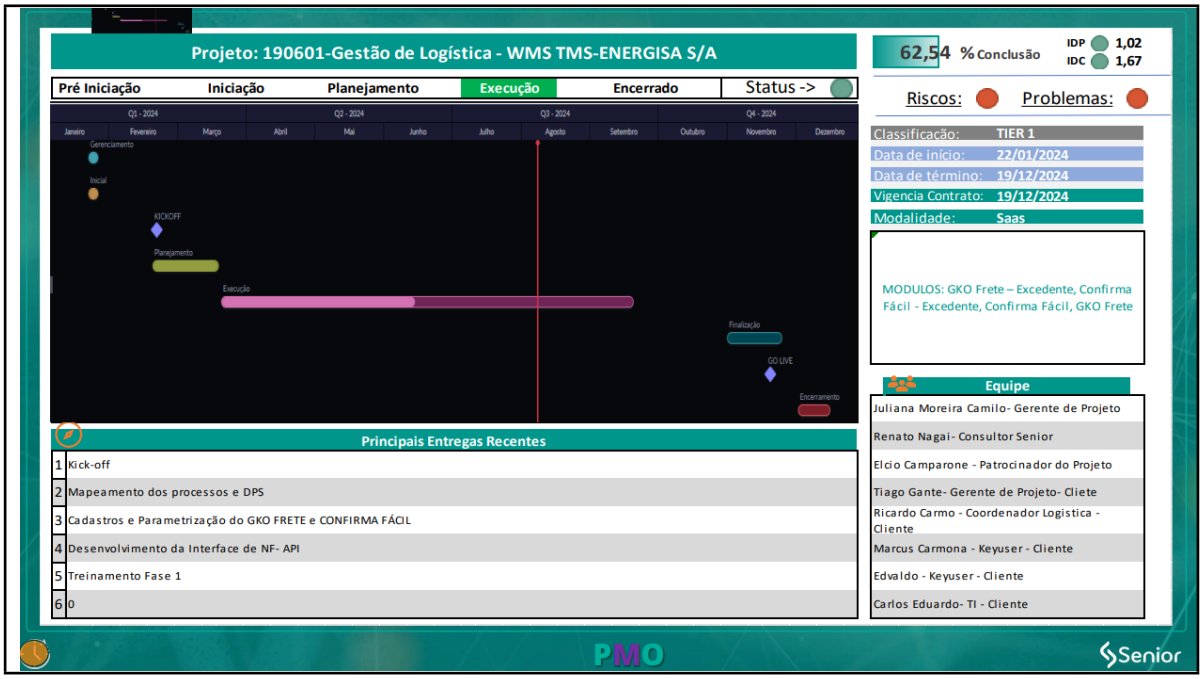

Entradas

-Cronograma atualizado

-Riscos no Snow

-Problemas no Snow

-Entregas do projeto

Saídas

-Status Report Interno ou Cliente

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.8 ☐Transferir Projetos

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

A transferência do projeto acontece para distribuição de demandas na equipe (capacidade), férias ou desligamento de profissionais.

É necessário registrar o momento em que o projeto é transferido entre Analistas/Gerentes de Projetos, evidenciando as entregas e responsabilidades de cada um.

É responsabilidade do Analista/Gerente de Projetos transferidor:

· Preencher o Documento de Transferência do Projeto - DTP, informando a fase, valores financeiros, entregas feitas, pendências e entregas não realizadas (de acordo com a fase), incluindo observações e histórico do projeto.

· Aprovar todas as horas pendentes do projeto na planilha de horas.

· Solicitar aprovações de horas não faturadas para a coordenação, copiando o Gerente de Projeto recebedor, quando necessário.

· Realizar reunião com o cliente o com o GP recebedor, para passagem de bastão das entregas e definição de agendas.

· Deixar o reporte semanal atualizado para o projeto.

É papel do Analista/Gerente de Projetos recebedor:

· Conferir os itens apontados no DTP, conversar com o Gerente de Projetos transferidor, tirar dúvidas e aprovar a transferência. Desta forma, registra que está de acordo com o que foi relatado, tem ciência das entregas do projeto e as pendências que serão assumidas.

· Continuar as ações previstas pela antiga gestão.

· Participar da reunião com o Gerente de Projeto transferidor e o cliente, se apresentando como o novo gerente de projetos.

Quando o profissional anterior não estiver mais na empresa, a transferência deverá ser efetuada e formalizada com o coordenador de projetos.

Entradas

Necessidade de substituição do Analista/Gerente de Projetos

Saídas

Documento de Transferência de Projetos - DTP

Documento de Transferência de Projetos - DTP - Férias

Responsável

Analista de Projetos e Coordenador

5.1.1.9 Monitorar e Atualizar Cronograma

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Para controlar e monitorar um cronograma de forma eficaz, é essencial seguir uma série de passos estruturados que garantem o acompanhamento adequado das atividades planejadas e a identificação precoce de desvios. Aqui estão as principais ações que devem ser realizadas:

1. **Definição Clara do Cronograma**: Certifique-se de que o cronograma está bem definido, com atividades detalhadas, marcos, responsáveis, prazos e dependências claramente estabelecidos. A clareza desde o início é fundamental para um bom controle.

2. **Atualização Regular do Cronograma**: Realize atualizações periódicas para refletir o progresso real das atividades. Isso pode ser feito semanalmente ou de acordo com o ciclo de relatórios do projeto.

3. **Reuniões de Status**: Conduza reuniões regulares de status report com a equipe do projeto para discutir o progresso, identificar obstáculos e planejar ações corretivas.

4. **Gestão de Riscos e Mudanças**: Monitore os riscos e gerencie as solicitações de mudanças que possam impactar o cronograma. Avalie o impacto das mudanças antes de aprová-las, ajustando o cronograma conforme necessário.

5. **Revisão e Aprendizado Contínuo**: Periodicamente, reveja o cronograma e o processo de controle para identificar lições aprendidas e melhorias que podem ser aplicadas em projetos futuros.

6. **Baseline:** Toda alteração de escopo, custo ou prazo requer o replanejamento da data de Go Live no cronograma. Para isso, é necessário solicitar a aprovação do cliente no DOC Studio.

Para mais detalhes, consulte a Instrução de Trabalho: Instrução de Trabalho: IT179 - Cronograma ServiceNow (sharepoint.com)

Entradas

Documento de Escopo Analítico do Projeto - DEAP

Documento change Resquest ou Ata de Reunião-

Saídas

Cronograma do projeto atualizado

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.10 Assinatura Eletrônica DOC Studio

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Este processo permite que o responsável receba e assine documentos eletronicamente, com a opção de enviar uma cópia assinada. O documento é enviado por e-mail, podendo ser visualizado no GED/DOC Studio, disponível na Senior X Platform.

Funcionalidades do GED/DOC Studio:

· Carregar documentos no DOC Studio

· Configurar permissões para Consultores

· Enviar documentos para assinatura

· Receber e Assinar documentos Eletronicamente

Para mais detalhes, consulte a Instrução de Trabalho: IT270-Assinatura Eletrônica (sharepoint.com)

Entradas

Documentação do projeto pronta para carregar no Doc Studio;
Pasta no Doc Studio para compartilhar com consultor;

Documentos do projeto que necessitam de assinatura eletrônica carregados no Doc Studio;

Documentos do projeto para assinar e/ou assinados.

Saídas

Documentos salvos no Doc Studio;

Pasta no Doc Studio compartilhada;

Solicitação de assinatura eletrônica enviadas por e-mail;
Assinaturas dos documentos monitoradas.

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.11 ☐Enviar pacotes para Biblioteca de Artefatos

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Para enviar pacotes de customizações ERP desenvolvidos para Biblioteca de Serviços:

Preencher o template > enviar para biblioteca.servicos@senior.com.br.

Para reutilizar os serviços:

1- Acessar a BIBLIOTECA DE CUSTOMIZAÇÃO e HISTÓRICO REAPROVEITAMENTO - CUSTOMIZAÇÕES localizar o pacote;

2- Caso não tenha os artefatos na biblioteca, você pode utilizar a estimativa cadastrada para o determinado pacote;

3- Se tiver os artefatos na biblioteca, baixar todos artefatos e entregar o recurso para (consultor ou desenvolvedor) que irá adaptar a solução;

4- Ao encerrar a adaptação da customização, coletar artefatos e estimativa utilizada, para análise e calibragem;

5 - Caso houver ajuste no pacote ou na estimativa, notificar o time de manutenção da biblioteca de serviços (biblioteca.servicos@senior.com.br).

Para localizar pacotes na biblioteca:

Você pode filtrar por palavras chaves na funcionalidade de "pesquisa" do SharePoint:

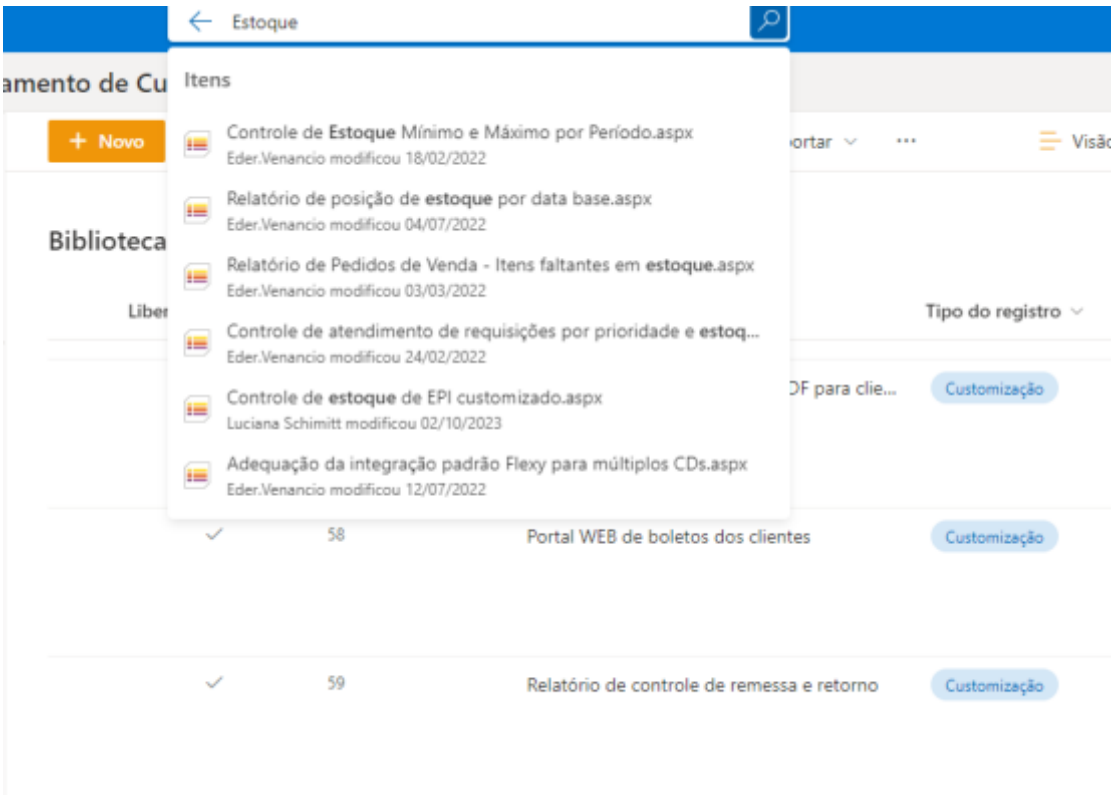

Entradas
Especificação Funcional

DPS's.

Saídas
Especificação Funcional na Biblioteca de artefatos

DPS's na Biblioteca de artefatos.

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.12 ☐Monitorar e Controlar Mudanças

Descrição
Qualquer alteração de serviço que divergir do inicialmente acordado e contratado deve ser formalizada pelo Gerente de Projetos por meio da funcionalidade "Solicitar Mudança" no ServiceNow, disponível na lista relacionada ao Projeto. Após identificar a necessidade de mudança, o Gerente de Projetos, em conjunto com o cliente, avaliará e providenciará a execução da alteração durante o andamento do projeto. Existem três tipos de Change Request:

Alterações com Custo: Alterações com custo referem-se a quaisquer modificações no projeto que resultem em custos adicionais ao cliente, gerando uma nova fatura.

Alterações sem Custo: Alterações sem custo referem-se a modificações no projeto que não resultam em custos adicionais ao cliente. Estas mudanças são realizadas dentro do escopo e dos recursos já acordados na proposta inicial, sem a necessidade de gerar uma nova fatura.

Horas Não Faturadas / Transferência de Custo: Horas não faturadas ou transferência de custo referem-se a situações onde há um aumento no escopo do projeto sem que isso resulte em custos adicionais ao cliente, sem geração de nova fatura.

Abaixo seguem orientações explícitas que devem ser obrigatoriamente seguidas para a alteração da data de Go Live dos projetos da Torre ERP, considerando a gravidade e a importância desta definição:

1. Solicitação Inicial de Mudança de Data

- Quando o **Gerente de Projeto** identificar a necessidade de alteração da data de Go Live (seja por iniciativa própria ou por solicitação do cliente):
  - **É obrigatório** obter aprovação prévia do **Coordenador da Torre** antes de comunicar qualquer alteração ao cliente.
  - Apenas **após aprovação do Coordenador**, o Gerente de Projeto poderá:
    - Informar o cliente sobre a alteração;
    - Formalizar a nova data de Go Live.

2. A partir da Segunda Solicitação de Mudança de Go Live

- Quando já houver uma alteração de Go Live aprovada anteriormente, e surgir uma **nova necessidade de mudança**:
  - A solicitação deve ser **avaliada e aprovada** por:
    - **Coordenador da Torre**;
    - **Gerente da Torre**.
  - Ambos deverão discutir e avaliar **alternativas para evitar nova postergação**.
  - Apenas **com a aprovação conjunta**, o Gerente de Projeto poderá:
    - Comunicar o cliente;
    - Formalizar a nova data de Go Live.

3. Aprovação do Patrocinador do Projeto

- Em **todas as situações** de repactuação da data de Go Live:
    - O **Patrocinador do Projeto** deve ser:
        - **Comunicado previamente**;
        - Emitir uma **aprovação explícita** da nova data.
        - Formalizar através de ata.

Instrução de Trabalho: IT264 - Change Request (sharepoint.com)

Entradas
ATA de reunião;
Change Request aprovado pelo cliente via DOC Studio

Saídas
Change Request aprovado pelo cliente via DOC Studio.

Cronograma do projeto atualizado.

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.13 ☐ Monitorar e Controlar Riscos

Descrição
Ao longo do projeto, os riscos precisam ser monitorados e gerenciados continuamente. Quando um novo risco for identificado, deve-se avaliar tanto a probabilidade quanto a gravidade potencial, caso ele se concretize. Após essa avaliação, é essencial estabelecer uma estratégia para gerenciar o risco. O risco deve ser registrado no ServiceNow.

Para mais detalhes, consulte a Instrução de Trabalho: IT269 - Gerenciamento de Risco (sharepoint.com)

Entradas
Riscos identificados.

Saídas
Riscos cadastrado no ServiceNow;
RIscos encerrados.

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.14 ☐Monitorar e Controlar Problemas

Descrição

De modo geral, um problema é um obstáculo que impede a concretização de um objetivo. Pode ser algo que gera dificuldade e representa uma situação que demanda uma solução. Problemas podem surgir ao longo de um projeto e, para serem devidamente resolvidos, precisam ser registrados, comunicados, monitorados e acompanhados. Para o registro de problemas, o Analista ou Gerente de Projetos deve utilizar o ServiceNow.

Para mais informações, consulte a Instrução de Trabalho: IT275 - Processo Gerenciamento do Problemas

Entradas

Problema identificado no projeto.

Saídas

Registro do problema no ServiceNow

Responsável

Analista de Projetos

5.1.1.15 ☐Cancelar ou Suspender Projeto

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Cancelamento de Projetos: Quando o cliente declina da implantação, o projeto deve ser cancelado na fase em que se encontra. Para proceder, registre a solicitação do cliente, informe o executivo responsável e, se o cancelamento não puder ser evitado, notifique o time de Customer Success. Assegure que todas as horas trabalhadas e entregas sejam registradas e faturadas corretamente. Arquive toda a documentação de cancelamento na pasta de monitoramento do projeto no Doc Studio e atualize a situação do projeto no ServiceNow conforme instrução de trabalho.

Suspensão de Projetos: Caso o cliente solicite a suspensão ou não retorne os contatos, suspenda o projeto. Preencha e obtenha a assinatura do Termo de Suspensão do Projeto (TSP). Atualize a situação no ServiceNow, informe a coordenação e gerencie a reativação com a mesma.

Importante: Para detalhes de como proceder no cancelamento ou suspensão, verifique a instrução de trabalho: IT280-Solicitar Cancelamento do Projeto (sharepoint.com)

Entradas
Solicitação do cliente para cancelar ou suspender o projeto

Saídas
Projeto cancelado ou suspenso no ServiceNow

Termo de Suspensão do Projeto - TSP ou e-mail de cancelamento aprovado via Doc Studio

Responsável

Analistas de Projetos

5.2 PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO ERP SENIOR X - ATIVAÇÃO

Orientações Gerais

Entradas

Saídas

Treinamentos disponibilizados na UCS

5.2.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

5.2.1.1 ☐Realizar Contato com Cliente

Descrição

O contato inicial com o cliente tem como objetivo informá-lo brevemente que a sua demanda foi recebida na área de Serviços, formalizando assim, a transição de pedido comercial para projeto. Este Contato deve ser realizado pelo ServiceNow, conforme instrução de trabalho: IT260 - Processo Contato Inicial (sharepoint.com)

Importante: Esta ação deve ser realizada em até 3 dias úteis a partir do recebimento do projeto.

Entradas
Projeto em nome do Analista/Gerente de Projetos e situação Ativo na ferramenta ServiceNow

Saídas
· Contato Inicial com Cliente

· CIC arquivado no Doc Studio/ServiceNow

Responsável

Analista de Projetos de Portfólio

5.2.1.2 ☐ Solicitar o Tenant

Descrição
De acordo com as necessidades do cliente, é necessário criar ou solicitar um Tenant, conforme a instrução de trabalho: IT263 - Solicitar o Tenant (sharepoint.com)

Entradas
Informações do cliente.

Saídas
Tenant Admin do cliente disponibilizado e e-mail salvo na pasta do DOC Studio.

Responsável

Analista de Projetos de Portfólio

5.2.1.3 ☐Liberar o Portal de Implantação

Descrição

Para que o cliente tenha acesso aos Documentos de Processo e Sistemas (DPS), Questionários Eletrônicos, Cenários de Testes e Foundation (ERP), deve ser solicitada a criação do **Portal de Implantação** no **Fast Project,** conforme as instruções de trabalho: IT265 - Portal de Implantação (sharepoint.com)

Entradas

Dados de acesso do administrador do tenant.

Saídas

Portal de Implantação liberado e configurado.

Responsável

Analista de Projetos de Portfólio

5.2.1.4 ☐Solicitar Ambiente/ Instalação

Descrição

Para solicitar o ambiente e/ou instalação tanto para On Premises (CDU) ou Cloud (Saas) é necessário registrar a demanda no Fast Project, conforme instrução de Trabalho: IT266 - Processo para Solicitar Ambiente e Instalação (sharepoint.com)

Importante: Para demandas On Premises (CDU), o time responsável para alocar Consultor de TI é a Administração de Serviços, enquanto para solicitações Cloud (SaaS), o time responsável é o IT Services. Ambas as solicitações devem ser feitas pelo Fast Project.

Entradas

Solicitação do ambiente através do Fast Project.

Saídas

RAS - Relatório de Atendimento de Serviços (não há RAS para soluções G7/Ronda Senior X) disponível no DOC Studio;

Documento Dados Ambiente aprovado pelo Analista/Gerente de Projeto via DOC Studio;

Responsável

Analista de Projetos de Portfólio

5.2.1.5 ☐Realizar apresentação de Kick Off/Foundation

Descrição

Na reunião de Kickoff é necessário alinhar todo o escopo contratado, apresentar a metodologia de implantação, reforçar a importância do envolvimento, comprometimento e engajamento do time do projeto, reforçar todas as premissas alinhadas no inicio do projeto, apresentar o time do projeto, papeis e responsabilidades e também o plano de comunicação.

Durante essa reunião, o Analista deve explicar também o objetivo do Foundation, acessar a Plataforma X em conjunto com o cliente e orientar sobre os dados que devem ser obrigatoriamente preenchidos. Também é necessário alinhar uma data para a entrega dessas informações.

Após a reunião, o Analista ou Gerente de Projetos deve acompanhar o preenchimento dos dados pelo cliente, assegurando a conclusão dessa etapa. Uma vez finalizado o preenchimento, a equipe do Foundation dará sequência ao processo automaticamente.

Entendimento do processo Foundation

É importante disponibilizar o material apresentado na reunião para o cliente, sendo assim, anexar no DOC Studio o e-mail enviado ao cliente com **Apresentação de Kick Off - AKO.**

Observação: Para projetos mais complexos ou conforme o Analista ou Gerente de Projetos avaliar a necessidade de acordo com o cliente, uma reunião inicial pode ser realizada antes do Kick Off.

Entradas

DEAP Validada;

TAP;

Cronograma Macro.

Saídas

PPT de apresentação de Kick Off;

E-mail enviado ao cliente com apresentação do Kick Off arquivado no Doc Studio; Foundation

Planejar e controlar riscos.

Responsável

Analistas de Projetos de Porfólio

5.2.1.6 Desenvolver Cronograma Inicial

Descrição

O cronograma inicial do projeto pode ser criado a partir dos cronogramas padrões de cada solução Senior, podendo ser adaptado ou ajustado conforme necessidade do projeto (exemplo: remover os módulos não adquiridos pelo cliente, agrupamento de tarefas etc.).

É obrigatório que nesse momento o Analista de Projetos elabore um cronograma completo do projeto. Mesmo que que não haja a completa certeza dos recursos que realizarão as atividades, é preciso realizar a distribuição das horas por fase da metodologia e também considerando as informações da DEAP (Documento de Escopo Analítico do Projeto).

O cronograma inicial será a linha base e de referência. O baseline será salvo quando submeter o projeto para fase de Planejamento.

- Submeter o projeto para a fase de planejamento e a primeira linha de base será salva de forma automática:

- Mensagem Finalizando primeira fase do projeto com linha de base salva:

Horas de reserva e contingência

É indicado realizar a reserva de horas de contingência no projeto, para uso em caso de emergência com o sugerido de 10% das horas totais.

As horas de reserva de contingência devem ser incluídas no cronograma, quebrando as atividades por tipo de recurso.

Importante que estas atividades possuam como data final a mesma data da atividade de TEP, pois desta forma não terá interferência na apuração de indicadores.

Caso seja necessário utilizar a reserva de contingência, somente precisará atualizar o cronograma acrescentando as horas na tarefa correta e subtrair as horas da tarefa de contingencia.

Importante: O cronograma inicial será considerado como a primeira linha de base, conforme o escopo do projeto. Essa primeira baseline corresponde ao cronograma macro e não necessita da aprovação do cliente.

Instrução de Trabalho: IT179 - Cronograma ServiceNow (sharepoint.com)

Entradas
Documento de Escopo Analítico do Projeto - DEAP

- TAP

Saídas
Cronograma criado

1º baseline salva

Responsável

Analista de Projetos de Portfólio

5.2.1.7 ☐Monitorar o Foundation

Descrição
O Analista de Projetos deverá monitorar o andamento do Foundation e orientar em caso de dúvidas do cliente.

Entradas
Realizar reunião de Kick Off
Planejar os recursos

Saídas
Acompanhar o Foundation

Responsável

Analista de Projetos de Portfólio

5.2.1.8 ☐Homologação/Treinamento dos Módulos

Descrição
Orientar e prestar suporte aos usuários-chave do cliente durante a fase de homologação do sistema. Em caso de dúvidao Consultor/Analista de Implatanção marca agenda com o cliente.

É necessário monitorar a performance da solução em operação, considerando um volume transacional significativo, para identificar eventuais problemas de lentidão na aplicação ou na infraestrutura.

Com base na homologação, verificar se as entregas da solução atendem ao escopo definido, se há presença de erros e se os usuários assimilaram o uso das rotinas.

Entradas
Sistema parametrizado conforme especificações

Saídas
Apostila

Responsável

Consultor/Analista de Implantação

5.2.1.9 ☐Acompanhar o Sistema em Produção

Descrição
O consultor de implantação será responsável por monitorar a operação do sistema em produção, conforme o período acordado entre o cliente e o gerente de projetos (ou conforme definido na proposta/DEAP), a partir da data de Go Live. Esse acompanhamento deverá estar previsto no cronograma, com as respectivas horas alocadas.

O acompanhamento poderá ser realizado presencialmente ou remotamente, dependendo da complexidade do cliente e do que foi acordado previamente.

Durante o acompanhamento, o consultor de implantação verificará a execução das rotinas do sistema e monitorará a performance da operação.

Se necessário, o consultor oferecerá suporte ao usuário-chave em caso de dúvidas, realizará treinamentos adicionais e, se surgirem problemas, envolverá as pessoas adequadas para a solução.

Registros de reuniões (atas) e documentos recebidos do cliente durante esse período serão considerados registros de acompanhamento.

Observação: O suporte estará disponível ao cliente a partir da data de alteração da situação do contrato no ERP. Recomenda-se negociar com o cliente que, durante o período de acompanhamento, qualquer erro ou problema seja tratado dentro do projeto.

Entradas
Sistema operando em produção

Saídas
Monitoramento do sistema em produção

Responsável

Consultor/Analista de Implantação

5.2.1.10 ☐Compreender Escopo do Projeto

Descrição
Antes de designar um Analista ou Gerente de Projetos, o Coordenador deve compreender detalhadamente a solução vendida ao cliente. Isso inclui as premissas da implantação, as negociações realizadas, e a identificação das informações técnicas da venda e do cliente. É necessário verificar se há outros projetos em andamento nesse cliente, seja do mesmo produto ou de produtos diferentes, e mapear essas informações para informar ao Analista ou Gerente de Projetos, garantindo os devidos cuidados de integração. Além disso, deve-se consultar o CS para verificar o histórico do cliente (passado, atual, e se é um caso de revitalização).

Os documentos comerciais que auxiliam nesse entendimento são:

· **Proposta Comercial/Edital**

· **Folha de Rosto - Pedido**

· **Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP)**: Realizar uma análise prévia do DEAP, comparando o escopo com as horas estimadas.

Entradas
Documentos comercias disponíveis no ServiceNow.

Saídas
Definição do Analista/Gerente de Projetos e alocação nas ferramentas.

Responsável

Coordenador de Projetos

5.2.1.11 ☐ Planejar os Recursos

Descrição
Caso os recursos alocados na Fase 1 não possam ser utilizados na Fase 2, será necessário replanejá-los. Para efetivar essa alocação, tanto de colaboradores CLT quanto de prestadores de serviço PJ, é imprescindível observar as diretrizes estabelecidas na Instrução de Trabalho - IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

Entradas
Ata de Reunião Inicial

Termo de Abertura do Projeto - TAP

Saídas
Agenda solicitada na ferramenta FAST

Plano de recurso/ação aprovado no ServiceNow

Responsável

Analista de Projetos de Portfólio

5.2.1.12 ☐Parametrizar e configurar o sistema

Descrição
Esta atividade consiste em parametrizar/configurar/cadastrar dados no sistema com base nas definições da fase 2, conforme Documento de Processo e Sistema - DPS.

O trabalho é desenvolvido pelos consultores e os usuários-chave devem ser envolvidos. Desta maneira, o consultor deverá realizar o primeiro cadastro e/ou parametrização de uma rotina e ensinar o usuário-chave, para que ele faça os demais, como no caso no cadastro de empresas e colaboradores. Assim, o trabalho é compartilhado e os usuários-chaves iniciam o processo de capacitação.

Entradas
Documento de Processo e Sistema - DPS

Cronograma

Roteiros de implantação (quando aplicável) Solicitação de Alocação de Recursos

Saídas
Sistema parametrizado conforme especificações

Responsável

Consultor/Analista de Implantação

5.2.1.13 ☐Efetuar Testes Unitários

Descrição

A validação das parametrizações, cadastros e/ou dados importados deverá ser realizada primeiramente pelo consultor e posteriormente pelos usuários-chave, assim, se houver erros ou problemas, o consultor poderá ajustar antes que o usuário-chave faça as verificações.

O consultor/analista de implantação deve promover os testes necessários para garantir o bom funcionamento do sistema que está sendo implantado. Todos os itens listados nos Documentos de Processo e Sistema - DPS, serão testados através do CTS, inclusive as customizações desenvolvidas (quando houver).

Caso ocorra alguma inconsistência no produto padrão, o consultor de implantação deve acionar o time de suporte da Senior para que o item apontado seja corrigido, todas as inconsistências devem ser tratadas antes do cliente realizar os testes integrados.

Assim que os testes forem concluídos com sucesso, todos os documentos devem ser gerados para o DOC Studio e devem ser submetidos para aprovação eletrônica pelo consultor e cliente.

Entradas

Sistema parametrizado conforme especificações;

Customização desenvolvida.

Saídas

Cenário de Testes de Sistema - CTS validado pelo usuário-chave, armazenado no Doc Studio.

Responsável

Consultor/Analista de Implantação

5.2.1.14 ☐ Realizar Testes Integrados

Descrição

Esta atividade consiste na execução dos testes integrados entre todos os módulos do sistema.

A realização dos testes integrados é um processo conduzido pelo Gerente do Projeto e pelos Consultores de Implantação, no entanto, a responsabilidade pela execução é do Cliente e de seus Usuários. Os testes a serem realizados estão listados na Planilha de Testes Integrados, devem ser sequenciados, conduzidos e registrados neste documento, que servirá como base de consulta e tomada de decisão durante todo o processo.

Na realização dos testes integrados, o usuário-chave tem as seguintes responsabilidades:

- Capacitar os usuários finais para realização dos testes.

- Apoiar na construção dos testes integrados, garantindo que todas as rotinas do negócio sejam mapeadas e testadas.

- Seguir os cenários de teste conforme descrito nos Planilha de Testes Integrados e anotar o resultado.

- Gerar evidências, como capturas de tela, nos Cenários de Testes de Sistema, para que o analista ou gerente de projetos possa armazená-las nas evidências do projeto.

- Evidenciar para os consultores os processos que não tiveram o efeito esperado.

- Interagir com as demais áreas para encontrar soluções e melhorar a fluidez dos testes integrados.

Após a realização dos testes integrados, o Analista deve evidenciar os resultados obtidos para o Cliente, de modo que esta informação servirá como base de decisão para entrada em produção ou para a repetição dos testes integrados.

Ao final dos testes integrados, o Gerente do projeto deve gerar uma evidência onde o cliente concorda que realizou com sucesso testes integrados que contemplam todas suas operações de negócio, garantindo que todos os cenários de sistema necessários foram testados. O Gerente de Projetos deve registrar ainda junto ao cliente qual o percentual de sucesso que foi atingido nos testes integrados, e também obter o consentimento de que os cenários de teste foram elaborados e formulados pelo próprio cliente

Entradas

Módulos parametrizados.

Customizações validadas.

Treinamentos realizados pelo consultor ou EAD

Saídas
Testes de integração validados pelo usuário-chave nos Cenários de Testes de Sistema - CTS com aprovação arquivada na pasta do projeto no Doc Studio

Responsável

Consultor/Analista de Implantação

5.2.1.15 ☐Realizar Reunião de Go / no Go

Descrição
A reunião de GO/NO GO é um momento chave do projeto, onde será realizada a formalização da conclusão do processo de parametrização e homologação da solução, bem como o alinhamento para a entrada em produção. Esta reunião deve ser realizada com no mínimo uma semana antes da data prevista do Go Live, e deve envolver o Gerente de Projetos do cliente, o Patrocinador, os Usuários Chave, o Analista de Projetos e os Consultores envolvidos. A presença do Patrocinador é obrigatória e indispensável, e a reunião deverá ser remarcada até que ele possa participar. Esta reunião deverá ser obrigatoriamente gravada.

IMPORTANTE: Caso o Analista entenda que haverá divergência entre as partes na Reunião de GO/NO GO, onde o Cliente deseja fazer o Go Live mas a equipe do projeto não está segura, a presença do Gerente da Torre e da Coordenação será obrigatória nesta reunião, de modo que seja tomada e documentada uma decisão corporativa a respeito.

A reunião de GO/NO GO resulta no preenchimento da DOSP. Importante destacar que o texto padrão desse documento deve ser adequado à realidade do projeto, e deve obrigatoriamente conter:

- Pendências e restrições.

- Cenário de testes e testes faltantes.

- Riscos identificados e estratégias de tratamento.

- Impactos identificados.

Após finalizado o texto da DOSP, esse documento deve ser obrigatoriamente assinado pelo Patrocinador através do DOC Studio.

Como registro formal desta reunião, o Gerente do Projeto deve armazenar a gravação, e em seguida formar uma ata onde constam todos os aspectos discutidos na reunião. Essa ata e os materiais apresentados devem ser enviados em formato PDF para todo o time do projeto e para o Comitê Executivo.

Após assinatura do Patrocinador, a DOSP deve ser encaminhada ao e-mail dosp@senior.com.br, para que a Gestão de Faturamento faça a liberação de pagamento de ATST (quando alinhado em proposta). Com o retorno da Gestão do faturamento, é alterado no sistema ERP a situação do cliente para dar início ao atendimento de suporte.

Entradas

-Plano de Entrada em Produção – PEP

-Reunião de Go/No-Go

Saídas

-Documento de Oficialização de Sistema em Produção- DOSP aprovado

-Cronograma das atividades para entrada em produção validado

-Atualização Registro Riscos

-email dosp@senior.com.br

Responsável

Analista/Gerente de Projetos/Especialista ERP Senior X

5.2.1.16 ☐ Passar cliente para o suporte

Descrição

Após a liberação do suporte ERP pelo time de faturamento e o envio da DOSP, é necessário formalizar junto ao Suporte Técnico a documentação relacionada ao projeto e ao cliente. Seguem as instruções:

Suporte Senior/Unidade de Negócio:

1- Preencher o formulário [Repasse do Cliente para o Suporte - ERP Padrão ou GO UP (revisão 3.0).docx]() disponível no SharePoint. Lembrando que a recomendação é preencher o formulário ao longo do projeto para que o trabalho não se acumule ao final do projeto.

2- Enviar formulário preenchido em formato Word para o Contact Owner do ERP, conforme orientações disponíveis no Portal de Documentação, no link a seguir (https://documentacao.senior.com.br/guia-do-suporte.htm). Após a leitura e análise da documentação, o responsável pela análise vai solicitar as correções necessárias. Quando o documento for concluído, o Time de Suporte disponibilizará horários para uma agenda de boas-vindas ao cliente, que deverá ser marcada, acompanhada e gravada pelo Gerente de Projetos. O SLA para resposta do Time de Suporte é de 7 dias.

3- Abrir chamado na Sara Corporativa para criação do Usuário Master, conforme passo a passo abaixo:

4- Pesquisar "Zendesk" e selecionar a opção "Cadastrar usuário para acessar o Zendesk" e selecionar "Usuário Master"



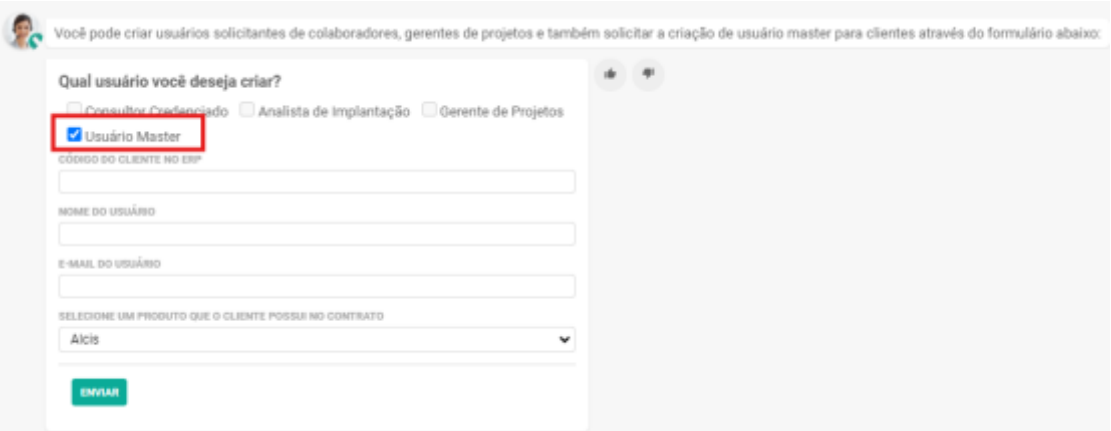

6- Após o chamado e criado BPM para coordenador do produto do cliente;

7- Arquivar o e-mail enviado ao suporte com documento anexo no DOC Studio na pasta Repasse ao Suporte.

Suporte Canal:

· Enviar e-mail ao contato responsável no Canal, comunicando a entrada do sistema em produção com os dados do cliente para suporte, baseando-se nas informações do formulário acima, utilizado para o suporte da Senior.

Notas:

· A comunicação ao suporte deverá ocorrer no prazo de até 7 dias a partir da assinatura do DOSP.

· Se houver chamados pendentes no final da implantação, deve-se transferi-los para o cliente conforme abaixo:

· Suporte realizado pela Senior: deve-se providenciar para que o solicitante seja alterado para o responsável pelo suporte no cliente.

· Suporte realizado pelo Canal de Distribuição: deve-se providenciar para que o solicitante seja alterado para o responsável pelo suporte do cliente credenciado no Canal, pois os chamados de clientes atendidos pelo suporte do canal devem ser abertos usando o canal de distribuição como cliente e como cliente representado, o próprio cliente.

Entradas
-Documento de Oficialização de Sistema em Produção - DOSP aprovado via Doc Studio
-Sistema em Produção

Saídas

-Handover enviado via ServiceNow
-Registro do Ticket no ZenDesk
-Reunião de repasse com a equipe de suporte

Responsável

Analistas de Projetos de Porfólio

5.2.1.17 ☐Registrar lições aprendidas

Descrição

O Analista/Gerente de projetos é responsável por avaliar as ocorrências durante a execução do projeto e registrar as suas observações, sempre dando sugestões de melhorias, seja para incorporar na organização boas práticas usadas no projeto, ou para modificar procedimentos que se manifestaram inadequados durante o projeto.

É recomendado que esta atividade seja executada em conjunto com a equipe do projeto.

As lições aprendidas devem ser registradas na ferramenta Fast Project conforme abaixo:

1 - Acessar Senior X plataform >PMO de Serviços|Gestão de Projetos> Fast:

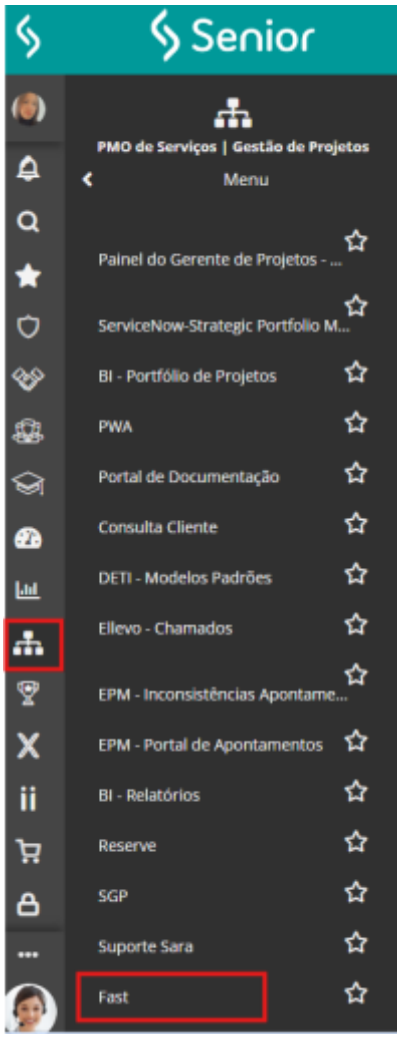

2 -Acessar o Fast Project com o login e senha de rede > Projetos > Filtre o projeto necessário > Project Life:



3 - No Project Life clique em "Registrar Lições Apreendidas":

4 -Lições Aprendidas > preencher as informações > Salvar:

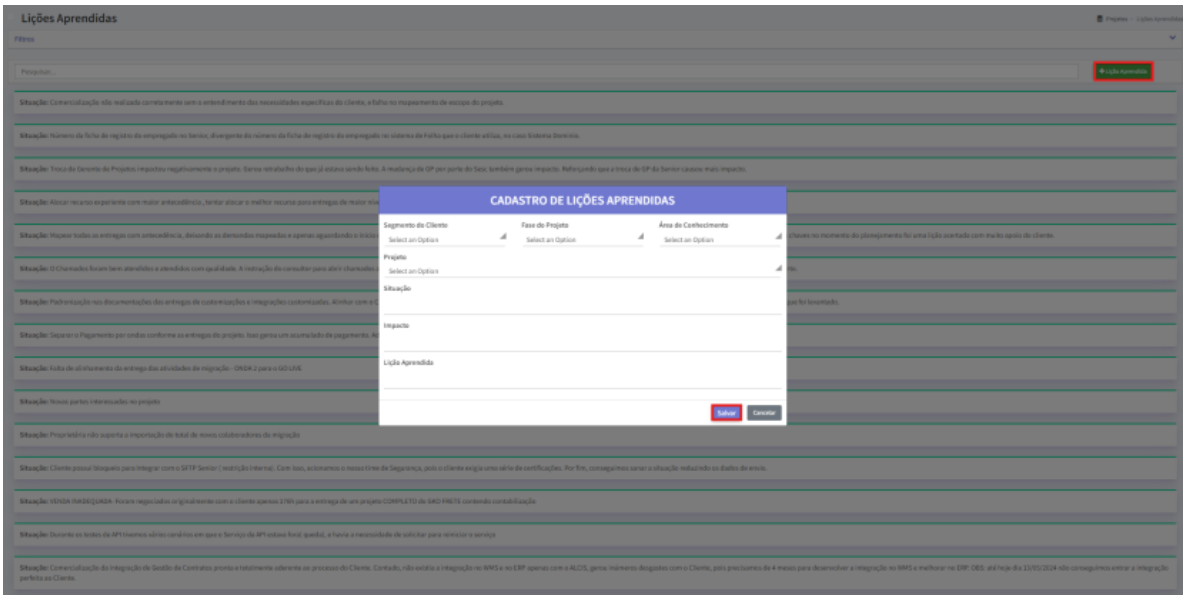

Entradas
Lições aprendidas percebidas ao longo do projeto

Saídas
Registro de lições aprendidas na ferramenta Fast Project

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

5.2.1.18 ☐Encerrar o projeto com o cliente

Descrição
Esta atividade representa a conclusão do projeto de implantação do sistema, abrangendo a totalidade ou apenas módulos específicos que foram implementados conjuntamente.

Nesta fase, a equipe Senior e o cliente verificam se os objetivos e as expectativas definidos no início do projeto foram cumpridos.

É essencial ouvir o feedback do cliente e informá-lo sobre o envio da pesquisa NPS, destacando a importância de sua participação.

Com o encerramento do projeto, a equipe envolvida será desativada. Caso haja continuidade de trabalhos por parte dos consultores da Senior, estes serão realizados como serviços avulsos.

Se a formalização do encerramento do projeto não estiver documentada na DOSP, o gerente de projetos deve elaborar o **Termo de Encerramento do Projeto (TEP)** e solicitar a aprovação do cliente.

O Analista/Gerente de Projetos deve assegurar que toda a documentação gerada esteja arquivada na pasta do projeto no Doc Studio, que todas as atividades estejam concluídas e que o saldo de horas no cronograma seja zerado.

Encerramento administrativo do projeto

O Processo de encerramento administrativo deverá ser realizada após 90 dias da conclusão do projeto.

O processo completo está na IT337- Encerramento Administrativo de Projetos

Entradas
Documento de Oficialização de Sistema em Produção - DOSP
Sistema em produção

Saídas
Comunicado sobre encerramento do projeto para o Cliente

Termo de Encerramento do Projeto - TEP aprovado pelo cliente via Doc Studio (opcional, caso o DOSP contenha o termo de encerramento).

Projeto encerrado ServiceNow.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

6 PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO ERP X - IMPLANTAÇÃO

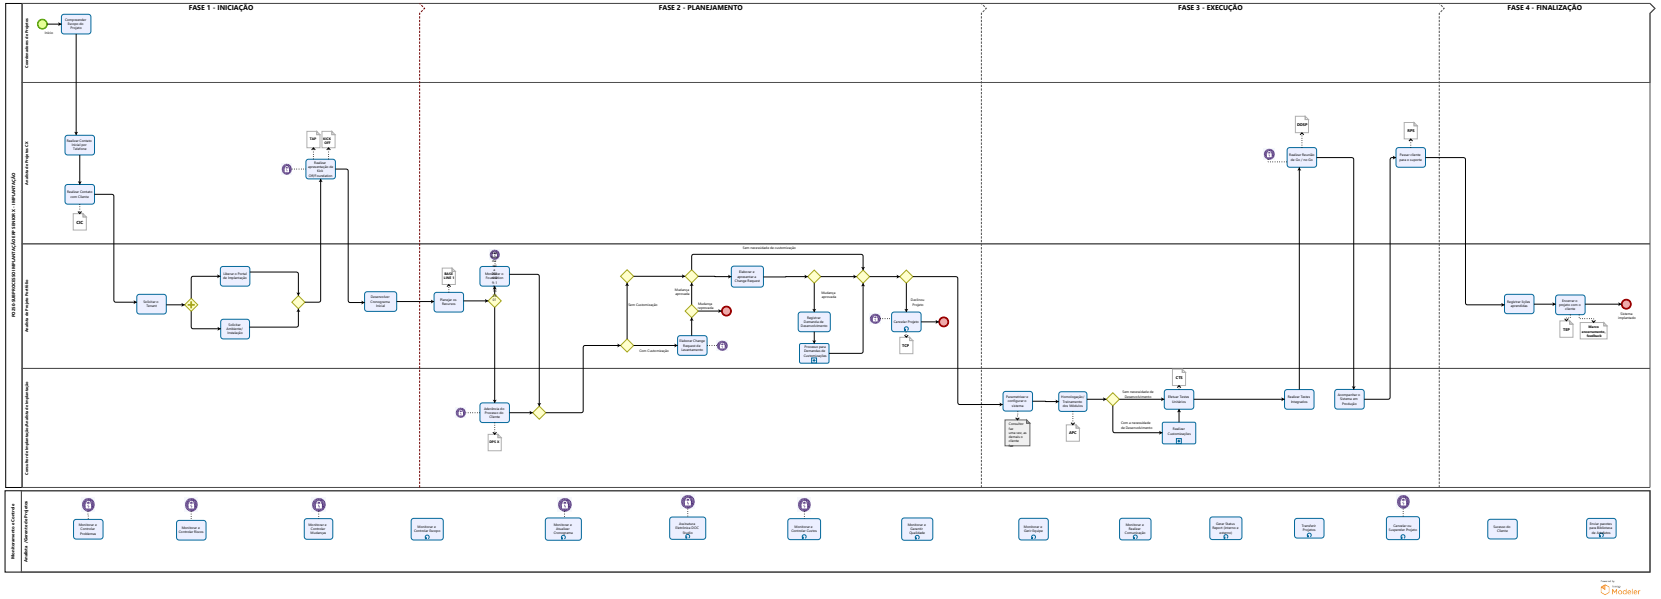

Versão:

1.0

Autor:

PMO

6.1 MONITORAMENTO E CONTROLE

6.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

6.1.1.1 ☐Sucesso do Cliente

Descrição
o Analista de Customer Sucess deve monitorar e controlar mensalmente os projetos estrategicos do ERP Senior X, focado em clientes acima de 30 milhões ou com a mensalidade acima de 5 mil.

Entradas
Necessidade de acompanhar os projetos

Saídas
Acompanhar e monitorar os projetos estrategicos

Responsável

Analista de Customer Sucess

6.1.1.2 ☐Monitorar e Realizar Comunicação

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição
É imprescindível que durante a execução do projeto haja comunicação entre todas as partes interessadas e pessoas envolvidas: cliente, analista/gerente de projetos, coordenador de serviços, consultoria de implantação, produto, suporte e terceiros.

Quando a comunicação é contínua e assertiva significa que existe alinhamento de expectativas e todos estão cientes de suas responsabilidades e sobre o andamento do projeto.

A comunicação facilita negociações, planos de ações e evita desalinhamentos.

Entradas
Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP (quando houver)

Saídas
Status Report

Atas de Reunião

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.3 Monitorar e Gerir Equipe

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Gerenciar a equipe do projeto abrange as seguintes atividades:

• Monitorar o desempenho dos membros da equipe.

• Fornecer feedback aos consultores utilizando o Fast Project (https://fastproject.senior.com.br).

• Manter uma comunicação contínua e assertiva.

• Negociar os interesses do projeto.

• Resolver problemas que surgirem.

• Coordenar mudanças que visem a melhoria do desempenho do projeto.

Caso haja alterações na equipe durante o andamento do projeto, é necessário registrar no **Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)**, se aplicável, e obter a validação do cliente.

Entradas
Equipe do projeto

Saídas
Equipe do projeto atualizada no Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP

Ata ou e-mail de feedback e reuniões de alinhamento

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.4 Monitorar e Controlar Escopo

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição
Analisar a situação do escopo em relação ao previsto no planejamento do projeto, conforme Documento de Escopo Analítico do Projeto - DEAP e identificar os possíveis desvios.

Verificar continuamente a evolução do projeto e a realização das tarefas, tanto o tempo programado vs o executado, quanto a descrição das atividades.

As mudanças de escopo podem afetar as outras áreas do projeto como o tempo, custo, riscos e qualidade, que devem ser analisadas conjuntamente com a equipe do projeto, antes de serem validadas e colocadas em prática.

Se houver alteração de escopo durante o projeto, deve-se formalizar através da change request e gerar uma nova linha de base no cronograma, adicionando novas atividades e modificando os prazos das já existentes, se houver necessidade.

É fundamental acompanhar de perto as customizações em desenvolvimento para o projeto. Apesar de a equipe de Customizados ser responsável pela gestão e execução dessas atividades, cabe ao Analista ou Gerente de Projetos monitorar o progresso e garantir a entrega, atuando em parceria com o time de Customizados.

Para realizar a Change Request, consulte a Instrução de Trabalho: IT264 - Change Request

Entradas
Documento de Escopo Analítico do Projeto -DEAP

Cronograma

Change Request e/ou Ata de Reunião

Saídas
Cronograma do projeto atualizado

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.5 Monitorar e Garantir Qualidade

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Realizar a análise dos entregáveis do projeto, assegurando junto aos times de consultoria e do cliente a qualidade das atividades e das funcionalidades do produto.

Examinar as informações dos Cenários de Teste de Sistema (CTS) e suas evidências, identificando eventuais desvios ou problemas no produto por meio do **BI-CTS eletrônico**.

Envolver os times de Produto e Suporte para corrigir eventuais erros do produto, caso sejam detectados.

Entradas

Entregáveis do projeto

Cenários de Teste de Sistema - CTS

Saídas

Cenários de Teste de Sistema - CTS verificado

Envolvimento dos times de Produto e Suporte, caso sejam identificados erros e/ou problemas

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.6 Monitorar e Controlar Custos

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

As informações financeiras do projeto devem ser atualizadas periodicamente para garantir a precisão do Status Report e do cadastro financeiro. Esta atualização inclui a inserção de dados financeiros relevantes no sistema, revisão das despesas e receitas do projeto, e a geração de relatórios financeiros precisos. Para orientações sobre monitorar e controlar os custos, verificar nas instruções de trabalho abaixo:

- IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

- IT179 - Cronograma ServiceNow (sharepoint.com)

Entradas
Cronograma do projeto

Saídas
Informações financeiras do projeto atualizadas para compor o Status Report e cadastro financeiro

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.7 ☐ Gerar Status Report (interno e externo)

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição
Status externo (cliente)

Marcar uma reunião recorrente de apresentação de Status Report com o cliente e as partes interessadas, como parte do plano de comunicação. Preparar e usar o arquivo de apresentação de Status Report na pasta da Torre EAS EAS021 - Status Report Cliente.

No mínimo, um status report regular deve ser gerado no mês. Esse status deve ser direcionado para a equipe do projeto e deve conter as informações atuais sobre o escopo do projeto, prazos, desvios, problemas, riscos, mudanças, custos e evolução do projeto.

Pelo menos uma vez ao mês é obrigatória uma reunião de Status Executivo com o Patrocinador do projeto. É sugerido que nesta reunião seja feito um status diferenciado, com duração em torno de meia hora, focando no progresso do projeto e nas principais *issues* que necessitam da atenção, intervenção ou direcionamento do Patrocinador.

Os riscos devem ser cadastrados no ServiceNow, verificar IT de riscos: IT269 - Gerenciamento de Risco (sharepoint.com)

Os Problemas devem ser cadastrados no Snow, ver IT de Problemas.

Status Executivo interno

Os gerentes devem usar o modelo EAS021 - Status Report Interno usando o Excel Template Status Report Projeto para reportar o status do projeto internamente. O objetivo do reporte é apresentar as informações dos projetos às partes interessadas da Senior, possibilitando o acompanhamento das entregas, tomada de decisões e ações necessárias.

POWER POINT SR Executivo interno

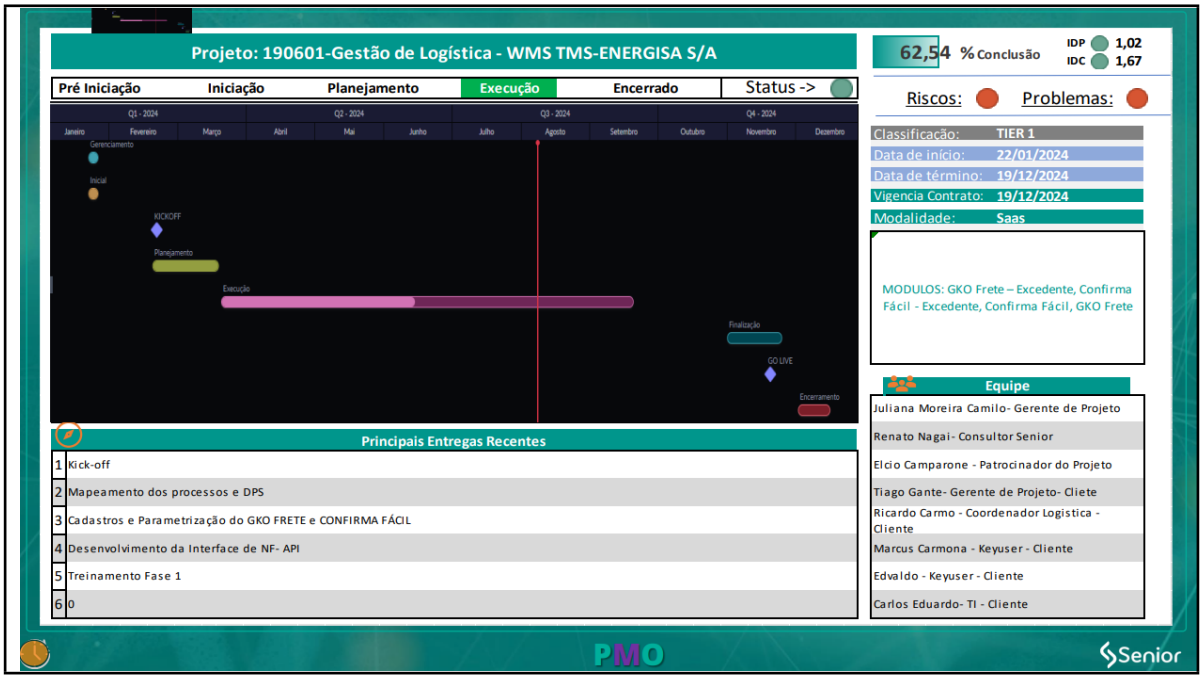

Entradas

-Cronograma atualizado

-Riscos no Snow

-Problemas no Snow

-Entregas do projeto

Saídas

-Status Report Interno ou Cliente

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.8 ☐Transferir Projetos

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

A transferência do projeto acontece para distribuição de demandas na equipe (capacidade), férias ou desligamento de profissionais.

É necessário registrar o momento em que o projeto é transferido entre Analistas/Gerentes de Projetos, evidenciando as entregas e responsabilidades de cada um.

É responsabilidade do Analista/Gerente de Projetos transferidor:

· Preencher o Documento de Transferência do Projeto - DTP, informando a fase, valores financeiros, entregas feitas, pendências e entregas não realizadas (de acordo com a fase), incluindo observações e histórico do projeto.

· Aprovar todas as horas pendentes do projeto na planilha de horas.

· Solicitar aprovações de horas não faturadas para a coordenação, copiando o Gerente de Projeto recebedor, quando necessário.

· Realizar reunião com o cliente o com o GP recebedor, para passagem de bastão das entregas e definição de agendas.

· Deixar o reporte semanal atualizado para o projeto.

É papel do Analista/Gerente de Projetos recebedor:

· Conferir os itens apontados no DTP, conversar com o Gerente de Projetos transferidor, tirar dúvidas e aprovar a transferência. Desta forma, registra que está de acordo com o que foi relatado, tem ciência das entregas do projeto e as pendências que serão assumidas.

· Continuar as ações previstas pela antiga gestão.

· Participar da reunião com o Gerente de Projeto transferidor e o cliente, se apresentando como o novo gerente de projetos.

Quando o profissional anterior não estiver mais na empresa, a transferência deverá ser efetuada e formalizada com o coordenador de projetos.

Entradas

Necessidade de substituição do Analista/Gerente de Projetos

Saídas

Documento de Transferência de Projetos - DTP

Documento de Transferência de Projetos - DTP - Férias

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.9 Monitorar e Atualizar Cronograma

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Para controlar e monitorar um cronograma de forma eficaz, é essencial seguir uma série de passos estruturados que garantem o acompanhamento adequado das atividades planejadas e a identificação precoce de desvios. Aqui estão as principais ações que devem ser realizadas:

1. **Definição Clara do Cronograma**: Certifique-se de que o cronograma está bem definido, com atividades detalhadas, marcos, responsáveis, prazos e dependências claramente estabelecidos. A clareza desde o início é fundamental para um bom controle.

2. **Atualização Regular do Cronograma**: Realize atualizações periódicas para refletir o progresso real das atividades. Isso pode ser feito semanalmente ou de acordo com o ciclo de relatórios do projeto.

3. **Reuniões de Status**: Conduza reuniões regulares de status report com a equipe do projeto para discutir o progresso, identificar obstáculos e planejar ações corretivas.

4. **Gestão de Riscos e Mudanças**: Monitore os riscos e gerencie as solicitações de mudanças que possam impactar o cronograma. Avalie o impacto das mudanças antes de aprová-las, ajustando o cronograma conforme necessário.

5. **Revisão e Aprendizado Contínuo**: Periodicamente, reveja o cronograma e o processo de controle para identificar lições aprendidas e melhorias que podem ser aplicadas em projetos futuros.

6. **Baseline:** Toda alteração de escopo, custo ou prazo requer o replanejamento da data de Go Live no cronograma. Para isso, é necessário solicitar a aprovação do cliente no DOC Studio.

Para mais detalhes, consulte a Instrução de Trabalho: Instrução de Trabalho: IT179 - Cronograma ServiceNow (sharepoint.com)

Entradas

Documento de Escopo Analítico do Projeto - DEAP

Documento change Resquest ou Ata de Reunião-

Saídas

Cronograma do projeto atualizado

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.10 Assinatura Eletrônica DOC Studio

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Este processo permite que o responsável receba e assine documentos eletronicamente, com a opção de enviar uma cópia assinada. O documento é enviado por e-mail, podendo ser visualizado no GED/DOC Studio, disponível na Senior X Platform.

Funcionalidades do GED/DOC Studio:

· Carregar documentos no DOC Studio

· Configurar permissões para Consultores

· Enviar documentos para assinatura

· Receber e Assinar documentos Eletronicamente

Para mais detalhes, consulte a Instrução de Trabalho: IT270-Assinatura Eletrônica (sharepoint.com)

Entradas

Documentação do projeto pronta para carregar no Doc Studio;
Pasta no Doc Studio para compartilhar com consultor;

Documentos do projeto que necessitam de assinatura eletrônica carregados no Doc Studio;

Documentos do projeto para assinar e/ou assinados.

Saídas

Documentos salvos no Doc Studio;

Pasta no Doc Studio compartilhada;

Solicitação de assinatura eletrônica enviadas por e-mail;
Assinaturas dos documentos monitoradas.

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.11 ☐Enviar pacotes para Biblioteca de Artefatos

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Para enviar pacotes de customizações ERP desenvolvidos para Biblioteca de Serviços:

Preencher o template > enviar para biblioteca.servicos@senior.com.br.

Para reutilizar os serviços:

1- Acessar a BIBLIOTECA DE CUSTOMIZAÇÃO e HISTÓRICO REAPROVEITAMENTO - CUSTOMIZAÇÕES localizar o pacote;

2- Caso não tenha os artefatos na biblioteca, você pode utilizar a estimativa cadastrada para o determinado pacote;

3- Se tiver os artefatos na biblioteca, baixar todos artefatos e entregar o recurso para (consultor ou desenvolvedor) que irá adaptar a solução;

4- Ao encerrar a adaptação da customização, coletar artefatos e estimativa utilizada, para análise e calibragem;

5 - Caso houver ajuste no pacote ou na estimativa, notificar o time de manutenção da biblioteca de serviços (biblioteca.servicos@senior.com.br).

Para localizar pacotes na biblioteca:

Você pode filtrar por palavras chaves na funcionalidade de "pesquisa" do SharePoint:

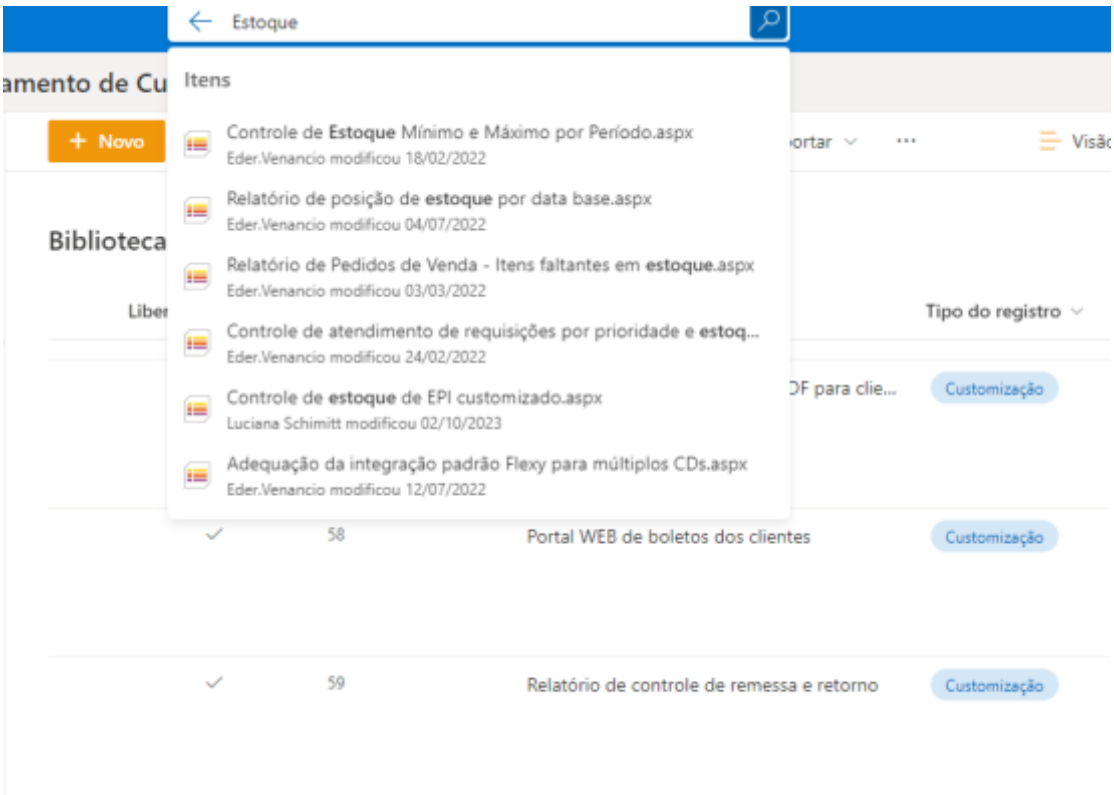

Entradas
Especificação Funcional

DPS's.

Saídas
Especificação Funcional na Biblioteca de artefatos

DPS's na Biblioteca de artefatos.

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.12 ☐Monitorar e Controlar Mudanças

Descrição
Qualquer alteração de serviço que divergir do inicialmente acordado e contratado deve ser formalizada pelo Gerente de Projetos por meio da funcionalidade "Solicitar Mudança" no ServiceNow, disponível na lista relacionada ao Projeto. Após identificar a necessidade de mudança, o Gerente de Projetos, em conjunto com o cliente, avaliará e providenciará a execução da alteração durante o andamento do projeto. Existem três tipos de Change Request:

Alterações com Custo: Alterações com custo referem-se a quaisquer modificações no projeto que resultem em custos adicionais ao cliente, gerando uma nova fatura.

Alterações sem Custo: Alterações sem custo referem-se a modificações no projeto que não resultam em custos adicionais ao cliente. Estas mudanças são realizadas dentro do escopo e dos recursos já acordados na proposta inicial, sem a necessidade de gerar uma nova fatura.

Horas Não Faturadas / Transferência de Custo: Horas não faturadas ou transferência de custo referem-se a situações onde há um aumento no escopo do projeto sem que isso resulte em custos adicionais ao cliente, sem geração de nova fatura.

Abaixo seguem orientações explícitas que devem ser obrigatoriamente seguidas para a alteração da data de Go Live dos projetos da Torre ERP, considerando a gravidade e a importância desta definição:

1. Solicitação Inicial de Mudança de Data

- Quando o **Gerente de Projeto** identificar a necessidade de alteração da data de Go Live (seja por iniciativa própria ou por solicitação do cliente):
  - **É obrigatório** obter aprovação prévia do **Coordenador da Torre** antes de comunicar qualquer alteração ao cliente.
  - Apenas **após aprovação do Coordenador**, o Gerente de Projeto poderá:
    - Informar o cliente sobre a alteração;
    - Formalizar a nova data de Go Live.

2. A partir da Segunda Solicitação de Mudança de Go Live

- Quando já houver uma alteração de Go Live aprovada anteriormente, e surgir uma **nova necessidade de mudança**:
  - A solicitação deve ser **avaliada e aprovada** por:
    - **Coordenador da Torre**;
    - **Gerente da Torre**.
  - Ambos deverão discutir e avaliar **alternativas para evitar nova postergação**.
  - Apenas **com a aprovação conjunta**, o Gerente de Projeto poderá:
    - Comunicar o cliente;
    - Formalizar a nova data de Go Live.

3. Aprovação do Patrocinador do Projeto

- Em **todas as situações** de repactuação da data de Go Live:
    - O **Patrocinador do Projeto** deve ser:
        - **Comunicado previamente**;
        - Emitir uma **aprovação explícita** da nova data.
        - Formalizar através de ata.

Instrução de Trabalho: IT264 - Change Request (sharepoint.com)

Entradas
ATA de reunião;
Change Request aprovado pelo cliente via DOC Studio

Saídas
Change Request aprovado pelo cliente via DOC Studio.

Cronograma do projeto atualizado.

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.13 ☐ Monitorar e Controlar Riscos

Descrição
Ao longo do projeto, os riscos precisam ser monitorados e gerenciados continuamente. Quando um novo risco for identificado, deve-se avaliar tanto a probabilidade quanto a gravidade potencial, caso ele se concretize. Após essa avaliação, é essencial estabelecer uma estratégia para gerenciar o risco. O risco deve ser registrado no ServiceNow.

Para mais detalhes, consulte a Instrução de Trabalho: IT269 - Gerenciamento de Risco (sharepoint.com)

Entradas
Riscos identificados.

Saídas
Riscos cadastrado no ServiceNow;
RIscos encerrados.

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.14 ☐Monitorar e Controlar Problemas

Descrição

De modo geral, um problema é um obstáculo que impede a concretização de um objetivo. Pode ser algo que gera dificuldade e representa uma situação que demanda uma solução. Problemas podem surgir ao longo de um projeto e, para serem devidamente resolvidos, precisam ser registrados, comunicados, monitorados e acompanhados. Para o registro de problemas, o Analista ou Gerente de Projetos deve utilizar o ServiceNow.

Para mais informações, consulte a Instrução de Trabalho: IT275 - Processo Gerenciamento do Problemas

Entradas

Problema identificado no projeto.

Saídas

Registro do problema no ServiceNow

Responsável

Analista de Projetos

6.1.1.15 ☐Cancelar ou Suspender Projeto

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Cancelamento de Projetos: Quando o cliente declina da implantação, o projeto deve ser cancelado na fase em que se encontra. Para proceder, registre a solicitação do cliente, informe o executivo responsável e, se o cancelamento não puder ser evitado, notifique o time de Customer Success. Assegure que todas as horas trabalhadas e entregas sejam registradas e faturadas corretamente. Arquive toda a documentação de cancelamento na pasta de monitoramento do projeto no Doc Studio e atualize a situação do projeto no ServiceNow conforme instrução de trabalho.

Suspensão de Projetos: Caso o cliente solicite a suspensão ou não retorne os contatos, suspenda o projeto. Preencha e obtenha a assinatura do Termo de Suspensão do Projeto (TSP). Atualize a situação no ServiceNow, informe a coordenação e gerencie a reativação com a mesma.

Importante: Para detalhes de como proceder no cancelamento ou suspensão, verifique a instrução de trabalho: IT280-Solicitar Cancelamento do Projeto (sharepoint.com)

Entradas
Solicitação do cliente para cancelar ou suspender o projeto

Saídas
Projeto cancelado ou suspenso no ServiceNow

Termo de Suspensão do Projeto - TSP ou e-mail de cancelamento aprovado via Doc Studio

Responsável

Analista de Projetos

6.2 PO250-SUBPROCESSO IMPLANTAÇÃO ERP SENIOR X - IMPLANTAÇÃO

Orientações Gerais

Entradas

Saídas

Treinamentos disponibilizados na UCS

6.2.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

6.2.1.1 ☐Realizar Contato Inicial por Telefone

Descrição

O Coordenador e Analista de Projetos realiza contato telefônico com o cliente para se apresentar e, posteriormente, encaminha um e-mail formalizando a comunicação e solicitando os dados iniciais.

Entradas
Projeto em nome do Analista/Gerente de Projetos e situação Ativo na ferramenta ServiceNow

Saídas
· Contato Inicial com Cliente

· CIC arquivado no Doc Studio/ServiceNow

Responsável

Analista de Projetos Contato Cliente

6.2.1.2 Realizar Contato com Cliente

Descrição
O segundo contato com o cliente tem como objetivo informá-lo brevemente que a sua demanda foi recebida na área de Serviços, formalizando assim, a transição de pedido comercial para projeto. Este Contato deve ser realizado pelo ServiceNow, conforme instrução de trabalho: IT260 - Processo Contato Inicial (sharepoint.com)

Importante: Esta ação deve ser realizada em até 3 dias úteis a partir do recebimento do projeto.

Entradas
Projeto em nome do Analista/Gerente de Projetos e situação Ativo na ferramenta ServiceNow

Saídas
· Contato Inicial com Cliente

· CIC arquivado no Doc Studio/ServiceNow

Responsável

Analista de Portfólio

6.2.1.3 ☐Solicitar o Tenant

Descrição

De acordo com as necessidades do cliente, é necessário criar ou solicitar um Tenant, conforme a instrução de trabalho: IT263 - Solicitar o Tenant (sharepoint.com)

Entradas

Informações do cliente.

Saídas

Tenant Admin do cliente disponibilizado e e-mail salvo na pasta do DOC Studio.

Responsável

Analista de Portfólio

6.2.1.4 ☐Liberar o Portal de Implantação

Descrição

Para que o cliente tenha acesso aos Documentos de Processo e Sistemas (DPS), Questionários Eletrônicos, Cenários de Testes e Foundation (ERP), deve ser solicitada a criação do **Portal de Implantação** no **Fast Project,** conforme as instruções de trabalho: IT265 - Portal de Implantação (sharepoint.com)

Entradas

Dados de acesso do administrador do tenant.

Saídas

Portal de Implantação liberado e configurado.

Responsável

Analista de Portfólio

6.2.1.5 ☐Solicitar Ambiente/ Instalação

Descrição

Para solicitar o ambiente e/ou instalação tanto para On Premises (CDU) ou Cloud (Saas) é necessário registrar a demanda no Fast Project, conforme instrução de Trabalho: IT266 - Processo para Solicitar Ambiente e Instalação (sharepoint.com)

Importante: Para demandas On Premises (CDU), o time responsável para alocar Consultor de TI é a Administração de Serviços, enquanto para solicitações Cloud (SaaS), o time responsável é o IT Services. Ambas as solicitações devem ser feitas pelo Fast Project.

Entradas

Solicitação do ambiente através do Fast Project.

Saídas

RAS - Relatório de Atendimento de Serviços (não há RAS para soluções G7/Ronda Senior X) disponível no DOC Studio;

Documento Dados Ambiente aprovado pelo Analista/Gerente de Projeto via DOC Studio;

Responsável

Analista de Portfólio

6.2.1.6 ☐Realizar apresentação de Kick Off/Foundation

Descrição

Na reunião de Kickoff é necessário alinhar todo o escopo contratado, apresentar a metodologia de implantação, reforçar a importância do envolvimento, comprometimento e engajamento do time do projeto, reforçar todas as premissas alinhadas no inicio do projeto, apresentar o time do projeto, papeis e responsabilidades e também o plano de comunicação.

Durante essa reunião, o Analista deve explicar também o objetivo do Foundation, acessar a Plataforma X em conjunto com o cliente e orientar sobre os dados que devem ser

obrigatoriamente preenchidos. Também é necessário alinhar uma data para a entrega dessas informações.

Após a reunião, o Analista ou Gerente de Projetos deve acompanhar o preenchimento dos dados pelo cliente, assegurando a conclusão dessa etapa. Uma vez finalizado o preenchimento, a equipe do Foundation dará sequência ao processo automaticamente.

Entendimento do processo Foundation

É importante disponibilizar o material apresentado na reunião para o cliente, sendo assim, anexar no DOC Studio o e-mail enviado ao cliente com **Apresentação de Kick Off - AKO.**

Observação: Para projetos mais complexos ou conforme o Analista ou Gerente de Projetos avaliar a necessidade de acordo com o cliente, uma reunião inicial pode ser realizada antes do Kick Off.

Entradas

DEAP Validada;

TAP;

Cronograma Macro.

Saídas

PPT de apresentação de Kick Off;

E-mail enviado ao cliente com apresentação do Kick Off arquivado no Doc Studio; Foundation

Planejar e controlar riscos.

Responsável

Especialista ERP Senior X, Analista/Consultor

6.2.1.7 ☐ Desenvolver Cronograma Inicial

Descrição
O cronograma inicial do projeto pode ser criado a partir dos cronogramas padrões de cada solução Senior, podendo ser adaptado ou ajustado conforme necessidade do projeto (exemplo: remover os módulos não adquiridos pelo cliente, agrupamento de tarefas etc.).

É obrigatório que nesse momento o Analista de Projetos elabore um cronograma completo do projeto. Mesmo que que não haja a completa certeza dos recursos que realizarão as atividades, é preciso realizar a distribuição das horas por fase da metodologia e também considerando as informações da DEAP (Documento de Escopo Analítico do Projeto).

O cronograma inicial será a linha base e de referência. O baseline será salvo quando submeter o projeto para fase de Planejamento.

- Submeter o projeto para a fase de planejamento e a primeira linha de base será salva de forma automática:

- Mensagem Finalizando primeira fase do projeto com linha de base salva:

Horas de reserva e contingência

É indicado realizar a reserva de horas de contingência no projeto, para uso em caso de emergência com o sugerido de 10% das horas totais.

As horas de reserva de contingência devem ser incluídas no cronograma, quebrando as atividades por tipo de recurso.

Importante que estas atividades possuam como data final a mesma data da atividade de TEP, pois desta forma não terá interferência na apuração de indicadores.

Caso seja necessário utilizar a reserva de contingência, somente precisará atualizar o cronograma acrescentando as horas na tarefa correta e subtrair as horas da tarefa de contingencia.

Importante: O cronograma inicial será considerado como a primeira linha de base, conforme o escopo do projeto. Essa primeira baseline corresponde ao cronograma macro e não necessita da aprovação do cliente.

Instrução de Trabalho: IT179 - Cronograma ServiceNow (sharepoint.com)

Entradas
Documento de Escopo Analítico do Projeto - DEAP

- TAP

Saídas
Cronograma criado

1º baseline salva

Responsável

Analista de Portfólio

6.2.1.8 ☐Aderência do Processo do Cliente

Descrição
Nesta atividade, o consultor/analista de implantação deve apresentar os processos padrões/nativos e também eventuais customizações que já foram previstas em proposta e DEAP.

No entanto, não se deve levantar todo o processo atual do cliente, primeiro ele deve ouvir o processo padrão adotado na ferramenta Senior e ao final sinalizar se alguma parte não é aderente, para que sejam então registrados os pontos de ruptura pelo o consultor.

Atenção: DPS ERP Senior X deve ser elaborada e submetida para aprovação dos usuários-

chaves envolvidos, via DOC Studio. O Documento padrão está disponível no link: Templates : 01-Entrega Acelerada Senior

Entradas
DPS disponibilizados

Saídas
DPS aprovada pelos usuários-chave via DOC Studio

Responsável

Consultor/Analista de Implantação

6.2.1.9 ☐Monitorar o Foundation

Descrição
O Analista de Projetos deverá monitorar o andamento do Foundation e orientar em caso de dúvidas do cliente.

Entradas
Realizar reunião de Kick Off
Planejar os recursos

Saídas
Acompanhar o Foundation

Responsável

Analista de Portfólio

6.2.1.10 ☐Homologação/Treinamento dos Módulos

Descrição
Orientar e prestar suporte aos usuários-chave do cliente durante a fase de homologação do sistema. Em caso de dúvidao Consultor/Analista de Implatanção marca agenda com o cliente.

É necessário monitorar a performance da solução em operação, considerando um volume transacional significativo, para identificar eventuais problemas de lentidão na aplicação ou na infraestrutura.

Com base na homologação, verificar se as entregas da solução atendem ao escopo definido, se há presença de erros e se os usuários assimilaram o uso das rotinas.

Entradas
Sistema parametrizado conforme especificações

Saídas
Apostila

Responsável

Consultor/Analista de Implantação

6.2.1.11 ☐Acompanhar o Sistema em Produção

Descrição
O consultor de implantação será responsável por monitorar a operação do sistema em produção, conforme o período acordado entre o cliente e o gerente de projetos (ou conforme definido na proposta/DEAP), a partir da data de Go Live. Esse acompanhamento deverá estar previsto no cronograma, com as respectivas horas alocadas.

O acompanhamento poderá ser realizado presencialmente ou remotamente, dependendo da complexidade do cliente e do que foi acordado previamente.

Durante o acompanhamento, o consultor de implantação verificará a execução das rotinas do sistema e monitorará a performance da operação.

Se necessário, o consultor oferecerá suporte ao usuário-chave em caso de dúvidas, realizará treinamentos adicionais e, se surgirem problemas, envolverá as pessoas adequadas para a solução.

Registros de reuniões (atas) e documentos recebidos do cliente durante esse período serão considerados registros de acompanhamento.

Observação: O suporte estará disponível ao cliente a partir da data de alteração da situação do contrato no ERP. Recomenda-se negociar com o cliente que, durante o período de acompanhamento, qualquer erro ou problema seja tratado dentro do projeto.

Entradas
Sistema operando em produção

Saídas
Monitoramento do sistema em produção

Responsável

Consultor de Implantação

6.2.1.12 ☐Compreender Escopo do Projeto

Descrição
Antes de designar um Analista ou Gerente de Projetos, o Coordenador deve compreender detalhadamente a solução vendida ao cliente. Isso inclui as premissas da implantação, as negociações realizadas, e a identificação das informações técnicas da venda e do cliente. É necessário verificar se há outros projetos em andamento nesse cliente, seja do mesmo produto ou de produtos diferentes, e mapear essas informações para informar ao Analista ou Gerente de Projetos, garantindo os devidos cuidados de integração. Além disso, deve-se consultar o CS para verificar o histórico do cliente (passado, atual, e se é um caso de revitalização).

Os documentos comerciais que auxiliam nesse entendimento são:

· **Proposta Comercial/Edital**

· **Folha de Rosto - Pedido**

· **Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP)**: Realizar uma análise prévia do DEAP, comparando o escopo com as horas estimadas.

Entradas
Documentos comercias disponíveis no ServiceNow.

Saídas
Definição do Analista/Gerente de Projetos e alocação nas ferramentas.

Responsável

Coordenador de Projetos

6.2.1.13 ☐Planejar os Recursos

Descrição
Caso os recursos alocados na Fase 1 não possam ser utilizados na Fase 2, será necessário replanejá-los. Para efetivar essa alocação, tanto de colaboradores CLT quanto de prestadores de serviço PJ, é imprescindível observar as diretrizes estabelecidas na Instrução de Trabalho - IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

Entradas
Ata de Reunião Inicial

Termo de Abertura do Projeto - TAP

Saídas
Agenda solicitada na ferramenta FAST

Plano de recurso/ação aprovado no ServiceNow

Responsável

Analista de Portfólio

6.2.1.14 ☐Elaborar Change Request de Levantamento

Descrição
Caso o cliente demonstre interesse em prosseguir com o levantamento inicial, o Analista ou Gerente de Projetos deverá elaborar o documento de solicitação de mudança (Change Request) e apresentá-lo ao patrocinador do projeto. É importante ressaltar que esta primeira solicitação contempla apenas as horas destinadas ao levantamento das customizações.

Verificar instrução de trabalho IT264 - Change Request (sharepoint.com)

Entradas
DPS's padrões apresentadas

Saídas

Solicitação de mudança aprovada ou reprovada através do Doc Studio

Responsável

Analista de Portfólio

6.2.1.15 ☐Elaborar e apresentar a Change Request

Descrição

Após a aprovação da Change Request pelo cliente, o Analista ou Gerente de Projetos deve elaborar uma segunda solicitação de mudança (Change Request), incluindo o planejamento do gerenciamento e dos recursos necessários para a execução das atividades. Este documento deverá ser apresentado ao cliente, assegurando a aprovação final do patrocinador por meio do Doc Studio.

Verificar instrução de trabalho IT264 - Change Request (sharepoint.com)

Entradas

Change Request

Saídas

Solicitação de mudança aprovada ou reprovada através do Doc Studio

Responsável

Analista de Portfólio

6.2.1.16 ☐Registrar Demanda de Desenvolvimento

Descrição

As atividades de customização identificadas devem ser conduzidas exclusivamente pela equipe de Desenvolvimento do ERP. Se houver necessidade de alocar o Consultor de Implantação, a equipe será responsável por informar o Analista ou o Gerente de Projetos.

Registrar a demanda de solicitação de desenvolvimento no portal Fast Project, incluindo todas as informações relevantes para orientar o processo técnico. Se houver mais de um desenvolvimento previsto no escopo, deve-se cadastrar uma demanda para cada item de desenvolvimento. Para cada demanda, é necessário indicar a data de conclusão desejada e o total de horas estimadas para a execução. O documento de escopo analítico do projeto deve ser anexado à demanda. Comentários adicionais podem ser inseridos para facilitar a compreensão da necessidade e para alinhamentos complementares.

Importante enfatizar que o prazo para conclusão da customização deve considerar a data planejada para início dos testes integrados do projeto de implantação.

Para mais detalhes, consulte o processo de alocação descrito na instrução de trabalho: IT222-Alocação de Recurso (sharepoint.com)

Entradas

Recurso através do Fast ProjecInformações da Demanda.

Documento de Escopo Analítico do Projeto (DEAP).

Saídas

Registro da demanda no portal Fast Project.

Responsável

Analista/Gerentes de Projetos

6.2.1.17 Processo para Demandas de Customizações

Processo

PO250 - Subprocesso de Desenvolvimento em Projetos de Implantação - Subprocesso de Demandas de Customização/Integração ERP em Projetos de Implantação

6.2.1.18 Parametrizar e configurar o sistema

Descrição

Esta atividade consiste em parametrizar/configurar/cadastrar dados no sistema com base nas definições da fase 2, conforme Documento de Processo e Sistema - DPS.

O trabalho é desenvolvido pelos consultores e os usuários-chave devem ser envolvidos. Desta maneira, o consultor deverá realizar o primeiro cadastro e/ou parametrização de uma rotina e ensinar o usuário-chave, para que ele faça os demais, como no caso no

cadastro de empresas e colaboradores. Assim, o trabalho é compartilhado e os usuários-chaves iniciam o processo de capacitação.

Entradas
Documento de Processo e Sistema - DPS

Cronograma

Roteiros de implantação (quando aplicável) Solicitação de Alocação de Recursos

Saídas
Sistema parametrizado conforme especificações

Responsável

Consultor/Analista de Implantação

6.2.1.19 Realizar Customizações

Processo

PO250 - Subprocesso de Desenvolvimento em Projetos de Implantação - Subprocesso de Demandas de Customização/Integração ERP em Projetos de Implantação

Portões

Efetuar Testes Unitários

6.2.1.20 Efetuar Testes Unitários

Descrição
A validação das parametrizações, cadastros e/ou dados importados deverá ser realizada primeiramente pelo consultor e posteriormente pelos usuários-chave, assim, se houver erros ou problemas, o consultor poderá ajustar antes que o usuário-chave faça as verificações.

O consultor/analista de implantação deve promover os testes necessários para garantir o bom funcionamento do sistema que está sendo implantado. Todos os itens listados nos Documentos de Processo e Sistema - DPS, serão testados através do CTS, inclusive as customizações desenvolvidas (quando houver).

Caso ocorra alguma inconsistência no produto padrão, o consultor de implantação deve acionar o time de suporte da Senior para que o item apontado seja corrigido, todas as inconsistências devem ser tratadas antes do cliente realizar os testes integrados.

Assim que os testes forem concluídos com sucesso, todos os documentos devem ser gerados para o DOC Studio e devem ser submetidos para aprovação eletrônica pelo consultor e cliente.

Entradas
Sistema parametrizado conforme especificações;

Customização desenvolvida.

Saídas
Cenário de Testes de Sistema - CTS validado pelo usuário-chave, armazenado no Doc Studio.

Responsável

Consultor de Implantação

6.2.1.21 Realizar Testes Integrados

Descrição

Esta atividade consiste na execução dos testes integrados entre todos os módulos do sistema.

A realização dos testes integrados é um processo conduzido pelo Gerente do Projeto e pelos Consultores de Implantação, no entanto, a responsabilidade pela execução é do Cliente e de seus Usuários. Os testes a serem realizados estão listados na Planilha de Testes Integrados, devem ser sequenciados, conduzidos e registrados neste documento, que servirá como base de consulta e tomada de decisão durante todo o processo.

Na realização dos testes integrados, o usuário-chave tem as seguintes responsabilidades:

- Capacitar os usuários finais para realização dos testes.

- Apoiar na construção dos testes integrados, garantindo que todas as rotinas do negócio sejam mapeadas e testadas.

- Seguir os cenários de teste conforme descrito nos Planilha de Testes Integrados e anotar o resultado.

- Gerar evidências, como capturas de tela, nos Cenários de Testes de Sistema, para que o analista ou gerente de projetos possa armazená-las nas evidências do projeto.

- Evidenciar para os consultores os processos que não tiveram o efeito esperado.

- Interagir com as demais áreas para encontrar soluções e melhorar a fluidez dos testes integrados.

Após a realização dos testes integrados, o Analista deve evidenciar os resultados obtidos para o Cliente, de modo que esta informação servirá como base de decisão para entrada em produção ou para a repetição dos testes integrados.

Ao final dos testes integrados, o Gerente do projeto deve gerar uma evidência onde o cliente concorda que realizou com sucesso testes integrados que contemplam todas suas operações de negócio, garantindo que todos os cenários de sistema necessários foram testados. O Gerente de Projetos deve registrar ainda junto ao cliente qual o percentual de sucesso que foi atingido nos testes integrados, e também obter o consentimento de que os cenários de teste foram elaborados e formulados pelo próprio cliente

Entradas

Módulos parametrizados.

Customizações validadas.

Treinamentos realizados pelo consultor ou EAD

Saídas

Testes de integração validados pelo usuário-chave nos Cenários de Testes de Sistema - CTS com aprovação arquivada na pasta do projeto no Doc Studio

Responsável

Consultor de Implantação

6.2.1.22 ☐Realizar Reunião de Go / no Go

Descrição

A reunião de GO/NO GO é um momento chave do projeto, onde será realizada a formalização da conclusão do processo de parametrização e homologação da solução, bem como o alinhamento para a entrada em produção. Esta reunião deve ser realizada com no mínimo uma semana antes da data prevista do Go Live, e deve envolver o Gerente de Projetos do cliente, o Patrocinador, os Usuários Chave, o Analista de Projetos e os Consultores envolvidos. A presença do Patrocinador é obrigatória e indispensável, e a reunião deverá ser remarcada até que ele possa participar. Esta reunião deverá ser obrigatoriamente gravada.

IMPORTANTE: Caso o Analista entenda que haverá divergência entre as partes na Reunião de GO/NO GO, onde o Cliente deseja fazer o Go Live mas a equipe do projeto não está segura, a presença do Gerente da Torre e da Coordenação será obrigatória nesta reunião, de modo que seja tomada e documentada uma decisão corporativa a respeito.

A reunião de GO/NO GO resulta no preenchimento da DOSP. Importante destacar que o texto padrão desse documento deve ser adequado à realidade do projeto, e deve obrigatoriamente conter:

- Pendências e restrições.

- Cenário de testes e testes faltantes.

- Riscos identificados e estratégias de tratamento.

- Impactos identificados.

Após finalizado o texto da DOSP, esse documento deve ser obrigatoriamente assinado pelo Patrocinador através do DOC Studio.

Como registro formal desta reunião, o Gerente do Projeto deve armazenar a gravação, e em seguida formar uma ata onde constam todos os aspectos discutidos na reunião. Essa ata e os materiais apresentados devem ser enviados em formato PDF para todo o time do projeto e para o Comitê Executivo.

Após assinatura do Patrocinador, a DOSP deve ser encaminhada ao e-mail dosp@senior.com.br, para que a Gestão de Faturamento faça a liberação de pagamento de ATST (quando alinhado em proposta). Com o retorno da Gestão do faturamento, é alterado no sistema ERP a situação do cliente para dar início ao atendimento de suporte.

Entradas
-Plano de Entrada em Produção – PEP

-Reunião de Go/No-Go

Saídas
-Documento de Oficialização de Sistema em Produção- DOSP aprovado

-Cronograma das atividades para entrada em produção validado

-Atualização Registro Riscos

-email dosp@senior.com.br

Responsável

Analista/Gerente de Projetos/Especialista ERP Senior X

6.2.1.23 ☐Passar cliente para o suporte

Descrição
Após a liberação do suporte ERP pelo time de faturamento e o envio da DOSP, é necessário formalizar junto ao Suporte Técnico a documentação relacionada ao projeto e ao cliente. Seguem as instruções:

Suporte Senior/Unidade de Negócio:

1- Preencher o formulário Repasse do Cliente para o Suporte - ERP Padrão ou GO UP (revisão 3.0).docx disponível no SharePoint. Lembrando que a recomendação é preencher o formulário ao longo do projeto para que o trabalho não se acumule ao final do projeto.

2- Enviar formulário preenchido em formato Word para o Contact Owner do ERP, conforme orientações disponíveis no Portal de Documentação, no link a seguir (https://documentacao.senior.com.br/guia-do-suporte.htm). Após a leitura e análise da documentação, o responsável pela análise vai solicitar as correções necessárias. Quando o documento for concluído, o Time de Suporte disponibilizará horários para uma agenda de

boas-vindas ao cliente, que deverá ser marcada, acompanhada e gravada pelo Gerente de Projetos. O SLA para resposta do Time de Suporte é de 7 dias.

3- Abrir chamado na Sara Corporativa para criação do Usuário Master, conforme passo a passo abaixo:

4- Pesquisar "Zendesk" e selecionar a opção "Cadastrar usuário para acessar o Zendesk" e selecionar "Usuário Master"



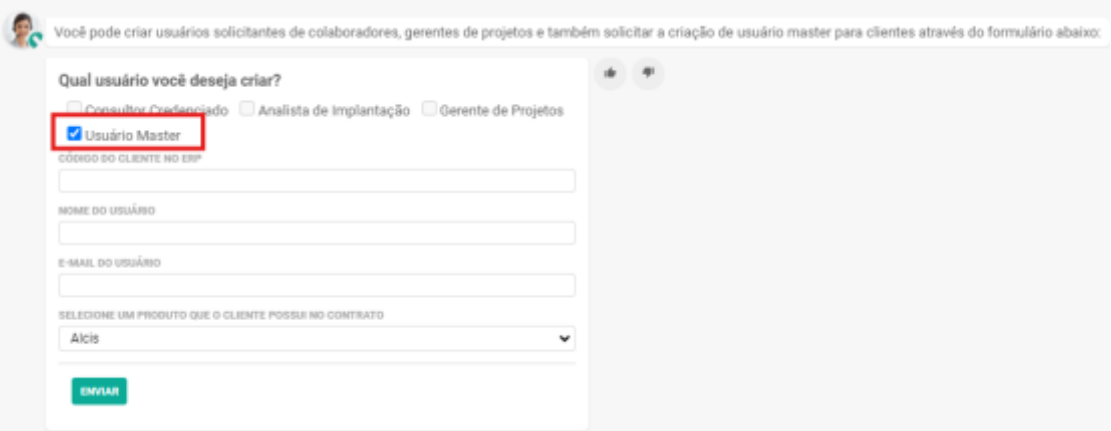

6- Após o chamado e criado BPM para coordenador do produto do cliente;

7- Arquivar o e-mail enviado ao suporte com documento anexo no DOC Studio na pasta Repasse ao Suporte.

Suporte Canal:

· Enviar e-mail ao contato responsável no Canal, comunicando a entrada do sistema em produção com os dados do cliente para suporte, baseando-se nas informações do formulário acima, utilizado para o suporte da Senior.

Notas:

· A comunicação ao suporte deverá ocorrer no prazo de até 7 dias a partir da assinatura do DOSP.

· Se houver chamados pendentes no final da implantação, deve-se transferi-los para o cliente conforme abaixo:

· Suporte realizado pela Senior: deve-se providenciar para que o solicitante seja alterado para o responsável pelo suporte no cliente.

· Suporte realizado pelo Canal de Distribuição: deve-se providenciar para que o solicitante seja alterado para o responsável pelo suporte do cliente credenciado no Canal, pois os chamados de clientes atendidos pelo suporte do canal devem ser abertos usando o canal de distribuição como cliente e como cliente representado, o próprio cliente.

Entradas
-Documento de Oficialização de Sistema em Produção - DOSP aprovado via Doc Studio
-Sistema em Produção

Saídas
-Handover enviado via ServiceNow
-Registro do Ticket no ZenDesk
-Reunião de repasse com a equipe de suporte

Responsável

Analista / Gerente de Projetos

6.2.1.24 Registrar lições aprendidas

Descrição
O Analista/Gerente de projetos é responsável por avaliar as ocorrências durante a execução do projeto e registrar as suas observações, sempre dando sugestões de

melhorias, seja para incorporar na organização boas práticas usadas no projeto, ou para modificar procedimentos que se manifestaram inadequados durante o projeto.

É recomendado que esta atividade seja executada em conjunto com a equipe do projeto.

As lições aprendidas devem ser registradas na ferramenta Fast Project conforme abaixo:

1 - Acessar Senior X plataform >PMO de Serviços|Gestão de Projetos> Fast:

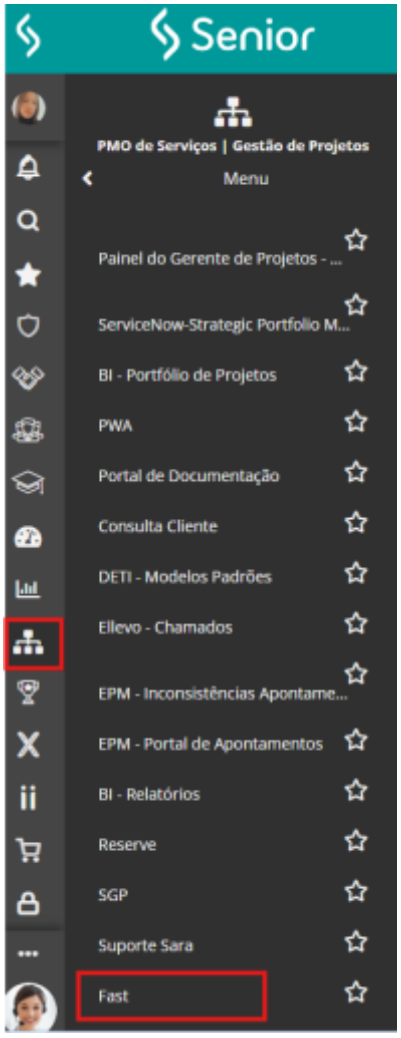

2 -Acessar o Fast Project com o login e senha de rede > Projetos > Filtre o projeto necessário > Project Life:



3 - No Project Life clique em "Registrar Lições Apreendidas":

4 -Lições Aprendidas > preencher as informações > Salvar:

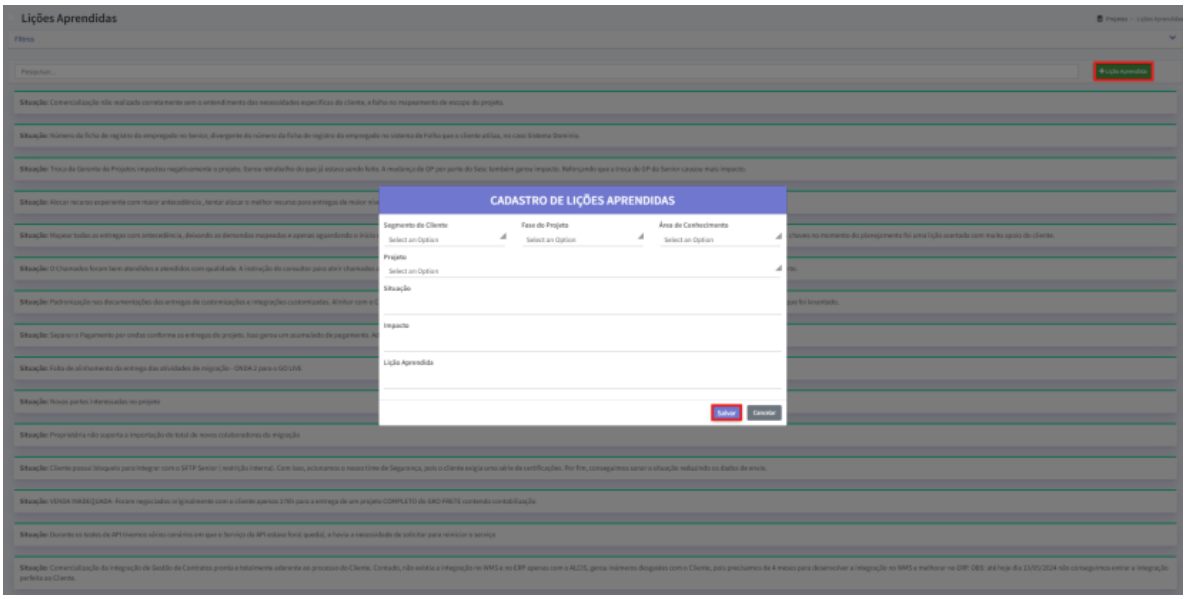

Entradas
Lições aprendidas percebidas ao longo do projeto

Saídas
Registro de lições aprendidas na ferramenta Fast Project

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

6.2.1.25 ☐Encerrar o projeto com o cliente

Descrição
Esta atividade representa a conclusão do projeto de implantação do sistema, abrangendo a totalidade ou apenas módulos específicos que foram implementados conjuntamente.

Nesta fase, a equipe Senior e o cliente verificam se os objetivos e as expectativas definidos no início do projeto foram cumpridos.

É essencial ouvir o feedback do cliente e informá-lo sobre o envio da pesquisa NPS, destacando a importância de sua participação.

Com o encerramento do projeto, a equipe envolvida será desativada. Caso haja continuidade de trabalhos por parte dos consultores da Senior, estes serão realizados como serviços avulsos.

Se a formalização do encerramento do projeto não estiver documentada na DOSP, o gerente de projetos deve elaborar o **Termo de Encerramento do Projeto (TEP)** e solicitar a aprovação do cliente.

O Analista/Gerente de Projetos deve assegurar que toda a documentação gerada esteja arquivada na pasta do projeto no Doc Studio, que todas as atividades estejam concluídas e que o saldo de horas no cronograma seja zerado.

Encerramento administrativo do projeto

O Processo de encerramento administrativo deverá ser realizada após 90 dias da conclusão do projeto.

O processo completo está na IT337- Encerramento Administrativo de Projetos

Entradas
Documento de Oficialização de Sistema em Produção - DOSP
Sistema em produção

Saídas
Comunicado sobre encerramento do projeto para o Cliente

Termo de Encerramento do Projeto - TEP aprovado pelo cliente via Doc Studio (opcional, caso o DOSP contenha o termo de encerramento).

Projeto encerrado ServiceNow.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos

6.2.1.26 Cancelar Projeto

Tipo de loop

Padrão

Máximo ciclo

0

Tempo de teste

Depois

Descrição

Cancelamento de Projetos: Quando o cliente declina da implantação, o projeto deve ser cancelado na fase em que se encontra. Para proceder, registre a solicitação do cliente, informe o executivo responsável e, se o cancelamento não puder ser evitado, notifique o time de Customer Success. Assegure que todas as horas trabalhadas e entregas sejam registradas e faturadas corretamente. Preencha o novo Artefato "Termo de Cancelamento", deve ser enviado para o time de Auditoria e Governança. Arquive toda a documentação de cancelamento na pasta de monitoramento do projeto no Doc Studio e atualize a situação do projeto no ServiceNow conforme instrução de trabalho.

Importante: Para detalhes de como proceder no cancelamento ou suspensão, verifique a instrução de trabalho: IT280-Solicitar Cancelamento do Projeto (sharepoint.com)

Entradas

Solicitação do cliente para cancelar ou suspender o projeto

Saídas

Projeto cancelado ou suspenso no ServiceNow

Termo de Suspensão do Projeto - TSP ou e-mail de cancelamento aprovado via DOC Studio.

Responsável

Analista/Gerente de Projetos
